



SIPA



www.portodeaveiro.pt




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



SIPA






Apresentação

Projecto: SIPA – Sistemas de Informação do Porto de Aveiro

EBP: APA– Administração do Porto de Aveiro, S.A.

Resultados Mais Importantes: Implementação de SI de Gestão Financeira, de Processo de *Workflow* de Compras e de Portal

Utilidade: Maior eficiência do *backoffice* e notoriedade junto das empresas

Orçamento: 318.824 EUROS

Início/Fim Janeiro/2003 – Dezembro/2005– 36 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 1




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Desenvolvimento e arranque do SI de Gestão Financeira;
 2. Desenvolvimento do Processo de Pedido de Economato/Compra através de Intranet;
 3. Desenvolvimento do Portal, porta de acesso a contas correntes.

Execução Financeira: Despesa Apresentada: 149.180 € / 46,79 %
Complicação Recebida: 819 € / 0,49 %


Avaliação: -Subavaliação do período de implementação do ERP financeiro;
-Aquisição pelas pessoas da área financeira de uma visão geral de cada um dos seus serviços.

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Implementação de Processo Electrónico de Gestão de Correspondência;
 2. Implementação de Sistema de Gestão Colaborativa de RH.

Execução Financeira: 318.824 euros /100% do Orçamento Total

Perspectivas: Estabilização, em 2006, de todas as componentes do projecto SIPA.

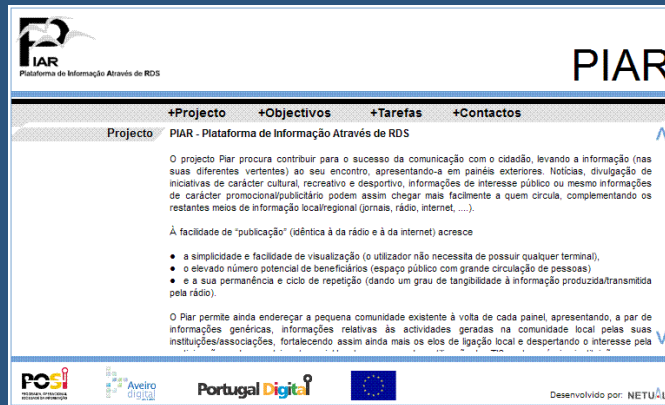

PIAR
Plataforma de Informação Através de RDS

+Projecto +Objectivos +Tarefas +Contactos

Projecto PIAR - Plataforma de Informação Através de RDS

O projecto Piar procura contribuir para o sucesso da comunicação com o cidadão, levando a informação (nas suas diferentes vertentes) ao seu encontro, apresentando-a em painéis exteriores. Notícias, divulgação de iniciativas de carácter cultural, recreativo e desportivo, informações de interesse público ou mesmo informações de carácter promocional/publicitário podem assim chegar mais facilmente a quem circula, complementando os restantes meios de informação local/regional (jornais, rádio, internet, ...).

À facilidade de "publicação" (idéntica à da rádio e à da internet) acresce

- a simplicidade e facilidade de visualização (o utilizador não necessita de possuir qualquer terminal),
- o elevado número potencial de beneficiários (espaço público com grande circulação de pessoas)
- e a sua permanência e ciclo de repetição (dando um grau de tangibilidade à informação produzida/transmitida pela rádio).

O Piar permite ainda endereçar a pequena comunidade existente à volta de cada painel, apresentando, a par de informações genéricas, informações relativas às actividades geradas na comunidade local pelas suas instituições/associações, fortalecendo assim ainda mais os elos de ligação local e despertando o interesse pela

Desenvolvido por: NETU.L

www.terranova.pt/piar

Apresentação

Projecto:	PIAR – Plataforma de Informação através de RDS
EBP:	Terra Nova–Cooperativa de Radiodifusão e Acção Cultural
Resultado Mais Importante:	27 painéis com possibilidade de serem actualizados a qualquer momento, através de RDS
Utilidade:	Informar o cidadão
Orçamento:	694.750.00 €
Início/Fim	12/03–11/06 36 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	7

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Instalação de 20 painéis
 2. Apresentação de informação nos painéis de forma mais flexível
 3. Back-office com funcionalidade de introdução de informação via web

Execução Financeira: Despesas apresentadas: 521.962,19 € / 75,13 % do Total
Comparticipação recebida: 312.439,58 € / 62,46 % do Total

Avaliação: PF:O "back-office" é mais complexo do que inicialmente previsto, tendo atrasado o plano de desenvolvimento
PF:20 painéis instalados. Apresentação da informação, nos painéis, próxima do versão final.

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Todos os painéis instalados
 2. Back-office com funcionalidades de gestão de conteúdos e endereçamento individual de painéis
 3. Nº Certificações em CB TIC: 80

Execução Financeira: 620.000 € / 89 % do Total do Orçamento

Perspectivas: Dificuldades no desenvolvimento do back-office face às funcionalidades solicitadas. Bom relacionamento entre parceiros e antecipa-se a execução do projecto de acordo com o planeado



Inovortal



inovortal.inova-ria.pt

Portugal Digital | POSI | Aveiro digital | Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



Inovortal



Apresentação

Projecto: Inovortal

EBP: Inova-Ria, Associação de Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro

Resultado Mais Importante: Centro de Dados e Plataforma de Serviços

Utilidade: Disponibilização de Infra-Estrutura (centro de dados), Serviços e Aplicações

Orçamento: 99.800 €

Início/Fim Dez / 2003 – Nov/2005 – 24 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 1

Portugal Digital | POSI | Aveiro digital | Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Centro de Dados operacional
 2. Plataforma de Serviços (Pública e Privada)
 3. ShowRoom – Primeiros equipamentos

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 57.926 € / 58 % do Total
Comparticipação Recebida: 4.567 € / 9 % do Total

Avaliação: Inicialmente existiu alguma dificuldade de conjugação de esforços entre todos os associados.
O projecto recuperou o atraso inicial.

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Inauguração do ShowRoom
 2. Plataforma Interna – Módulo de Gestão RH
 3. Nº Certificações em CB TIC: 250

Execução Financeira: 87.737 € / 88 % do Total Orçamento

Perspectivas: Cumprimento do plano técnico.



www.cm-vagos.pt (acesso reservado)

Apresentação



Projecto:	VAGOSINFORMA - Vagos, Município Digital
EBP:	Município de Vagos
Resultado Mais Importante:	Disponibilização de Serviços electrónicos municipais ao Cidadão
Utilidade:	Simplificação e modernização da relação Autarquia / Município
Orçamento:	125.000,00 €
Início/Fim	01.2004 - 12.2006 / 36
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Site oficial da Autarquia
 2. Web Services
 3. Intranet de Serviços

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 110097,78 € / 88,08 % do Total
Comparticipação Recebida: 20.155,85 € / 21,50 % do Total

Avaliação:

Pontos Fracos: Formação e sensibilização dos RH para utilização

Pontos Fortes: Apoio do executivo no desenvolvimento do projecto

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Formação
 2. Integração serviço de Difusão e Alertas
 3. Certificações em CB TIC: 45

Execução Financeira: 115.866,58 € / 92,7 %





Perspectivas:

Positivas: Continuidade ao projecto; Instalação e desenvolvimento do Workflow electrónico

Negativas: Demonstração da utilidade dos serviços e formação

braxen Braxen

+Projecto	+Objectivos	+Tarefas	+Contactos
Projecto			
O Projecto			
<p>A Braxen é uma empresa de investigação e desenvolvimento de electrónica, durante vários anos exerceu actividade no distrito de Leiria sob a designação do seu sócio. Actualmente encontra-se sediada no concelho de Leiria.</p> <p>A empresa assenta o seu funcionamento no capital intelectual dos seus colaboradores, sendo a gestão da informação a peça fulcral face à concorrência.</p> <p>A importância de um sistema integrado de gestão torna-se vital, visto proporcionar uma interacção entre empresa e cliente, partilhando o mesmo espaço virtual de trabalho. A maior parte dos projectos são feitos em conjunto e muitas vezes nas instalações do cliente. Neste caso é importante a mobilidade da informação.</p> <p>As funcionalidades identificadas numa primeira análise apontam para os seguintes itens (em plataforma Web): Gestão de Conhecimento - é importante o know how pertencer à fma, Gestão de Económato Gestão de equipamento, Gestão Documental,</p>			

Desenvolvido por: NETU^{LL}

www.braxen.pt/braxen



Apresentação

Projecto:	Braxen – Braxen, Antecipando o Futuro
EBP:	Braxen – Investigação e Desenvolvimento, Lda.
Resultado Mais Importante:	Gestão Integrada da Braxen (Serviços de Back-office e Front-office)
Utilidade:	Criação de um espaço intranet onde todos os recursos serão partilhados
Orçamento:	45.150,00 €
Início/Fim	01/2005 – 12/2005/ 12 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Intranet de gestão
 2. Integração da intranet de gestão com a de controlo
 3. Aquisição de equipamento

Execução Financeira: Despesas apresentadas: 25194,03 € / 58,80 % do Total
Comparticipação recebida: 3993,43 € / 17,69% do Total

Avaliação: Pontos Fracos da Execução: Ausência de certificações
Pontos Fortes da Execução: Percentagem de execução

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. 1º Resultado Importante a Alcançar: Formação
 2. 2º Resultado Importante a Alcançar: Conclusão do projecto
 3. Nº Certificações em Competências Básicas TIC: 45

Execução Financeira: Despesa total prevista em 15 de Nov 2005:
45150 € / 100 % do Total Orçamento

Perspectivas: Positivas: Conclusão dos trabalhos e aumento de produtividade da empresa
Negativas: nada a registar



www.juventude.gov.pt/Portal/Noticias/IPJ/Aveiro_digital.htm



Apresentação

Projecto:	IPJDIGITAL – Aveiro Associativo Digital
EBP:	Delegação Regional de Aveiro do IPJ
Resultado Mais Importante:	Divulgação do Movimento Associativo Juvenil do Distrito de Aveiro Coordenação de projectos e iniciativas, com gestão eficaz de recursos e mobilização de públicos
Utilidade:	Estímulo de valores como a cidadania e voluntariado através do incentivo à participação em associações juvenis
Orçamento:	70.000 €
Início/Fim	Jan.2005 – Dez.2006 / 24 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias	1



IPJDIGITAL

Execução Realizada

**Execução
Técnica:**

1. Especificação de Sistemas e Equipamentos
2. Especificação dos Serviços
3. Consulta ao Mercado (em fase de conclusão)

**Execução
Financeira:**

Despesas Apresentadas: 2.418,77€ / 3,46 % do Total
Comparticipação Recebida: 1.960,54 € / 3,89 % do Total

Avaliação:

Pontos Fracos: Dificuldade sentida nos procedimentos internos do IPJ – inerentes a um organismo da Administração Pública

Pontos Fortes: Consulta ao mercado realizada



Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



IPJDIGITAL

Execução Planeada até Dezembro de 2005

**Execução
Técnica:**

1. Especificação, instalação dos sistemas e desenvolvimento do Portal
2. Concepção e elaboração do Web Design do Portal
3. Certificações em CB TIC: 70

**Execução
Financeira:**


50.900,00 € / 72,8 % do Total Orçamento

Perspectivas:

Conclusão da concepção do portal AVEIRO ASSOCIATIVO DIGITAL
Recolha de informação para produção dos conteúdos do Portal e do acervo interno relativo ao movimento associativo



Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



www.pracapublica.com/webnews (acesso reservado)



Apresentação

Projecto:	Caderno Digital
EBP:	Caderno Digital, Edições e Publicações, Lda.
Resultado Mais Importante:	Implementação da Zona de Teletrabalho
Utilidade:	Facilidade, comodidade e maior eficácia do trabalho jornalístico
Orçamento:	50.024 €
Início/Fim	Novembro.2004 – Maio.2005 / 7 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Redução no tempo de produção do jornal
 2. Organização e planeamento
 3. Acessibilidade em qualquer parte do mundo.

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 43.461,62 € / 86,88% do Total
Comparticipação Recebida: 1.252,09 € / 5% do Total


Avaliação: Prolongamento do prazo de implementação
Construção à medida de uma ferramenta importante para o trabalho da empresa

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Testes e exploração
 2. Redução de custos
 3. Nº Certificações em CB TIC: 07

Execução Financeira: 50.024,00 € / 100%

Perspectivas: Optimização dos recursos da empresa sustentada por uma ferramenta de trabalho que permite o aumentar a produtividade

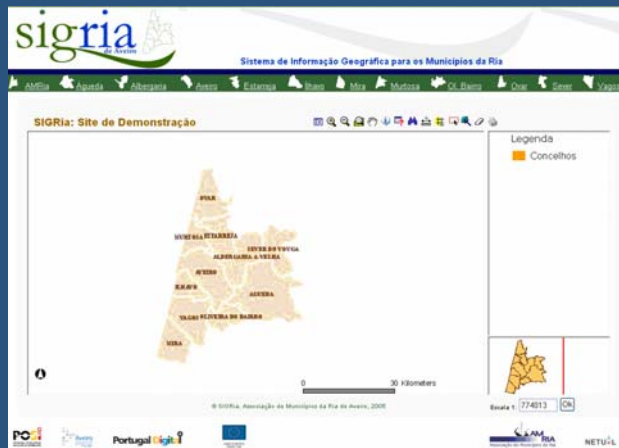

www.amria.pt/sigria

Apresentação

Projecto:	SIGRia – Sistema de Informação geográfica para os Municípios da Ria
EBP:	Associação de Municípios da Ria – AMRia
Resultado Mais Importante:	Disponibilização e gestão intermunicipal de informação geográfica.
Utilidade:	Melhorar a eficácia das decisões na gestão do território.
Orçamento:	2.500.894 €
Início/Fim	Jan. 2004 / Dez. 2006 (36 meses)
Nº de Entidades Beneficiárias:	12

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Disponibilização de informação para o cidadão;
 2. Fomento do trabalho em parceria entre as diversas equipas técnicas.
 3. 10 Acções de formação + 20 Certificações em CB TIC.

Execução Financeira: Orçamento Executado: 1.746.350 € / 70 % do Total
 Participação Recebida: 640.371 € / 34,16 % do Total

- Avaliação:**
- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Pontos Fracos: | Pontos Fortes: |
| - Atraso na execução; | - Diálogo e consenso nas decisões; |
| - Dificuldades técnicas; | - Concertação entre os técnicos; |
| - Complexidade; | - Impulsionador de novas metas. |

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Desenvolvimento de aplicações de gestão da informação;
 2. Implementação de processos de actualização dos dados;
 3. 13 Certificações em CB TIC + 6 Acções de Formação.

Execução Financeira: 2.000.715 € / 80 % do Orçamento Total

- Perspectivas de Execução:**
- Positivas: Definição de novos objectivos; Responsabilização na informação disponibilizada;
 Negativas: Problemas e dificuldades que possam surgir.



Marc



Projecto | Objectivos | Tarifas | Contacto

Dentro de uma organização o fluxo de informação representa na maioria das vezes um entrave à tomada de decisões no tempo oportuno. Esta dificuldade vem-se a todos os níveis e é muitas vezes provocada pela excessiva burocratização dos processos.

Não raras vezes existe-se a uma recolha e tratamento de informação que apenas estará disponível quando a sua utilidade já estiver diminuída. Posteriormente a falta o excesso de cópias produzidas, gerando-lhe enormes volumes de resíduos com informação redundante.

Falta dificuldade de tratar informação é muitas vezes difícil intuir nas operações de produção planeadas que não existe conhecimento em tempo real e exausto dos impactos provocados pelas ocorrências verificadas no processo produtivo.

Por tudo isto a empresa considerou importante implementar dois sistemas de informação que visam diminuir a quantidade de papel a utilizar na empresa assim como diminuir os tempos de processamento da informação para que permitam efectuar intervenções em tempo útil.

A empresa pretende adoptar uma aplicação de gestão documental por forma a trabalhar apenas com informação em suporte digital diminuindo o recurso à duplicação de informação tanto em suporte de papel como em suporte informático (trouca de fitas).

Bastante esta aplicação criou um documento digital que se coloca num arquivo centralizado permitindo usufruir (através) aos utilizadores. Esta aplicação irá também gerar os acessos, as consultas, as permissões e as alterações necessárias.

No plano produtivo a empresa pretende dotar o sector industrial com terminais de recolha em tempo real, dos elementos do processo produtivo, nomeadamente operações realizadas, tempo de tempo, paragens de máquinas e respectivos custos, registo das não conformidades e das manutenções curativas. O lançamento dos ordens de fabrico será afectada por mais destes terminais permitindo reagir em tempo real as várias ocorrências que condicionam o planeamento da produção.

Com a adopção destas metodologias de trabalho a empresa pretende aumentar o seu eficiência e eficiência no tratamento da informação, reduzir custos de aquisição e manutenção da informação, ao tarifar de introdução dos dados no sistema serão drasticamente reduzidas, e melhorar o planeamento da produção em tempo real.

Vamos desta forma conseguir optimizar o planeamento, reduzindo os prazos de entrega das encomendas e optimizando a ocupação dos recursos, o que permitirá reduzir o custo de produção.

www.marc.pt/aveiro-digital/default.htm






Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



Marc



Apresentação

Projecto: MARC – Produtividade sem Papel

EBP: MARQUES, SA

Resultado Mais Importante: Aumentar a produtividade da empresa através da afectação eficiente dos recursos.

Utilidade: Diminuir o tempo de resposta às alterações verificadas no ambiente fabril.

Orçamento: € 145.276,00

Início/Fim 01/2004 – 12/2005 / 24 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 1





Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

Execução Técnica:

1. Aplicação em testes operacionais
2. Instalação da rede física de interação dos equipamentos industriais com a aplicação informática.

Execução Financeira:

Despesas Apresentadas: 16.620,67 € / 11,44 % do Total
Comparticipação Recebida: 1.683,14 € / 2,32 % do Total

Avaliação:

Dificuldade de cumprimento do prazo de entrega do fornecedor da Aplicação
Orçamentação reduzida de algumas rubricas do projecto
A aplicação responde às necessidades específicas da empresa

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica:

1. Conclusão total do Projecto
2. Nº Certificações em CB TIC: 100

Execução Financeira:

€135.000 /92,93 % do Total Orçamento

Perspectivas:

O atraso no fornecimento das aplicações está a condicionar a aquisição dos equipamentos.
A Tarefa Formação deverá ser iniciada assim que seja concluído o desenvolvimento das aplicações.



www.amria.pt/riaonline



Apresentação

Projecto:	Ria-on-Line
EBP:	Associação de Municípios da Ria
Resultado Mais Importante:	Portal Regional
Utilidade:	Disponibilização centralizada de informação e serviços da região da AMRia.
Orçamento:	50.000 €
Início/Fim	Jan. 2005 / Dez. 2006 (24 meses)
Nº Entidades Beneficiárias	1

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Produção do *site* do projecto
 2. Concursos para:
 - Aquisição de equipamento e sistemas operativos
 - Concepção e especificação técnica e funcional do Portal
 3. 101 Certificações em CB TIC

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 5.341,01 € / 10,68 % do Total
Comparticipação recebida: 881,25 € / 2,35 % do Total

Avaliação: Pontos Fracos: Não identificados
Pontos Fortes: Um único parceiro = Maior facilidade na gestão do projecto

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Especificação técnica e funcional do Portal
 2. Desenvolvimento do Portal Regional - Fases 1 e 2
 3. 214 Certificações em CB TIC

Execução Financeira: 30.000 € / 60 % do Total do Orçamento

Perspectivas de Execução: Positivas: Congregação de informação e serviços, com interesse público e privado numa plataforma única
Negativas: Atraso por problemas e dificuldades técnicas

Aveiro digital **ONDA**

www.ondavideo.com (acesso reservado)

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital **ONDA**



Apresentação

Projecto: ONDA – Onda Vídeo – Webização dos Sistemas/Serviços

EBP: ONDA VÍDEO – Audiovisuais, Lda

Resultado Mais Importante: Webização do Front e Back Office da Empresa – Criação do Arquivo Digital – Pagamentos On Line

Utilidade: Aumento considerável da produtividade e inter-actividade entre o Cliente– Empresa

Orçamento: 159,300,00 €

Início/Fim Janeiro.2004– Dezembro.2004 / 12

Nº de Entidades Beneficiárias: 1

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. 1º Plataforma de Gestão On Line ao fim de 2 meses
 2. 2º Implementação de Sistemas de Gestão e Organização
 3. 3º Digitalização do Arquivo da empresa

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 88.570,18 € / 55,60 % do Total
Complicação Recebida: 4.002,18 € / 5% do Total

Avaliação:

Pontos Fracos: Atraso no início do processo de definição e caracterização das aplicações e soluções por motivos da equipa

Dificuldades encontradas: Gestão da equipa, falta de mão-de-obra qualificada, falta de apoios bancários

Soluções encontradas: Admissão de novos quadros e pressão nos recebimentos

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Gestão Global da Empresa On-Line
 2. Arquivo Digital em pleno funcionamento On-Line
 3. 3 (total previsto no projecto)

Execução Financeira: 159.300,00 € / 100%

Perspectivas:

Positivas: Implementação com acessos e utilizações experimentais dos sistemas previstos

Negativas: Grandes dificuldades na execução financeira



portal.ua.pt/saiss

Apresentação

Projecto:	SAISS – Sistema de Apoio às Instituições de Solidariedade Social
EBP:	APPACDM de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Introdução, nas IPSS, de novos serviços e procedimentos baseados TIC
Utilidade:	Melhorar a qualidade dos serviços, tornando-os mais humanizados
Orçamento:	719.000 €
Início/Fim	01.04 – 12.06/ 36 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	9 Entidades

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Em conclusão PEU – Processo Electrónico de Utente
 2. Em implementação STC
 3. Elaborado protótipo do SIDEI

Execução Financeira: Despesa apresentada: 206.593,87 € / 28,73% do Total
Comparticipação recebida: 25.947,52 € / 5,16% do Total

- Avaliação:**
- Excessiva exigência a nível burocrático
 - Desfasamento entre apresentação e reembolso de despesas
 - + Capacidade de envolvimento e disponibilidade das Entidades
 - + Escolha estratégica dos parceiros tecnológicos
 - + Solicitudade da CEAD

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Implementação do PEU
 2. Início do STC
 3. N.º Certificações em CB TIC: 136

Execução Financeira: Despesa total acumulada prevista em 15 de Nov. 2005:
426.072 € / 59,3% do Orçamento Total

- Perspectivas:**
- Dificuldades de assumir compromissos financeiros face ao desfasamento referido
 - + Cumprimento do plano técnico do projecto
 - + Reforço da parceria com a inclusão de mais IPSS` s

Aveiro digital **ESTAG**



ESTAG

	+Projecto	+Objectivos	+Tarefas	+Contactos
Projecto	ESTAG - Estorágueda Global			
	<p>A missão da empresa é assente em quatro pressupostos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanhamento dos serviços antes e durante a execução dos trabalhos - Serviço Pós venda - Qualidade dos serviços a fornecer - Melhoria do processo de fornecimento e aplicação dos mesmos. <p>A empresa é confrontada com mutações da envolvente nacional e internacional, evoluções técnicas e constrangimentos de competitividade do sector de actividade. Os diferenciais de competitividade geram-se na conjugação da qualidade da organização empresarial com o domínio dos sistemas de informação relativos aos vários domínios/funções da empresa.</p> <p>A empresa tem consciência da necessidade da evolução permanente em termos tecnológicos com reflexos visíveis na organização industrial e na optimização do processo produtivo, permitindo-lhe aumentos progressivos de competitividade.</p> <p>Assim, o projecto é constituído por dois eixos principais:</p>			





Desenvolvido por: NETUÁL

www.estoragueda.com/estag




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital **ESTAG**






Apresentação

Projecto:	ESTAG – Estorágueda Global
EBP:	Estorágueda – Fabrico de Estores Laminados Lda.
Resultado Mais Importante:	Intranet de serviços
Utilidade:	Método de trabalho digital
Orçamento:	33.470,00 €
Início/Fim	01/2004 – 12/2005 – 24 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Web Site
 2. Intranet de serviços
 3. Equipamento

Execução Financeira: Despesa apresentada: 26.565,19 € / 79,37 % do Total
Comparticipação recebida: 4.112,07 € / 24,52% do Total

Avaliação: Pontos Fracos da Execução: Falta de formação
Pontos Fortes da Execução: Salto qualitativo em equipamento e serviços digitais. Web Site

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. 1º Resultado Importante a Alcançar: Formação
 2. 2º Resultado Importante a Alcançar: Conclusão do Projecto
 3. Nº Certificações em Competências Básicas TIC: 30

Execução Financeira: Despesa total prevista em 15 de Nov 2005:
33.470,00 € / 100 % do Total Orçamento

Perspectivas: Positivas: Melhoria geral da empresa
Negativas: Nada a registar



SIGRED




+Projecto	+Objectivos	+Tarefas	+Contactos
Projecto O Projecto ^			
<p>Este projecto, inserido no Programa Aveiro Digital 2003-2006, visa a concepção de um sistema de gestão dos parques regionais de equipamentos culturais, desportivos e recreativos de uso público. O objectivo é instalar na internet um núcleo de serviços de marcação, reserva e pagamento de serviços, equipamentos e recintos.</p> <p>Em interligação com o projecto ADRA prevê-se a colocação das iniciativas das associações no sistema.</p> <p>O objectivo geral assenta na construção de um espaço que, através de um backoffice permita às associações e autarquias colocarem os recintos e equipamentos disponíveis para reserva/mobilização em regime gratuito ou de aluguer.</p> <p>Colocando os equipamentos disponíveis para aluguer proporciona-se ao cidadão comum acesso a material que oficialmente tinha e, receitas extra para as entidades.</p> <p>A Rededucativa tem vindo já a promover o aluguer de algum equipamento desportivo próprio e de duas escolas com quem tem protocolos. De forma muito incipiente esta tarefa tem vindo a ser desenvolvida sem apoios informáticos, apenas as bases de dados estão informatizadas. v</p>			





Desenvolvido por: NETU.L

www.netual.pt/sigred




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



SIGRED






Apresentação

Projecto:	SIGRED – Sistema de Gestão de Recintos Desportivos
EBP:	Rededucativa
Resultado Mais Importante:	Sistema de gestão de recintos e equipamentos.
Utilidade:	Convergir a informação do equipamento e recintos a disponibilizar para aluguer
Orçamento:	119.874,90 €
Início/Fim	1/1/2005 – 30/6/2006 / 18 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	8




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Integração do SIGRed com o projecto Adira
 2. 1ª Versão do BackOffice de Gestão
 3. Aquisição de equipamento

Execução Financeira: Orçamento Executado: 63.636,08 € => 53,09% do total
Comparticipação Recebida: 4.039,14 € => 4,68% do total

Avaliação: Ponto Forte: Integração com o projecto ADIRA
Ponto Fraco: Nenhum

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Disponibilização do sistema às entidades participantes
 2. Disponibilização do sistema ao público
 3. 300 certificações até 31 Dezembro 2005

Execução Financeira: Despesa total prevista em 15 de Nov 2005:
112.161 € / 94% do Orçamento Total

Perspectivas: Positivas: Rápida concretização do projecto
Negativas: Nenhumas

Aveiro digital **e-CMEI**

e-CMEI

	+Projecto	+Objectivos	+Tarefas	+Contactos
Projecto	e-CMEI - Conselho Municipal de Educação em rede			
	<p>As alterações introduzidas na organização do sistema educativo com a criação dos grupos verticais de escolas e do Conselho Municipal de Educação (CME) realçam ainda mais a necessidade do envolvimento de todos os agentes locais (em particular das áreas da saúde, de acção social e de formação e emprego) incluindo as associações de pais e de alunos. A utilização das TIC's permite alargar o desafio da "Educação" a toda a comunidade. Este projecto pretende construir e validar um modelo, com base concelhia e centrado em Ílhavo, em que se pretende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplicar as TIC's ao funcionamento do CME Incrementar o envolvimento dos agentes que integram o CME Alargar a participação à comunidade, envolvendo-a na actividade do CME <p>Criar um espaço para informações sobre oportunidades educativas e de emprego Criar um espaço para indicação dos diferentes projectos educativos Facilitar a gestão e a manutenção dos recursos (materiais) educativos Formar os agentes educativos, na utilização das TIC's, no seu local de actividade</p> <p>A comunicação assenta numa plataforma web com um conjunto de serviços que permitem:</p>			

Desenvolvido por: NETU⁴L

www.cm-ilhavo.pt/e-cmei

Portugal Digital | Aveiro digital | Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital **e-CMEI**

Apresentação

Projecto: e-CMEI – Conselho Municipal de Educação em rede

EBP: Câmara Municipal de Ílhavo

Resultado Mais Importante: Aplicar as TIC's ao Conselho Municipal de Educação de Ílhavo

Utilidade: Melhorar a comunicação entre os elementos do CMEI e a comunidade

Orçamento: 131.750,00 €

Início/Fim: Jan/2004 – Dez/2006 / 36 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 5 Entidades

Portugal Digital | Aveiro digital | Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

**Execução
Técnica:**

1. Criação de mecanismos de cooperação entre os vários participantes no Projecto
2. Dotação de todos os Estabelecimentos de Ensino de meios necessários ao desenvolvimento do Projecto
3. Elaboração de caderno de encargos tendo em vista o desenvolvimento do portal e a aquisição dos back-offices

**Execução
Financeira:**

Despesas Apresentadas: 46.767,76 € / 35,50 % do Total
Comparticipação Recebida: 2.962,50 € / 3 % do Total

Avaliação:

Dificuldade na concertação com os outros Projectos da mesma área de intervenção
Empenhamento dos elementos do Conselho Municipal de Educação na concretização do Projecto

Execução Planeada até Dezembro de 2005

**Execução
Técnica:**

1. Execução e disponibilização do portal e-CMEI à comunidade
2. Implementação dos back-offices necessários à integração do Pré-Escolar e 1º Ciclo
3. 130 CB TIC

**Execução
Financeira:**

106.500,00 € / 81 % do Total Orçamento

Perspectivas:

Positivo: interação e divulgação de vários serviços à comunidade
Negativo: dificuldade na concertação com os outros Projectos da mesma área de intervenção



Peca	Estado		
000	Produção	Fresagens Convencionais (002)	Tp = 3.00, Tg = 0.00
001	Produção	Estruturamento (04)	Tp = 18.00, Tg = 0.00
002	Produção	Estruturamento (07)	Tp = 30.00, Tg = 0.00
003	Produção	Estruturamento (06)	Tp = 18.00, Tg = 0.00
012	Produção	Torneamento (02)	Tp = 4.00, Tg = 0.00
032	Produção	Torneamento (02)	Tp = 4.00, Tg = 0.00
300	Produção	Estruturamento (05)	Tp = 16.00, Tg = 0.00
301	Produção	Estruturamento (05)	Tp = 15.00, Tg = 0.00
300	Produção	Estruturamento (05)	Tp = 14.00, Tg = 0.00
201	Produção	Estruturamento (05)	Tp = 15.00, Tg = 0.00
362	Produção	Fresagens Convencionais (002)	Tp = 6.00, Tg = 0.00
300A	Produção	Estruturamento (05)	Tp = 23.00, Tg = 0.00
301A	Produção	Estruturamento (05)	Tp = 23.00, Tg = 0.00
300A	Produção	Estruturamento (05)	Tp = 25.00, Tg = 0.00
201A	Produção	Estruturamento (05)	Tp = 27.00, Tg = 0.00
M016	Produção	Montagem/Desmontagem (28)	Tp = 150.00, Tg = 4.17

www.madaleno.com (acesso reservado)



Apresentação

- Projecto:** Extraplas – Extranet de Gestão de Produção para Clientes
- EBP:** Madaleno – Moldes para a Indústria de Plásticos, Lda.
- Resultado Mais Importante:** Extranet de Serviços
- Utilidade:** Melhorar a comunicação dentro da empresa e com o cliente
- Orçamento:** 46.058 €
- Início/Fim** 15/10/04 – 15/10/05 / 12 Meses
- Nº de Entidades Beneficiárias:** 1

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. 1ª Versão Extranet on-line para Testes
 2. Site de Projecto
 3. Definição de requisitos do sistema

Execução Financeira: Despesa Apresentada: 33.685,02 € / 73,14 % do Total
Comparticipação Recebida: 6.761,76 € / 29,36 % do Total

Avaliação: Pontos Fracos: Momento do mercado
Pontos fortes: O grupo de pessoas envolvidas no projecto

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Implementação na produção do Software
 2. Implementação ao nível do cliente
 3. Formação de 30 colaboradores internos para a utilização da Extranet

Execução Financeira: 46.058 € / 100 % do Orçamento

Perspectivas: Estamos confiantes que no final do projecto vamos atingir os nosso objectivos, ter o sistema a funcionar e com isto conseguir melhorar/optimize a nossa comunicação quer internamente quer com o nosso cliente.

Projecto MuseAve






Administração | Objectivos | Caracterização | Contactos

Apresentação	<p>Objectivos</p> <p>O projecto tem como objectivo a elaboração de material de software ligado aos conteúdos dos vários núcleos museológicos dependentes das instituições participantes do consórcio, nomeadamente o EcoMuseu da Mairia da Troncalhada e Museu Etnográfico de Requeixo (Câmara Municipal de Aveiro), a Freguesia de Ouca (Câmara Municipal de Vagos) e o Museu da Palhaça (Câmara de Oliveira do Bairro).</p> <p>Com base na valorização de narrativas associadas à história e herança patrimonial local, pretende-se a criação de novos recursos educativos e pedagógicos informáticos que vão possibilitar a realização de visitas virtuais, o acesso a jogos educativos e a disponibilização no site de áreas de consulta que ficarão acessíveis via Internet.</p> <p>É ainda nosso objectivo que este projecto crie uma maior afinidade e motivação da população, sobretudo escolar e juvenil, para a história e para as questões do Património e que simultaneamente permita uma familiarização com os meios multimédia da sociedade da informação.</p>
Objectivos	
Caracterização	
Contactos	

www.ipmuseus.pt/museave/



Apresentação

- Projecto:** MUSEAVE – Rumos Cruzados/Esteios
- EBP:** Museu de Aveiro
- Resultado Mais Importante:** Um produto digital, de carácter lúdico-pedagógico, destinado a público dos 8 aos 12 anos de idade, pretende comunicar conteúdos museológicos e patrimoniais
- Utilidade:** Experimentação das tecnologias da informação e da comunicação em estratégias de fruição de colecções e espaços patrimoniais
- Orçamento:** 60.007 €
- Início/Fim** Fev. 2005 – Dez. 2006 / 23 meses
- Nº de Entidades Beneficiárias:** 4

Execução Realizada

**Execução
Técnica:**

1. Investigação bibliográfica e selecção das evidências materiais; Criação de um dossier de conteúdos
2. Planificação do produto multimédia a desenvolver
3. Execução do plano de certificação e formação: TIC e photoshop

**Execução
Financeira:**

Despesas apresentadas: 24.983,02 € / 41,63 % do total
Comparticipação recebida: 1.123,97 € / 2,6 % do total

Avaliação:

Pontos fracos: O projecto está sub-orçamentado; é necessário aperfeiçoar a metodologia de trabalho em consórcio
Pontos fortes: Cumprimento do cronograma e plano técnico-financeiro a 100% e excelente relação com o GAD

Execução Planeada até Dezembro de 2005

**Execução
Técnica:**

1. Realização dos guiões
2. Acompanhamento da elaboração da aplicação informática com base nos guiões fornecidos.
3. 100 Certificações em CB TIC

**Execução
Financeira:**

35.951 € / 59,9 % do total

Perspectivas:

Conseguir que a aplicação corresponda às nossas expectativas
Ter de modificar as características da aplicação por subavaliação das despesas nalgumas rubricas do projecto.

Aveiro digital **JFD**

JANEVES **JANEVES**

+Projecto +Objectivos +Tarefas +Contactos

Projecto **O Projecto**

A Janeves é uma empresa de substancial valor na região. Devido à sua fundação datar de 1931 reveste-se de uma responsabilidade acrescida. Devido aos seus colaboradores serem dos mais diversos locais, a Janeves tem uma penetração acentuada nos Municípios de Estarreja, Murtosa, Ovar e Aveiro.

A Janeves tem bom mercado nos PALOP e, visto este sistema proporcionar a gestão via internet, uma filial, cliente ou revendedor trabalha na empresa como se estivesse nas próprias instalações.

Pretende-se implementar um sistema que acompanhe o funcionamento da empresa em todas as vertentes, com um principal enfoque para um centro de convergência de informação interna. Pretende-se centralizar a informação e disponibilizá-la de forma orientada.

As funcionalidades identificadas numa primeira análise apontam para os seguintes itens (em plataforma Web):
 Gestão de Conhecimento - é importante o know how pertencer à firma,
 Gestão de Económico e do parque informático
 Gestão do parque informático,
 Gestão Documental,

Desenvolvido por: NETUÁL

www.janeves.pt/jfd

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital **JFD**

Apresentação

Projecto: JFD

EBP: Janeves – Industria de Móveis Metálicos, Lda

Resultado Mais Importante: Site

Utilidade: Imagem da empresa e catálogo on line

Orçamento: 49.491,00 €

Início/Fim: 01/2005 – 12/2005 – 12 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 1

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

Execução Técnica:

1. Web Site
2. Intranet de serviços – primeiras versões

Execução Financeira: Despesa apresentada: 13.008,00 € / 26,28 % do Total
Comparticipação recebida: 1.238,30 € / 5% do Total

Avaliação: Pontos Fracos: Não aquisição de equipamento
Pontos Fortes: Web Site potencia novos negócios

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica:

1. 1º Resultado Importante a Alcançar: Aquisição de equipamento
2. 2º Resultado Importante a Alcançar: Conclusão da intranet
3. Nº Certificações em Competências Básicas TIC: 45

Execução Financeira: Despesa total prevista em 15 de Nov 2005:
49.491,00 € / 100 % do Total Orçamento

Perspectivas: Positivas: Integração dos diversos serviços existentes na JANEVES

universidade de aveiro		PROGRAMA Aveiro Digital 2003 - 2006
introdução		
estrutura de coordenação		
projectos	PROJECTOS	
documentação	<ul style="list-style-type: none"> e-UAProcurement - e-ABS (99.310 €) 	
ligações	<ul style="list-style-type: none"> Sistema Integrado de Tele-Trabalho da UA - SITUA (820.000 €) 	
contacto	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de Contacto e Interação com a UA - ContactUA (200.000 €) 	
outros projectos com a participação da ua	<ul style="list-style-type: none"> Sistema Integrado para Biblioteca e Arquivo Digitais - SInBAD (325.000 €) 	
2º concurso aveiro digital	<ul style="list-style-type: none"> Rede de Aprendizagem Interactiva - Radical (175.000 €) 	
notícias	<ul style="list-style-type: none"> NARTURAL: Natureza e Arte - NARTURAL (200.000 €) 	

www.pad.ua.pt

Apresentação

Projecto:	SInBAD
EBP:	Universidade de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Portal da Biblioteca e Arquivo Digitais da UA
Utilidade:	Acesso aos conteúdos digitais e integração de dados de várias fontes
Orçamento:	325.000 €
Início/Fim	03.2004 - 02.2006 / 24 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Execução Realizada

**Execução
Técnica:**

1. Definição da arquitectura do sistema, capaz de integrar os vários tipos de recursos de uma forma distribuída aumentando a escalabilidade e fiabilidade. O sistema é baseado nas tecnologias XML, Web Services, Index Server e .NET
2. Protótipo do sistema – <http://sinbad.ua.pt>
– Suporta Livros, teses, cartazes, Jazz, artigos (ABC)
3. Colaboração entre os vários serviços da UA

**Execução
Financeira:**

Despesas apresentadas: 157.000,00 € / 48% do Total
Comparticipação recebida: 29.000,00 € / 12% do Total

Avaliação:

Pouco acervo digitalizado
Capacidade da equipa técnica

Execução Planeada até Dezembro de 2005

**Execução
Técnica:**


1. Versão final do sistema incluindo o acesso aos arquivos histórico e fotográfico e audiovisual
2. Digitalização do acervo
3. Nº Certificações em CB TIC: 454

**Execução
Financeira:**

293.000,00 € / 90% do Total do Orçamento

Perspectivas:

- + Conclusão da implementação do portal com características e facilidades que ultrapassam o previsto
- Dificuldades na digitalização (e pouca verba para ter um acervo significativo)

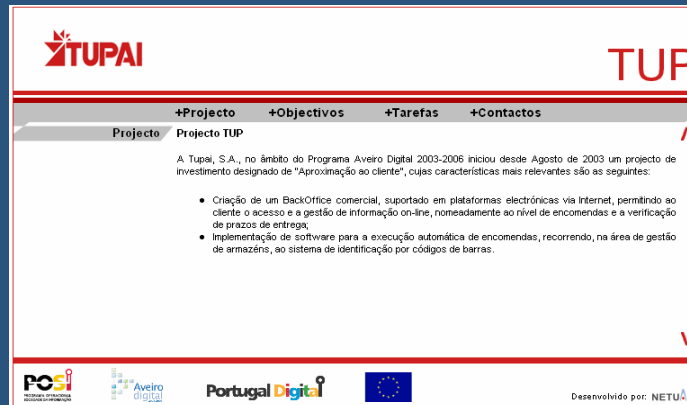

The screenshot shows the TUP project website interface. At the top left is the TUPAI logo, and at the top right is the word 'TUP'. Below these are navigation tabs: '+Projecto', '+Objectivos', '+Tarefas', and '+Contactos'. The 'Projecto' tab is selected, showing the title 'Projecto TUP'. Below the title is a paragraph of text: 'A Tupai, S.A., no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003-2006 iniciou desde Agosto de 2003 um projecto de investimento designado de "Aproximação ao cliente", cujas características mais relevantes são as seguintes:'. This is followed by a bulleted list of three points: 'Criação de um BackOffice comercial, suportado em plataformas electrónicas via Internet, permitindo ao cliente o acesso e a gestão de informação on-line, nomeadamente ao nível de encomendas e a verificação de prazos de entrega;', 'Implementação de software para a execução automática de encomendas, recorrendo, na área de gestão de armazéns, ao sistema de identificação por códigos de barras.', and 'Criação de um BackOffice comercial, suportado em plataformas electrónicas via Internet, permitindo ao cliente o acesso e a gestão de informação on-line, nomeadamente ao nível de encomendas e a verificação de prazos de entrega;'. At the bottom of the screenshot are logos for POSI, Aveiro digital, Portugal Digital, and the European Union flag, along with the text 'Desenvolvido por: NETUÓL'.

www.tupai.pt/tup

Apresentação

Projecto:	TUP, APROXIMAÇÃO AO CLIENTE
EBP:	TUPAI – Fábrica de Acessórios Industriais, S.A. Melhoria da performance do backoffice comercial, nomeadamente através do acesso a informação "on-line" por parte dos clientes, e a implementação de software para execução automática de encomendas
Resultado Mais Importante:	
Utilidade:	Melhorar a satisfação do cliente, e aumentar a eficácia e eficiência da relação comercial
Orçamento:	214.790,00 Euros
Início/Fim	Agosto 2003 – Janeiro 2006 (30 Meses)
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Execução Realizada

Execução Técnica:

1. Desenvolvimento e a implementação das plataformas e interfaces aplicacionais do backoffice comercial está realizado, prevendo-se a sua operacionalização no 3º trimestre de 2005.
2. Início do desenvolvimento do software e aquisição de equipamentos associados à execução automática de encomendas.
3. Certificação de 40 colaboradores da empresa em CB TIC.

Execução Financeira: Investimento realizado de 125.828 € / 58,6 % do investimento orçamentado
Comparticipação recebida de 2.679 € / 2,1 % do investimento previsto)

Pontos Fortes: Objectivos estão a ser concretizados; determinação da empresa em executar o projecto na sua plenitude.

Pontos Fracos: Existe algum atraso na implementação do projecto, influenciado pela conjuntura económica desfavorável; dificuldades pontuais na coordenação do projecto e na implementação das várias soluções técnicas envolvidas.

Avaliação:

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica:

1. Implementação do software para a automatização do armazém de expedição, prevendo-se a sua entrada em funcionamento no início de 2006.
2. Realização de 50 certificações em CB TIC

Execução Financeira: Investimento acumulado previsto de 175.828 € em 15 de Nov. 2005 (81,9 % do investimento orçamentado)

Positivas: Execução global do projecto e cumprimento dos objectivos propostos de melhorar a satisfação do cliente e a eficiência da relação comercial.

Perspectivas:

Negativas: O projecto vai ser implementado com ligeiro atraso em relação ao cronograma inicial. Afectação de recursos para a execução atempada e rigorosa do projecto.



Mobi-Ria

Descrição Genérica

- Descrição Genérica
- Metodologia Global de Execução
- Justificação da Utilidade dos Resultados
- Descrição dos Objectivos Finais
- Entidades Beneficiárias

O primeiro objectivo deste projecto é a melhoria da circulação rodoviária associado às grandes vias internodais Águeda-Aveiro-Ílhavo e Estarreja-Aveiro-Ílhavo. É esperado ainda um impacto directo e indirecto sobre a qualidade do tráfego urbano interno em Aveiro.

Os sistemas a instalar e a operar baseiam-se na observação e medida de tráfego em formato de imagem on-line e em sistemas de telecção semafórica.

Os Serviços de Rede a utilizar devem garantir as funcionalidades mínimas necessárias à operação fiável dos sistemas mas também a sua sustentabilidade e potencial expansão à Região de Alentejo, sendo assim necessária a integração na rede de sistemas baseados em UMTS, GPRS e ADSL.

A aplicação de configuração e gestão dos sistemas vai ainda permitir a integração de serviços de informação multicanal via web, tlm, rádio e painéis públicos de informação.

O acesso ao Portal TransPOR.pt será integrado no sistema, comprometendo-se a gestão do Mobi-Ria a cooperar com a DGT para garantir a máxima qualidade da resposta regional no TransPOR.pt e promover a máxima adesão dos operadores regionais ao sistema nacional.

As Empresas e Condutores registados e aderentes ao serviço terão informação directa e em tempo real sobre as condições de Tráfego requeridas e os Parques de Estacionamento poderão gerir melhor a sua capacidade, informando atempadamente o Centro Coordenador. Durante o projecto será instalado e operacionalizado um Centro de Coordenação de Tráfego, articulado com os sistemas de segurança, policiamento e protecção civil.

www.cm-aveiro.pt/mobiria

Apresentação



Projecto:	Mobi-ria – Mobilidade na Região da Ria de Aveiro
EBP:	Câmara Municipal de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Serviço de gestão de tráfego urbano e internodal:Aveiro-Águeda-Ílhavo-Estarreja
Utilidade:	Mais qualidade na Gestão da mobilidade das pessoas e operadores de transportes
Orçamento:	407.400€
Início/Fim	Jan/2005 – Dez/2006 (24 meses)
Nº de Entidades Beneficiárias:	5

Execução Realizada

Execução Técnica:

1. Especificação da arquitectura e funcionalidades
2. Selecção dos equipamentos
3. Construção do site de projecto

Execução Financeira: Despesa Efectuada: 5.959 € / 1,46% do Total
Comparticipação Recebida: 7.219 € / 2,36% do Total

Avaliação:

Pontos fracos: Limitação orçamental, constituindo um constrangimento na escolha de mais e melhor equipamento
Pontos Fortes: Mais valia para a região, com um serviço útil às empresas e à população

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica:

1. Aquisição e montagem dos equipamentos
2. Formação de funcionários na operação do Serviço
3. Nº Certificações em CB TIC: 15

Execução Financeira: 288.415 € / 70.8 % do Total do Orçamento

Perspectivas: Aceleração da Execução, com serviço operacional em 2006
Melhoria nas condições de tráfego, servindo a população e as empresas de Aveiro-Águeda-Ílhavo-Estarreja

Geoinvest

A AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro e a AMISA – Associação de Municípios da Ria pretendem, ao abrigo do Programa Aveiro Digital, incrementar uma nova floresta subsectora ao desenvolvimento regional da área de influência da AMISA (Águeda, Albergaria-a-Vieira, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murteira, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos) – Capital Investment de Elevada Valor Acrescentado, através da criação de um modelo que identifique Zonas Industriais de Nova Geração (ZINOG).

Esta nova estratégia de atracção de empresas de nova geração (por exemplo na área de Biotecnologia, Ambiente, Energias Renováveis e das TIC), considera vários requisitos específicos, nomeadamente infra-estruturas avançadas, acessibilidades de qualidade, serviços qualificados de apoio, indicadores de qualidade de vida (equipamentos de saúde, ensino, lazer, entre outros), permitindo identificar e definir a localização de espaços inter-municipais de elevada qualidade.

Neste contexto, o Geoinvest pretende criar um Serviço de Informação Georeferenciado, capaz de integrar, gerar e estruturar a informação existente, permitindo dar uma resposta rápida, eficaz e concisa às várias tipologias de solicitações, colocadas pelos utilizadores, facilitar o acesso à informação, através da sua disponibilização online e conceber um modelo que identifique as localizações possíveis para a ZINOG.

Objectivos:
Tarefas:
Contactos:

www.aida.pt/geoinvest

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Geoinvest

Apresentação

Projecto: Geoinvest – Dinamização de Zonas Industriais de Nova Geração

EBP: AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro

Resultado Mais Importante: Delimitação de Zonas Industriais de Nova Geração

Utilidade: Captação de empresas de valor acrescentado

Orçamento: 289.165,10 €

Início/Fim: Out.2003 – Dez.2005 / 27 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 2

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

Execução Técnica:

1. Realização do estudo de Identificação de parâmetros para a localização de ZING's
2. Introdução na Base de Dados dos temas do SIG/Ria disponíveis
3. Formação e 17 Certificações em CB TIC

Execução Financeira:

Despesas apresentadas: 89.175,75€ / 30,8 % do Total
Comparticipação recebida: 9.776,71€ / 6,73% do Total

Avaliação:

Dificuldade na obtenção de Informação
Articulação e colaboração com outras entidades, nomeadamente Autarquias

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica:

1. Disponibilização do Modelo de localização de ZING's
2. Disponibilização de um Balcão on-line de Apoio às empresas
3. 25 Certificações em CB TIC

Execução Financeira:

Despesa total acumulada prevista em 15 de Nov 2005
134.707,66€ / 46,58% do Total Orçamento

Perspectivas:

1º passo para a Criação de Espaços Empresarias qualificados para a instalação de empresas de Nova Geração
Compilação de informação sobre a região da AMRia e sua disponibilização "on-line"



www.aida.pt/geoinvest



Apresentação

Projecto:	GeoMKT – GeoInvest–Marketing
EBP:	AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Captar Empresas de Nova Geração para a Região
Utilidade:	Divulgação das vantagens das ZING na área de influência da AMRia
Orçamento:	139.297,80 €
Início/Fim	Janeiro.2004 – Abril.2006 / 28 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	2

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Realização do Workshop Inicial
 2. Realização do Seminário de Sensibilização de TIC
 3. Criação da Imagem do Projecto

Execução Financeira: Despesas apresentadas: 32.258,19€ / 23,16% do Total
Comparticipação recebida: 1.401,86€ / 2% do Total

Avaliação: Dificuldade em encontrar uma Imagem com impacto junto do público alvo, que traduza a importância do projecto
Oradores com um vasto conhecimento das temáticas apresentadas e capacidade mobilizadora dos participantes

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Divulgação Nacional e Internacional do Projecto
 2. Realização do Workshop Final
 3. 100 Certificações em CB TIC:

Execução Financeira: Despesa total acumulada prevista em 15 de Nov 2005
38.044,77€ / 27,3% do Total do Orçamento

Perspectivas: Captar investimento nacional e estrangeiro de valor acrescentados para a área de influência da AMRia

Aveiro digital **FIG-NET**



FIG NET

+Projecto	+Objectivos	+Tarefas	+Contactos
Projecto ▲			
<p>FIG – Fábrica de Plásticos, em REDE</p> <p>A missão da empresa é assente em quatro pressupostos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanhamento dos serviços antes e durante a execução dos trabalhos - Serviço Pós venda - Qualidade dos serviços a fornecer - Melhoria do processo de fornecimento e aplicação dos mesmos. <p>A empresa é confrontada com mutações da envolvente nacional e internacional, evoluções técnicas e constrangimentos de competitividade do sector de actividade. Os diferenciais de competitividade geram-se na conjugação da qualidade da organização empresarial com o domínio dos sistemas de informação relativos aos vários domínios/funções da empresa.</p> <p>A empresa tem consciência da necessidade da evolução permanente em termos tecnológicos com reflexos visíveis na organização industrial e na optimização do processo produtivo, permitindo-lhe aumentos progressivos de competitividade.</p> <p>Assim, o projecto é constituído por dois eixos principais: ▼</p>			





Desenvolvido por: NETU^{AL}

www.netual.pt/fig/

Portugal Digital
Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital **FIG-NET**






Apresentação

Projecto:	FIG-NET – FIG-Fábrica de Plásticos, em Rede
EBP:	FIG – Fábrica de Plásticos Lda.
Resultado Mais Importante:	Intranet de serviços
Utilidade:	Método de trabalho digital
Orçamento:	33.143,59 €
Início/Fim	01/2004 – 12/2005 – 24 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Web Site
 2. Intranet de serviços
 3. Equipamento

Execução Financeira: Despesas apresentadas: 27.230,22 € / 82,16 % do Total
Comparticipação recebida: 4.011,01 € / 24,08 % do Total

Avaliação: Pontos Fracos da Execução: Falta de formação
Pontos Fortes da Execução: Salto qualitativo em equipamento e serviços digitais. Web Site

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. 1º Resultado Importante a Alcançar: Formação
 2. 2º Resultado Importante a Alcançar: Conclusão do Projecto
 3. Nº Certificações em Competências Básicas TIC: 30

Execução Financeira: Despesa total prevista em 15 de Nov 2005:
33.143,59 € / 100 % do Total Orçamento

Perspectivas: Positivas: Melhoria geral da empresa
Negativas: Nada a registar



www.atletica.pt

Apresentação

Projecto:	ATLETICA – Sistema Integrado de Informação para Atletismo
EBP:	Atletica Ibérica Organizações Desportivas, Lda.
Resultado Mais Importante:	Implementação de um sistema integrado de informação para os participantes em provas de atletismo.
Utilidade:	Facilitar e modernizar todo o processo de informação, inscrição, cronometragem e divulgação de resultados em provas de atletismo.
Orçamento:	56.250,00 €
Início/Fim	Março 2005– Novembro 2005 / 8 meses
Nº de Entidades Beneficiárias	1

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Avaliação de requisitos
 2. Versão experimental do sistema
 3. 15 Certificações em CB TIC

Execução Financeira: Despesa Apresentada: 31.227,14€ / 55,51% do Total

Pontos fracos: Pouca disponibilidade de tempo e pessoal para acompanhamento e execução mais atempada do projecto.

Avaliação: Pontos fortes: Motivação e tomada de consciência colectiva dos colaboradores da empresa para a importância estratégica deste projecto.

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Avaliação do funcionamento integrado
 2. Avaliação final
 3. Nº Certificações em CB TIC: 60

Execução Financeira: 56.250 € / 100% do Total do Orçamento

Perspectivas:
Positivas: Boa aceitação por parte do mercado-alvo e reforço da imagem da empresa
Negativas: A dificuldade de convergir diferentes softwares para uma só solução integrada.



Aveiro digital

SICAVIM

Município de Mira

Legenda

- Temas
- Números de Policia
- Marcos Propriedade
- Prédios
- Edifícios
- Construções
- Cadastro Diferido
- Áreas Sociais
- Ortofotos2K

Actualizar Mapa

Auto Refresh

Help:

- A closed group, click to open.
- An open group, click to close.

www.cm-mira.pt/website/cadastr/



Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



Aveiro digital

SICAVIM

Apresentação

Projecto:	SICAVIM – Sistema de Informação Cadastral de Vagos, Ílhavo e Mira
EBP:	Câmara Municipal de Mira
Resultado Mais Importante:	Partilha e actualização/validação da informação cadastral entre Finanças, Conservatória e Câmaras Municipais
Utilidade:	Gestão Territorial mais eficiente e justa – Referência espacial dos processos administrativos – Rapidez na consulta e actualização
Orçamento:	493.985 €
Início/Fim	01.2004 – 12.2006 / 36
Nº de Entidades Beneficiárias:	3



Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

**Execução
Técnica:**

1. Protocolo com IGP – SINERGIC
2. Integração do Cadastro na Base de Dados SIG
3. Aquisição de GPS (Rede Apoio Geodésica)
4. Aquisição de PC's portáteis (Actual. Cadastral)
5. Projecto piloto de actualização cadastral na Freguesia dos Carapelhos

**Execução
Financeira:**

Despesas Apresentadas: 177236,35 € / 36 % do Total
Comparticipação Recebida: 9.512,69 € / 2,57 % do Total

Avaliação:

– Grau de desactualização cadastral (10 Anos)
+ Motivação/Adesão da população local

Execução Planeada até Dezembro de 2005

**Execução
Técnica:**

1. Rede de apoio topográfico
2. Validação dos procedimentos de manutenção cadastral
3. Actualização da base cadastral (geométrica e descritiva)
4. Consulta on-line do cadastro
5. N° Certificações em CB TIC: 150

**Execução
Financeira:**

225.868 € / 48,8 % do Total Orçamento

Perspectivas:

Volume de trabalho de campo para actualização da informação
+ Integração com aplicações autárquicas (AIRC e Medidata)



www.incluinet.com

Apresentação

Projecto:	Incluinet – Portal para Todos
EBP:	Associação de Solidariedades Social do Silveiro
Resultado Mais Importante:	Diminuição de pessoas info-excluídas
Utilidade:	Acesso às TIC pela população-alvo
Orçamento:	110.000€
Início/Fim	Dezembro de 2004 – Dezembro de 2006 / 24 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	6

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Salas Multimédia
 2. Formação aos utentes e funcionários das instituições
 3. Desenvolvimento do Portal e serviços Web acessíveis ao público

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 77.471,24 € / 70,43 % do Total
Comparticipação Recebida: 14.210,84 € / 18,57 % do Total

Avaliação: Atraso na instalação das salas multimédia
Presença/Participação das entidades para a execução das tarefas; realização dos resultados definidos no SAVAD;

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Acções de Formação em Serviços e Aplicações
 2. Divulgação e Utilização do Portal
 3. 50 Certificações em CB TIC

Execução Financeira: 88.000€ / 80% do Total

Perspectivas: Permitir a massificação do acesso às tecnologias de Informação, por parte da população-alvo;
Reduzir assimetrias no acesso à novas tecnologias.



Preferido ao desenvolver um projecto integrado com reflexos directos em diversas actividades da empresa.

- Desenvolvimento de duas aplicações específicas para realização de auditorias no âmbito da prestação de serviços na implementação de sistemas de qualidade ISO 9001:2000 e HACCP. Estes ferramentas permitiu reduzir significativamente a duração do serviço e assim gerar em competitividade e satisfação do cliente.
- Desenvolvimento de uma plataforma de back office documental / extranet que permitiu ao cliente o acesso directo via web à sua informação e ao desenvolvimento dos vários serviços contratados e ainda permitiu aos colaboradores da empresa o acesso a documentos de trabalho pela mesma via em qualquer ponto geográfico de desenvolvimento de trabalho.
- Implementação do back office de gestão documental (digitalização, arquivo e organização) com vista à redução da circulação de informação em papel e permitindo a sua disponibilização imediata no acesso via web. Do ponto de vista do acesso de clientes, pretende-se que os documentos de trabalho gerados no âmbito da prestação de serviços (relatórios, estudos, diagnósticos...) sejam disponibilizados online à medida que vão sendo desenvolvidos. Desta modo, cada cliente pode, a qualquer momento, ter acesso ao material que vai sendo gerado, consultando e verificando o estado de evolução do serviço contratado, gerando de uma maior participação do cliente. Este acesso reservado a cada um dos clientes, fornecerá mais clareza e desenvolvimento dos trabalhos e permitirá ao cliente obter um melhor grau de conhecimento do serviço que contratou.



www.hmconsultores.pt/hmc



Apresentação

Projecto:	HMC
EBP:	HM Consultores
Resultado Mais Importante:	Criação de uma Extranet para acesso de clientes e colaboradores Sistema de Gestão Documental
Utilidade:	Redução de custos com economato, maior eficiência no serviço
Orçamento:	€ 90.100 €
Início/Fim	01.2004 - 12.2005 / 24 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Execução Realizada

Execução Técnica:

1. Conclusão da 1ª Fase do Projecto
2. Especificação total do Sistema concluída

Execução Financeira:

Despesa apresentada: 17.855€ / 19,8 % do Total
Comparticipação recebida: 4.040€ / 8,93% do Total

Avaliação:

Pontos Fracos: Atraso na especificação interna e definição do software para auditorias em HACCP e Qualidade.
Pontos Fortes: Criação de uma task-force afecta ao projecto.
1ª fase do projecto completamente concluída.

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica:

1. Back Office com acesso externo operacional
2. Sistema de Gestão Documental implementado
3. Nº Certificações em CB TIC: 14 (já realizadas)

Execução Financeira:

59.097 € / 80,6%

Perspectivas:

Positivas: Prossecução dos objectivos propostos em candidatura
Negativas: Possível atraso no desenvolvimento do software para as áreas de HACCP e Qualidade



MEMDigital

MUSEUegasmoniz
DIGITAL
MEMDigital

+Projecto
+Objectivos
+Tarefas
+Contactos

Projecto MEMDigital

A Casa Museu Egas Moniz, criada pelo professor e investigador científico – Egas Moniz, encerra para além da raridade do seu espólio artístico constituído por peças de beleza únicas que nos conduzem a um encontro com o criador deste ambiente e onde nos é possível perceber os seus gostos, predilecções e de uma forma implícita somos levados a conhecer o seu percurso de vida que foi notabilizado com a atribuição do Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia a 27 de Outubro de 1949.

Para além do seu aspecto artístico, é igualmente importante o seu acervo histórico e documental, porque através dele é possível fazer o percurso da actividade científica de Egas Moniz e perceber de forma clara toda a evolução da Angiografia Cerebral e da Leucotomia Prefrontal, bem como das suas actividades como Professor, Médico, Escritor, Político e Coleccionador.

Este acervo, é inequivocamente uma ferramenta de trabalho imprescindível a todos aqueles que pretendam investigar, não só o percurso científico de Egas Moniz, como igualmente permite perceber o relacionamento de Egas Moniz com mundo científico internacional durante a 1ª metade do século XX. Este conhecimento é possível porque o acervo documental da Casa Museu Egas Moniz é irrefutavelmente único no que concerne à ligação de Egas Moniz, com as mais importantes figuras da medicina internacional e onde pela sua análise se consegue "o fio condutor", da evolução científica internacional. Através dos seus manuscritos e de um outro sem número de documentação é igualmente possível perceber as relações de Egas Moniz com o Mundo e consigo próprio e desta





Desenvolvido por: NETU^{UL}

www.cm-estarreja.pt/memdigital




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



MEMDigital






Apresentação

Projecto: MEMDigital – Museu Egas Moniz Digital

EBP: Câmara Municipal de Estarreja

Resultado Mais Importante: Digitalização do acervo documental e sua divulgação na Internet e no centro de pesquisa documental

Utilidade: Evitar a consulta física do acervo e facilitar a consulta a investigadores dispersos geograficamente

Orçamento: 196.011,25 €

Início/Fim JAN/2004 – DEZ/2005 / 24 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 1




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

Execução Técnica:

1. A 1ª fase de digitalização do acervo documental está concluída. A 2ª fase está a ser lançada.
2. Aquisição da plataforma de serviços Intranet/Internet está na fase final de adjudicação.
3. Equipamento informático do Centro de Pesquisa Documental já foi adquirido.

Execução Financeira:

Despesa apresentada: 50.488,49 € / 25,76% do total
Comparticipação recebida: 2.396,71 € / 1,7% do total

Avaliação:

Atraso no lançamento da empreitada de beneficiação do local em termos de infra-estruturas.
Atraso no lançamento do concurso para aquisição da plataforma de serviços.
Alguma dificuldade na escolha do sistema de acompanhamento virtual dos visitantes do Museu. Este processo sofreu alguns avanços e recuos.

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica:

1. Digitalização de 50.000 páginas do acervo documental da Casa Museu Egas Moniz. Divulgação na Intranet /Internet.
2. Inauguração do Centro de Pesquisa Documental. Arranque da página Internet com divulgação do acervo documental, visita virtual e conteúdos diversos.
3. Nº Certificações em CB TIC: 200

Execução Financeira:

Despesa total acumulada prevista em 15 de Nov 2005:
146.022,00 € / 75% do Total Orçamento

Perspectivas:

Prevê-se a abertura de todos os serviços ao público durante o mês de Novembro de 2005. Nomeadamente o Centro de Pesquisa Documental, a plataforma Intranet / Internet, visita virtual na Internet, o acompanhamento virtual dos visitantes através de visitas sonoras temáticas e a pesquisa ao acervo documental digitalizado com critérios de selecção através da Internet.

Aveiro digital **SEMIAR**

EXPOSIÇÃO AVEIRO DIGITAL
1, 2, 3 de Julho

semIar
gabinete de comunicação e publicidade

ÍNDICE | EMPRESA | SERVIÇOS | FORMIGLAD | CONTACTOS | NOTÍCIAS



Semiar - Gabinete de Comunicação e Publicidade Unipessoal, Lda
Realizamos todo o tipo de eventos.

- > Apoio a empresas;
- > Sites, damos formação;
- > Fazemos / refazemos a imagem da sua empresa "logotipo, cartas, envelopes e cartões".

O seu tempo é precioso, nós ajudamos a rentabilizá-lo, **contacte-nos**.

DESIGN/DEVELOPADO POR: WWW.TELEMAR.NET

Aveiro digital | PCSI | Portugal Digital | Audio ON

www.semiar.moliceiro.com

Portugal Digital | Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital **SEMIAR**

Apresentação

Projecto: SEMIAR – Sistema Integrado de Informação da Semiar

EBP: Semiar– Gab. Comunicação e Publicidade Unipessoal, Lda.

Resultado Mais Importante: Execução de serviços de back-office e de edição on-line

Utilidade: Modernização dos processos internos e melhoria da qualidade de serviço prestado aos clientes

Orçamento: 45.700 €

Início/Fim 12-11-04 / 12-09-05 (10 Meses)

Nº de Entidades Beneficiárias: 1






Portugal Digital | Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Aquisição de equipamentos
 2. Início do desenvolvimento da aplicação
 3. A decorrer a fase experimental do projecto

Execução Financeira: Orçamento Executado: 23.599,77 € / 52% do Total
Comparticipação Recebida: 1.142,92 € / 5% do Total

Avaliação:
Pontos Fracos: Atraso na implementação e na gestão de todo o processo.
Pontos Fortes: Modernização da empresa, qualidade nos serviços de gestão, motivação generalizada.

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Rentabilizar o sistema com maior abordagem aos clientes
 2. A formação e certificação dos funcionários
 3. Certificações em CB TIC: 35

Execução Financeira: Despesa total prevista em 15 de Nov 2005:
45.700€ / 100 % do Total Orçamento

Perspectivas:
Positivas: melhoria geral da empresa – eficácia e rentabilidade.
Boas possibilidades de conclusão dentro do prazo previsto com os objectivos atingidos
Negativas: alguma dificuldade na adaptação aos novos métodos



www.amria.pt/securria



Apresentação

Projecto:	Secur-Ria – Segurança na Região da Ria de Aveiro de Aveiro
EBP:	Associação de Municípios da Ria
Resultado Mais Importante:	Planos e Carta de Risco e Segurança da região da AMRIA
Utilidade:	Melhorar a Gestão de Recursos e a Intervenção
Orçamento:	460.950 €
Início/Fim	Dez.2004–Dez.2006 / 24 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	12

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Especificação dos Planos Municipais de Emergência
 2. Especificação da Carta de Risco e Segurança - Objectos e Campos
 3. Especificação dos Equipamentos a adquirir

Execução Financeira: Despesa Apresentada: 15.982 € / 3,47 % do Total
Comparticipação Recebida 6.235 € / 1,80 % do Total

Avaliação: Pontos Fracos: Dificuldade no desenvolvimento da concertação entre os parceiros e Várias especificidades técnicas
Pontos Fortes: Estabelecimento de Directrizes Consensuais

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Aquisição de todos os Equipamentos
 2. Elaboração dos Planos Municipais de Emergência
 3. N° Certificações em CB TIC: 16

Execução Financeira: 258.342 € / 56 % do Total

Perspectivas: Positivas: Consenso nas Opções de Serviços Secur-Ria
Negativas: Atrasos no Carregamento da Informação nas BD

Aveiro digital **ISSI**

www.edulearn.pt/issi

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital **ISSI**

Apresentação

Projecto:	ISSI – Inclusão Social na Sociedade de Informação
EBP:	Cáritas Diocesana de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Constituição e dinamização de 9 Centros de Info-Inclusão
Utilidade:	Alargar o acesso às TIC aos grupos cultural e socialmente desfavorecidos
Orçamento:	142 499, 02 €
Início/Fim	Novembro 2004 – Maio 2006 /18 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	8

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

**Execução
Técnica:**

1. Certificação de 9 Técnicos em CB TIC e Formação de 9 Técnicos em Serviços e Aplicações
2. Aquisição do Equipamento Informático
3. Início da construção do Portal do Projecto

**Execução
Financeira:**

Despesas Apresentadas: 72.253,09 € / 51 % do Total
Comparticipação Recebida: 2885,94€ / 2,89 % do Total

Avaliação:

– Atraso na implementação dos Centros de Info-Inclusão
+ Recuperação da execução financeira da 1ª para a 2ª apresentação de despesas no SAVAD

Execução Planeada até Dezembro de 2005

**Execução
Técnica:**

1. Funcionamento em pleno dos Centros de Info-Inclusão
2. Instalação do Portal do Projecto
3. Nº Certificações em CB TIC: 30

**Execução
Financeira:**

108.300 € / 76 % do Total

Perspectivas:

Conseguir obter uma execução técnica e financeira de acordo com a lista de resultados das tarefas do projecto e com a planificação elaborada

uebe.SI

ponto.C sistemas de informação

Projecto Tarefas Contactos

Projecto

O projecto é composto por três componentes abrangidas pela área de intervenção 7.5:

Infra-estrutura tecnológica com base em tecnologias de ponta na área da informação / comunicação vocacionadas para:

- gestão e monitorização de projectos com o acompanhamento pelo cliente on-line, incluindo a monitorização e geração OLAP em ambiente Web, gestão documental e workflow;
- a comunicação com os clientes, incluindo a gestão de contactos, a satisfação dos clientes, a gestão das reclamações e os pagamentos on-line serão suportado por uma extranet;
- a implementação do teletrabalho potenciando a comunicação com os colaboradores internos;

A solução de extranet será implementada em clientes da Ponto.C, aumentando desta forma o número de empresas que usufruem de um sistema com back-office e front-office, em ambiente Web.

<http://uebesi.pontoc.pt/>

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

uebe.SI

Apresentação

Projecto:	Uebe.SI – Sistemas de Informação da Ponto.C
EBP:	Ponto.C – Sistemas de Informação
Resultado Mais Importante:	Gestão de Projectos e integração com a plataforma do cliente
Utilidade:	Optimização de processos internos e melhoria da relação com o cliente
Orçamento:	40.750 €
Início/Fim	Jan / 2005 – Dez/2005 (12 Meses)
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

**Execução
Técnica:**

1. Plataforma de Tele-trabalho funcional
2. Gestão de projectos (plataforma interna) – Versão inicial
3. Aprovisionamento de Hardware

**Execução
Financeira:**

Despesas apresentadas: 16.173 € / 40% do Total
Comparticipação recebida: 1.021€ / 5% do Total

Avaliação:

Ligeiro atraso na implementação da plataforma do cliente
Antecipação da plataforma de Tele-Trabalho

Execução Planeada até Dezembro de 2005

**Execução
Técnica:**

1. Plataforma do cliente (actualmente em protótipo)
2. Gestão e Monitorização de projectos
3. N° Certificações em CB TIC: 3

**Execução
Financeira:**

37.000 € / 90 % do Total

Perspectivas:

Implementação da totalidade do sistema previsto, adicionando novas funcionalidades já detectadas e não previstas.

 universidade de aveiro	PROGRAMA Aveiro Digital 2003 - 2006
<ul style="list-style-type: none"> • introdução • estrutura de coordenação • projectos • documentação • ligações • contacto • outros projectos com a participação da ua • 2º concurso aveiro digital • notícias 	<p>PROJECTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-UProcurament - e-ABS (99.310 €) • Sistema Integrado de Tele-Trabalho da UA - SITUA (820.000 €) • Sistema de Contacto e Interação com a UA - ContactUA (200.000 €) • Sistema Integrado para Biblioteca e Arquivo Digitais - SinBAD (325.000 €) • Rede de Aprendizagem Interactiva - Radical (175.000 €) • NARTURAL: Natureza e Arte - NARTURAL (200.000 €)

www.pad.ua.pt/



Apresentação

Projecto:	Natural – Natureza e Arte
EBP:	Universidade de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Site Web e DVD Natural
Utilidade:	Produção de Produtos e Serviços na Interface entre Ciência e Arte
Orçamento:	200.000 €
Início/Fim	01.05 – 12.06 / 24 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Contacto com Comunidade AMRIA
 2. Definição de Produtos e Serviços
 3. Aquisição de equipamento

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 39.000,00 € / 19.5 % do Total
Comparticipação Recebida: 5.000,00 € / 3.3 % do Total

Avaliação: Dificuldades inerentes ao arranque do projecto

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Web Site Nartural
 2. Manual de aplicação pedagógica
 3. Nº Certificações em CB TIC: 300

Execução Financeira: 123.000,00 € / 62 % do Total do Orçamento

Perspectivas: Execução técnica no prazo previsto



DIGIPOT



5ª Potência

+Projecto	+Objectivos	+Tarefas	+Contactos
<p>Projecto / O Projecto</p> <p>A empresa é confrontada com mutações da envolvente nacional e internacional, evoluções técnicas e constrangimentos de competitividade do sector de actividade. Os diferenciais de competitividade geram-se na conjugação da qualidade da organização empresarial com o domínio dos sistemas de informação relativos aos vários domínios/funções da empresa.</p> <p>Pretende-se implementar um sistema que acompanhe o funcionamento intrínseco da empresa em todas as vertentes possíveis, com um principal enfoque para um centro de convergência de informação interna. Pretende-se centralizar a informação e disponibilizá-la de forma orientada.</p> <p>As funcionalidades identificadas numa primeira análise apontam para os seguintes itens (em plataforma Web): Gestão de Conhecimento - é importante o know how pertencer à firma, Gestão de Económato Gestão de equipamento, Gestão Documental, Gestão Comercial, Gestão de serviços</p>			





Desenvolvido por: NETU.L

www.5potencia.pt/digipot




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



DIGIPOT






Apresentação

Projecto: DIGIPOT – 5ª Potência Digital – Um Passo para o Futuro

EBP: 5ª Potência – Consultadoria para os Negócios e Gestão, Lda

Resultado Mais Importante: Equipamento

Utilidade: Melhoria substancial da qualidade de trabalho da 5ª Potência

Orçamento: 49.338,00 €

Início/Fim 01/2005 – 12/2005 – 12 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 1




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

**Execução
Técnica:**

1. Site
2. Intranet
3. Aquisição de equipamento

**Execução
Financeira:**

Despesa Apresentada: 29.606,68 € / 60,01 % do Total
Comparticipação recebida: 5.818,13 € / 21,56% do Total

Avaliação:

Pontos Fracos da Execução: Ausência de certificações
Pontos Fortes da Execução: Percentagem de execução

Execução Planeada até Dezembro de 2005

**Execução
Técnica:**

1. Resultado Importante a Alcançar: Formação
2. Resultado Importante a Alcançar: Conclusão do projecto
3. Nº Certificações em Competências Básicas TIC: 45

**Execução
Financeira:**

Despesa total prevista em 15 de Nov 2005:
49.338,00 € / 100 % do Total Orçamento

Perspectivas:

Positivas: Conclusão dos trabalhos e aumento de produtividade da empresa
Negativas: nada a registar



paz.misericordiamurtosa.pt (acesso reservado)



Apresentação

Projecto:	P@Z – Juiz de P@z
EBP:	Santa Casa da Misericórdia da Murtosa
Resultado Mais Importante:	Disponibilização on-line das actas do Juizado de Paz da Murtosa
Utilidade:	Preservação e divulgação digital de documentos
Orçamento:	84.214 €
Início/Fim	Janeiro 2004– Dezembro 2005/ 36 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Digitação de documentos manuscritos
 2. Digitalização das actas originais
 3. Interface e Base de dados on-line

Execução Financeira: Assumido 35.241 € / 42 % do Total Orçamento
Recebido 10.044,96 € / 16,57 % do Total

Avaliação: Alguns atrasos na execução do projecto (recursos humanos)
Inovação numa estrutura habituada à monotonia

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Correção de eventuais erros
 2. Melhoria das funcionalidades da interface web
 3. 32 Certificações em CB TIC

Execução Financeira: 80.000 € / 94 % do Total Orçamento

Perspectivas: Disponibilização web de documentos manuscritos com dados importantes para uma sistematização de uma parte da história do Concelho da Murtosa.



www.netual.pt/abs



Apresentação

Projecto:	ABS XXI – Abril Século XXI
EBP:	Abril – Mobiliário Metálico, Lda.
Resultado Mais Importante:	Intranet de serviços
Utilidade:	Melhoria dos serviços internos
Orçamento:	50.118,00 €
Início/Fim	01/2004 – 12/2005 – 24 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Execução Realizada

Execução Técnica:

1. Infra-estrutura de rede
2. Intranet de serviços

Execução Financeira: Despesa apresentada: 25.995,00 € / 51,87 % do Total
Comparticipação recebida: 786,95 € / 3,14% do Total

Auto Avaliação: Pontos Fracos da Execução: Atraso na implementação
Pontos Fortes da Execução: Modernização da empresa,
Motivação do “motor” da empresa – a administração

Execução Planeada até Dezembro de 2005


Execução Técnica:

1. 1º Resultado Importante a Alcançar: Formação
2. 2º Resultado Importante a Alcançar: Conclusão do Projecto
3. Nº Certificações em Competências Básicas TIC: 45

Execução Financeira: Despesa total prevista em 15 de Nov 2005:
50.118,00 € / 100 %

Perspectivas:

- Recuperação de atrasos no projecto
- Novas instalações => redefinição de processos
- Novos fluxos de produção

 universidade de aveiro		PROGRAMA Aveiro Digital 2003 - 2006
<ul style="list-style-type: none"> ∴ Introdução ∴ estrutura de coordenação ∴ projectos ∴ documentação ∴ ligações ∴ contacto ∴ outros projectos com a participação da ua ∴ 2º concurso aveiro digital ∴ notícias 	PROJECTOS <ul style="list-style-type: none"> • e-UProurement - e-ABS (99.310 €) • Sistema Integrado de Tele-Trabalho da UA - SITUA (820.000 €) • Sistema de Contacto e Interação com a UA - ContactUA (200.000 €) • Sistema Integrado para Biblioteca e Arquivo Digitais - SInBAD (325.000 €) • Rede de Aprendizagem Interactiva - Radlcal (175.000 €) • NARTURAL: Natureza e Arte - NARTURAL (200.000 €) 	

www.pad.ua.pt/

Apresentação



Projecto:	RAAdlcal – Rede de Aprendizagem Interactiva
EBP:	Universidade de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Divulgar conhecimento científico e fomentar o ensino e a aprendizagem interactiva
Utilidade:	Produção de conteúdos multimédia para vários graus de ensino (internet e CD)
Orçamento:	175.000 €
Início/Fim	Jan/2004 – Dez/2006 / 36 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. “Didaktos OnLine” – <http://didaktos.ua.pt>
 2. Vamos conhecer melhor os Invertebrados: Os Anelídeos CD-ROM interactivo na área de Biodiversidade Animal
 3. Incremento da informação disponível em www.biorede.pt

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 66.000,00 € / 38 % do Total
Comparticipação recebida: 3.000,00 € / 2.13 % do Total

Avaliação: Fase inicial do projecto e estabilização das equipas
Cooperação entre departamentos

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. “Didaktos em CD-Rom” e “Manual de Utilizador”
 2. “Vamos conhecer melhor os Invertebrados: os Equinodermes” e “Habitats Naturais” – CD-Rom na área de Biodiversidade Animal e Biodiversidade Vegetal
 3. “Laboratório Virtual de Física” CD-Rom
 4. N° Certificações em CB TIC: 250

Execução Financeira: 124.000,00 € / 71 % do Total

Perspectivas: Execução técnica no prazo previsto – ultrapassadas as dificuldades na passagem da informação on-line para cd-rom;
Criação de colecções temáticas com recursos multimédia



www.cm.sever.pt

Apresentação

Projecto:	Sever Informa – Sever, Município Digital
EBP:	Município de Sever do Vouga
Resultado Mais Importante:	Disponibilização de serviços electrónicos municipais ao cidadão.
Utilidade:	Harmonização e simplificação de procedimentos Relações Autarquia/Munícipe
Orçamento:	125.000 €
Início/Fim	2.2004 – 12.2006 / 36 meses
Nº Entidades Beneficiárias	1

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Aquisição do equipamento e aplicações
 2. “Centro de Serviços na Internet”
 3. Instalação e configuração da Página WEB, da Intranet e dos WEB Services

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 55.525€ / 44,42% do Total
Complicação Recebida: 2.491€ / 2,66 % do Total

Avaliação:

Dificuldades encontradas: Acréscimo de tarefas/Recursos Humanos

Soluções encontradas: Distribuição de tarefas e partilha de conhecimentos entre colaboradores de projectos iguais

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Formação para todos os colaboradores
 2. Realizar a avaliação do projecto e executar o Manual de Gestão e Manutenção
 3. Nº Certificações em CB TIC: 120

Execução Financeira: 100.800 € / 84% do Total Orçamento

Perspectivas:

Positivas: Simplificação de procedimentos e aproximação dos clientes do Município

Negativas: Desvios na execução de tarefas

Potenciais Soluções: Reforço do envolvimento dos colaboradores

 universidade de aveiro		PROGRAMA Aveiro Digital 2003 - 2006
<ul style="list-style-type: none"> ∴ introdução ∴ estrutura de coordenação ∴ projectos ∴ documentação ∴ ligações ∴ contacto ∴ outros projectos com a participação da ua ∴ 2º concurso aveiro digital ∴ notícias 	PROJECTOS <ul style="list-style-type: none"> • e-UAProcurement - e-ABS (99.210 €) • Sistema Integrado de Tele-Trabalho da UA - SITUA (820.000 €) • Sistema de Contacto e Interação com a UA - ContactUA (200.000 €) • Sistema Integrado para Biblioteca e Arquivo Digitais - SinBAD (325.000 €) • Rede de Aprendizagem Interactiva - Radical (175.000 €) • NATURAL: Natureza e Arte - NATURAL (200.000 €) 	

www.pad.ua.pt/

Apresentação

Projecto:	ContactUA- Sistema de Contacto e Interação com a UA
EBP:	Universidade de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Portal <i>ContactUA</i>
Utilidade:	Criação de uma plataforma de contacto entre a UA e os seus actores (internos e externos) com objectivos diversos em função do actor
Orçamento:	200.000 €
Início/Fim	Jan/2004 - Dez/2006 / 36 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Execução Realizada

**Execução
Técnica:**

1. Novo Serviço Currícula@UA
2. Alteração do Serviço e-ABC (Arquivo Bibliográfico Científico)
3. Integração dos Servilios de e-Mail

**Execução
Financeira:**

Despesas Apresentadas: 109.000,00 € / 54.5% do Total
Comparticipação Recebida: 16.500,00 € / 11% do Total

Avaliação:

Dificuldade em avaliar neste momento qual a configuração óptima para suporte ao sistema

Nenhum dos Serviços actualmente existentes na Universidade é desactivado pelo desenvolvimento desta plataforma – plataforma integradora»

Execução Planeada até Dezembro de 2005

**Execução
Técnica:**

1. Criação do Serviço de “Agenda Partilhada”
2. Reutilização do Serviço de Currículos nos concursos documentais a decorrer em Setembro de 2005
3. Nº Certificações em CB TIC: 303

**Execução
Financeira:**

168.000,00 € / 84% do Total

Perspectivas:

Os trabalhos foram recalendarizados no fim de 2004 e neste momento estão a decorrer dentro da normalidade.

Cumprir-se-ão integralmente os objectivos traçados inicialmente.

Aveiro digital **SANI**

www.sanindusa.pt

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital **SANI**

Apresentação

Projecto: SANI – Gestão de Processo e Expedição

EBP: Sanindusa – Industria de Sanitários S.A

Resultado Mais Importante: Optimização dos sistemas de informação para uma melhor gestão dos processos produtivos.

Utilidade: Melhor gestão dos factores de produção, rastreabilidade *on-line* da produção e optimização na gestão da logística.

Orçamento: 262.436 €

Início/Fim Janeiro/2004 – Dezembro/2005– 24 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 1

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução já Realizada

- Execução Técnica:**
1. Implementação do sistema *on-line* da gestão de produção (unidade de produção de acrílicos);
 2. Desenvolvimento do portal do cliente;
 3. Aquisição de software e hardware.

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 87.880 € / 33 % do Total
Comparticipação Recebida: 26.945 € / 19,53% do total

Auto Avaliação: Soluções técnicas de hardware para ambiente térmico agressivo.

Execução planeada até Final de 2004

- Execução Técnica:**
1. Implementação dos SI's de informação nas unidades cerâmicas;
 2. Interface com *BackOffice* comercial.

Execução Financeira: 200.000 € / 76,3 % do Orçamento Total

- Perspectivas**
- Projecto delineado para conclusão no prazo previsto;
 - Desenvolvimento de competências básicas em TIC;
 - Formação técnica para operadores nos sistemas de informação desenvolvidos.

Aveiro digital 2004-2005

INFORDICO

MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO

Partes | Edifício/Arquitetura | Coleção | Exposições | Pólo Navio Museu Santo André

Serviço Educativo | Biblioteca e Arquivo | Serviços | Agenda

Portugal Digital | PCAD | Associação dos Amigos do Museu

LOJA | NOTÍCIAS | IMPRENSA | MAILING LIST | SLIDE SHOW | LINKS

Evento Cultural: Dia Internacional dos Museus

www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital 2004-2005

INFORDICO

Apresentação

Projecto: INFORDICO – Informatização, Digitalização e Produção de Conteúdos do Museu Marítimo de Ílhavo

EBP: Câmara Municipal de Ílhavo

Resultado Mais Importante: Digitalização e Informatização do Museu Marítimo de Ílhavo

Utilidade: Conservação do património

Orçamento: 400.004 €

Início/Fim: 01.04 – 12.05 / 24 meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 1

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Concepção de um web-site
 2. Informatização, catalogação e digitalização da Biblioteca, Arquivo e Colecções do Museu
 3. Acessibilidades a pessoas com deficiência

Execução Financeira: Despesa apresentada 216.333,05 € / 54,08 % do Total
Complicação recebida 19.062,65 € / 6,62 % do Total

Avaliação: Digitalização de mapas e conteúdos para o Serviço Educativo;
Informatização da gestão de públicos
Informatização, catalogação e digitalização

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Digitalização de mapas e conteúdos para o Serviço Educativo
 2. Informatização da gestão de públicos
 3. 800 Certificações em CB TIC





Execução Financeira: 350.000 € / 87 % do Total

Perspectivas: Informatização da gestão de públicos e aplicação de conteúdos para o Serviço Educativo

 universidade do aveiro		PROGRAMA Aveiro Digital 2003 - 2006
<ul style="list-style-type: none"> .. introdução .. estrutura de coordenação .. projectos .. documentação .. ligações .. contacto .. outros projectos com a participação da ua .. 2º concurso aveiro digital .. notícias 		
PROJECTOS		
	<ul style="list-style-type: none"> • e-UAProurement - e-ABS (99.310 €) • Sistema Integrado de Tele-Trabalho da UA - SITUA (820.000 €) • Sistema de Contacto e Interação com a UA - ContactUA (200.000 €) • Sistema Integrado para Biblioteca e Arquivo Digitais - SINBAD (325.000 €) • Rede de Aprendizagem Interactiva - Radical (175.000 €) • NARTURAL: Natureza e Arte - NARTURAL (200.000 €) 	

www.pad.ua.pt/

Apresentação

	Projecto:	e-ABS - e-UAProurement
	EBP:	Universidade de Aveiro
	Resultado Mais Importante:	Aquisição de Bens e Serviços Por Via Electrónica
	Utilidade:	Modernização, simplificação, maior transparência e rapidez no Processo Aquisitivo de Contratação Pública
	Orçamento:	99.310,00 €
	Início/Fim	01.2004 - 12.2006 / 36 Meses
	Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Execução Realizada

Execução Técnica:

- 1º Estudo de enquadramento jurídico-legislativo e normativo-regulamentar, a nível nacional e comunitário
- 2º Avaliação técnico-financeira e informática das Soluções / Plataformas disponíveis no mercado, nacional e internacional
- 3º Elaboração do Documento de Especificação de Requisitos do Projecto (Estrutura e Arquitectura do Sistema a implementar)

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 37.000,00 € / 37 % do Total
Comparticipação Recebida: 1.650,00 € / 2,21 % do Total

Avaliação:

- Valia: Atraso na Concepção e Desenho da Solução a implementar
- + Valia: Opção por uma Solução *in house*, integralmente concebida, desenhada e a implementar/explorar pela Universidade de Aveiro

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica:

- 1º Implementação do Sistema de Gestão de Fornecedores da U.A. (associado à Base de Registo de Dados e Cadastro)
- 2º Implementação do Sistema de Procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços (Sistema de Aquisições Electrónicas, associado à Gestão Documental e a Ferramentas de garantia da confidencialidade, autenticidade e validação de mensagens e documentos digitais e de pagamentos por via electrónica)

Nº de Certificações em CB TIC: 141

Execução Financeira: 70.500,00 € / 71 % do Total do Orçamento

Perspectivas: Negativa: Eventuais adaptações aos Sistemas a implementar
Positiva: Interação dos Fornecedores e Funcionários da U.A. com a Solução Global de Aquisições Por Via Electrónica

Aveiro digital 2004-2006

ESTAR

ESTAR

CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS ACESSÍVEIS

ESTAR DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
PARCEIROS
OBJECTIVOS
TAREFAS
RESULTADOS
CERCIMIRA
CERCIVAR

Pretende-se encontrar novas formas de aprendizagem estimulantes para as crianças com deficiências, através do uso dos computadores e da Internet. Será desenvolvido um portal Internet acessível a grupos de crianças com necessidades educativas especiais diferentes, designadamente crianças com deficiências mentais e deficiências motoras, público para o qual pouco existe na Internet em Português. Dará acesso a conteúdos pedagógicos, abordados através de animações exemplificativas, jogos, sons e imagens e textos ou palavras-chave. Este portal é inovador por ser o primeiro portal português totalmente pensado e orientado para a aprendizagem das crianças com deficiência e espera-se por isso que tenha impacto a nível nacional e possa ser usado por outras instituições e crianças, que não frequentando nenhuma instituição, possam aceder a partir de casa. Será desenvolvido um site para divulgar o projecto, os resultados, as boas práticas e as actividades destas instituições.
 Pretende-se equipar uma sala multimédia nas instituições participantes, com computadores ligados em rede, ligação à Internet e software base.
 Serão desenvolvidas sessões de formação e certificação em competências básicas de TIC para os técnicos das instituições que irão acompanhar os utentes. As salas multimédia também servirão para dar formação e certificação aos próprios utentes das instituições com deficiências menos.

www.estarconsigo.com

Portugal Digital | Aveiro Digital | Portugal Digital | PCSI

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital 2004-2006

ESTAR

Apresentação

Projecto: ESTAR – Conteúdos Pedagógicos Acessíveis
EBP: CERCIMIRA – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Mira, CRL
Resultado Mais Importante: Concepção de um portal com conteúdos pedagógicos acessíveis a pessoas com deficiência
Utilidade: Colmatar a falta de conteúdos on-line para esta população específica
Orçamento: €80.000,00 (Oitenta mil euros)
Início/Fim 10/2004 – 10/2006 / (24 meses)
Nº de Entidades Beneficiárias: 2

Portugal Digital | Aveiro Digital | Portugal Digital | PCSI

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Produção do site do projecto e das duas instituições envolvidas;
 2. Formação e certificação de 24 técnicos das duas instituições
 3. Aquisição e instalação dos equipamentos previstos e criação de um espaço Internet em cada instituição

Execução Financeira: Despesa apresentada: 67.156,55 € / 83,95% do total
Comparticipação recebida: 13.416,94 € / 23,96% do total

Avaliação: Pontos Fracos: Intercâmbio com outros projectos.
Pontos Fortes: Formação de 24 Técnicos e Execução de grande parte dos conteúdos previstos e Execução financeira de 83,95% do total em apenas 8 meses de execução.

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Finalizar a execução dos conteúdos.
 2. Formar e certificar em competências básicas em TIC alunos das duas Instituições
 3. Certificação de 34 alunos

Execução Financeira: 72.000,00 € / 90 % do Total Orçamento

Perspectivas: Disponibilização on-line da totalidade dos conteúdos pedagógicos previstos;
Formar e certificar em CB TIC o maior número possível de utentes.


RTS



[O Projecto](#) | [Serviços](#) | [Documentos](#) | [Membros](#)

Home | atualizado em: 2005-06-27

Junho 2005						
S	T	Q	Q	S	S	D
		2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Legenda:
dd Dia actual
dd Dia com evento (clique para detalhe)

[Adicionar aos Favoritos](#)
[Página Inicial](#)
[Área Reservada](#)

EXPOSIÇÃO AVEIRO DIGITAL
Parque de Exposições de Aveiro

Destaque

Simpósio «Fortilidade Masculina: Problemas e Perspectivas...» 2005-06-27
Dirigido a profissionais da saúde, estudantes de pós-graduação, investigadores e outros, interessados no aprofundamento de conhecimentos no campo das alterações da fertilidade masculina, este simpósio, agendado para o próximo dia 29 de Junho, tem por obje...

Braço artificial que se move com o pensamento testado com êxito - 2005-06-27
Investigadores do Instituto de Reabilitação de Chicago, no estado norte-americano do Illinois, testaram com êxito num paciente um braço artificial que se move com o pensamento.

O braço artificial foi aplicado em Jesse Sullivan, um homem que perdeu os...

Doente com variante da Creutzfeldt-Jakob em Portugal é dos mais jovens no mundo - 2005-06-27
O primeiro caso provável em Portugal da variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, um rapaz de 13 anos, é o segundo no mundo registado numa pessoa tão jovem. Apenas no Reino Unido existe um caso numa pessoa da mesma idade.

Novo tratamento ajuda diabéticos de Tipo 1 a produzir insulina - 2005-06-27
Um tratamento experimental testado num pequeno estudo nos Estados Unidos ajudou diabéticos de Tipo 1 a produzir alguma insulina, diminuindo a sua dependência de injeções de hormona que regula os níveis de açúcar...

[Arquivo de "Destaque" colocados no rtsaude.org](#)

www.rtsaude.org



Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



RTS







Apresentação

Projecto: RTS- Rede Telemática da Saúde

EBP: Hospital Infante D. Pedro, S.A.

Resultado Mais Importante: Portal Regional de Saúde

Utilidade: Agilizar a comunicação entre as entidades prestadoras de cuidados de saúde e entre estas e o utente, na região de Aveiro

Orçamento: 878.250,00 €

Início/Fim Maio.2004 - Dezembro.2006 / 32 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 16



Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Relatório de Análise de Processos e Fluxos de Informação
 2. Formação em Competências Básicas em TIC a 170 Profissionais de saúde
 3. Contactos institucionais: **Ministério da Saúde, ARS-C, IGIF e CNPD**
- Execução Financeira:** Despesas apresentadas: 226.171 € / 25,75% do total
Comparticipação recebida: 9.969 € / 1,62 % do total
- Avaliação:** Pontos Fracos: Sobrecarga da agenda dos profissionais de saúde
Pontos Fortes: Cooperação aberta com elevado dinamismo nos 9 grupos de trabalho (envolvendo 42 profissionais de saúde)

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Especificação Detalhada de Procedimentos e Suporte TIC
 2. Desenvolvimento do Motor de Integração que irá suportar o Processo Clínico Electrónico Regional Resumido
 3. Nº Certificações em Competências Básicas TIC: 240
- Execução Financeira:** Despesa prevista 15/Nov : € 615.785 / 70 % do Orçamento
- Perspectivas:**
- Alinhamento estratégico e operacional com o IGIF
 - Avaliação externa pelo CEIS-UC, especializado em medição de resultados em Saúde
 - Definição do modelo de base de constituição de uma Associação para exploração futura da RTS



intranet.cm-albergaria.pt (acesso reservado)

Apresentação

- Projecto:** SAL-Online – Serviços Autárquicos Locais OnLine
- EBP:** CM Albergaria
- Resultado Mais Importante:** Tornar os serviços autárquicos mais eficientes e eficazes e disponibilizá-los aos munícipes através da Internet.
- Utilidade:** Simplificar, harmonizar e reduzir tempos de resposta nas relações entre as autarquias e os munícipes.
- Orçamento:** 625.000€
- Início/Fim:** 01.2004 – 12-2006 / 36 meses
- Nº de Entidades Beneficiárias:** 5

Execução Realizada

Execução Técnica:

1. Identificação e Elaboração de Formulários e Procedimentos
2. Instalação de Novas Aplicações Informáticas, Equipamento Informático, Formação de Recursos Humanos e Acesso aos Serviços Básicos de Internet pelos Colaboradores
3. Criação de uma base de conhecimento que facilite a partilha de informação entre os diferentes serviços e a relação dos colaboradores com a autarquia

Execução Financeira:

Despesas apresentadas: 377.727,00 € / 60,44 % do Total
 Participação recebida: 166.691,00 € / 35,56 % do Total

Avaliação:

Pontos Fracos da Execução

- EB's em diferente estado de utilização das TIC's
- Versões de Aplicações Informáticas diferentes
- Formação de RH inadequada

Pontos Fortes da Execução

- Criação de Grupos de Trabalho entre as EB's possibilita troca de experiências
- Introdução Generalizada de novas Aplicações

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica:

1. Lançamento dos 5 Sites de Serviços com integração com o BackOffice AIRC, com submissão segura de pedidos e pagamentos electrónicos
2. Lançamento de novos serviços na Intranet com integração com o BackOffice AIRC e com ferramentas colaborativas
3. N° Certificações em CB TIC: 300 certificações

Execução Financeira:

456.942,61 € / 73,1 % do Total

Perspectivas:

- Recuperação do atraso inicial na disponibilização dos serviços, após a validação da tecnologia;
- Integração das novas aplicações com ferramentas de produtividade (nomeadamente Office), permitindo às Autarquias serem independentes para alterarem formulários e procedimentos.



RDSR



www.rdsr.net







Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



RDSR






Apresentação

Projecto:	RDSR – Rede Digital de Saúde da RIA
EBP:	ARSC – SRS Aveiro
Resultado Mais Importante:	Melhor Prestação em Cuidados de Saúde Primários
Utilidade:	Aumento Eficiência, melhor articulação das redes da saúde e redução custos
Orçamento:	853.913,00€
Início/Fim	Jan. 2004 – Dez. 2005 / 24 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	19 entidades





Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Implementação dos circuitos dedicados
 2. Auditoria às entidades beneficiárias para verificação e testes da rede de interligação
 3. Instalação, configuração e teste dos equipamentos

Execução Financeira: Despesa apresentada: 442.608,11€ / 52% do total
Comparticipação Recebida: 154.772,73€ / 26% do total

Avaliação: Falta de articulação e dinâmica entre os vários hospitais e centros de saúde
Atraso na instalação dos circuitos dedicados
Atraso na formação/Ações de treino
Motivação de alguns profissionais quer dos centros de saúde quer dos hospitais

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Implementar as consultas entre todas as entidades
 2. Instalar as plataformas nos 5 centros de saúde da 2ª fase e implementar as Teleconsultas
 3. 80 certificações em CB TIC

Execução Financeira: 622.000 acumulada prevista em 15 de Nov 2005 (em €)
72,8 % do Total Orçamento

Perspectivas: Iniciar as Teleconsultas em Outubro de 2005
Continuar a Sensibilizar o Ministério da Saúde para a importância da Telemedicina
Alargar o horário para a realização das Teleconsultas para além de 1 hora



POMADA



POMADA
Portal Online Multimédia da Academia De Aveiro

[apresentação](#)
[constituição](#)
[regulões](#)
[contatos](#)

É desta. Tem de ser desta. Estamos na associação académica da melhor Universidade do país, uma das mais avançadas em termos tecnológicos a nível europeu, representamos estudantes nas mais variadas valências, porque haveremos de estar tão atrevidos e nível organizacional, comunicacional e tecnológico?

As candidataro-nos à 2ª fase de concursos da Aveiro Digital, fizemos a aposta definitiva na resolução de todos estes problemas. Criámos uma equipa competente, suportados por conhecimentos "retirados" desta mesma Universidade, e por muita vontade...

E se há vontade e meios, temos de rápida e eficientemente colocar o projecto em prática, e mostrar a todos do que somos capazes quando à isso nos comprometemos seriamente.

Em dois anos (ou menos, ou bem menos :)), todo um Back-Office estará desenvolvido, que melhorará a comunicação interna e externa da AAUAv e das suas estruturas, núcleos e comissões de curso. Nesse mesmo período, um Front-Office estará disponível, na forma de um portal multimédia, com a informação que pretendemos disponibilizar e com os conteúdos que vocês mais necessitarem e pretenderem.

É desta...

www.aauav.pt/pomada/




 Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



POMADA



Apresentação

Projecto: POMADA – Portal Online Multimédia da Academia De Aveiro

EBP: Associação Académica da Universidade de Aveiro

Resultado Mais Importante: Desenvolvimento de back-office e respectivo front-office

Utilidade: Implementação das TIC ao nível da comunicação interna e externa da EBP

Orçamento: 35.000 €

Início/Fim Nov.2004 – Nov.2006 / 24 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 1




 Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Primeiros módulos do back-office disponíveis para testes
 2. Produção e Manutenção do *site* do projecto
 3. Formação em Gestão de Projectos

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 7.572,99 € / 21,64 % do Total
Comparticipação Recebida: 1.041,49 € / 4,13 % do Total

Avaliação: Dificuldade na instalação do servidor, e impossibilidade de efectuar as primeiras CCBs por motivos técnicos
Primeira fase de back-office concluída 6 meses antes do previsto

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Back-office e Front-office funcionais a 90%
 2. Aquisição de todos os equipamentos
 3. Nº Certificações em CB TIC: 200

Execução Financeira: Despesa total acumulada prevista em 15 de Nov 2005:
29,995 € / 85% do Total Orçamento

Perspectivas: Possibilidade de front-office disponível no arranque do ano lectivo, no entanto a formação dos elementos mais "beneficiados" apenas ocorrerá após a eleição da nova direcção da EBP (Dezembro) e dos respectivos núcleos (Fevereiro/2006)



www.amria.pt/ambiria



Apresentação

Projecto:	Ambi-Ria – Gestão Ambiental na Região da Ria de Aveiro
EBP:	Associação de Municípios da Ria
Resultado Mais Importante:	Planos e Carta da Água da região da AMRia
Utilidade:	Melhorar e Articular a Gestão e a Intervenção no Ambiente
Orçamento:	460.950 €
Início/Fim	Dez.2004–Dez.2006 / 24 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	12

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Especificação dos Planos Municipais de Ambiente
 2. Especificação da Carta da Água - Objectos e Campos
 3. Especificação dos Equipamentos a adquirir

Execução Financeira: Despesa Apresentada: 16.062 € / 3,48 % do Total
Comparticipação Recebida: 7.171 € / 2,07 % do Total

Avaliação: Pontos Fracos: Dificuldade no desenvolvimento da concertação entre os Parceiros
Pontos Fortes: Estabelecimento de Metodologias Comuns

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Aquisição de todos os Equipamentos
 2. Formação Específica para o Projecto
 3. Nº Certificações em CB TIC: 16

Execução Financeira: 258.364 € / 56,1 % do Total Orçamento

Perspectivas: Positivas: Consenso nas Opções de Serviços Ambi-Ria
Negativas: Atrasos no Carregamento da Informação nas BD



VLM-Online


VLM-Online

Projecto
Tarefas
Contactos

Projecto

O projecto VLM-Online tem como objectivo a modernização dos processos e o reforço da competitividade da empresa, fortalecendo a sua ligação/proximidade com as empresas-clientes e a sociedade em geral.

Em termos globais, o projecto enquadra três vectores de desenvolvimento:

- **Interno:** webização do back-office de gestão dos processos operativos, de apoio e de gestão do sistema integrado de informação através do desenvolvimento de uma intranet que, entre outras actividades, envolva o planeamento de projectos (PERT) e seu controlo. Pretende-se igualmente complementar o controlo de projectos com workflow, sistema de custeio e gestão documental em suporte PDF.
- **Cliente:** webização dos canais de promoção e comunicação com o cliente (front-office), permitindo a monitorização da evolução dos projectos-cliente, a avaliação da satisfação do cliente (afirmação do grau de satisfação e registo e tratamento de reclamações), o acesso a uma bolsa de emprego (vergente empregador) e identificação de necessidades formativas.
- **Sociedade:** desenvolvimento de uma extranet vocacionada para a divulgação das iniciativas de índole formativa promovidas pela VLM Consultores, a qual contemplará a inscrição dos formandos, o pagamento electrónico e a avaliação das acções de formação. Paralelamente, a aplicação permitirá a gestão das acções formativas, a gestão de formadores (bolsa de formadores), o registo na bolsa de emprego e dinamização de um painel informativo de apoio ao tecido empresarial (económico e financeiro, sistemas modernos de informação e gestão, qualidade, ambiente e segurança).

Embora o projecto assente na modernização e promoção da VLM, é importante salientar outro objectivo não menos importante que reside no alargamento do seu âmbito a todas as empresas e pessoas à procura de informação actual e de emprego e/ou formação profissional, contribuindo para uma mais valia da sociedade da região de Aveiro.






Vlm-online.vlm-consultores.pt






Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



VLM-Online

Apresentação

Projecto:	VLM-Online – Gestão Integrada de Processos e Clientes da VLM Consultores
EBP:	VLM Consultores, S.A.
Resultado Mais Importante:	Gestão integrada de processos e clientes
Utilidade:	Webização de processos internos e melhoria da relação com o cliente
Orçamento:	34.707 €
Início/Fim	Dez / 2004 – Nov/2006 – 24 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Especificação de requisitos
 2. Aprovisionamento de Hardware
 3. Protótipos de módulos da Plataforma interna

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 15.995 € / 46% do Total
Comparticipação Recebida: 664 € / 3,8 % do Total

Avaliação: Antecipação no aprovisionamento do Hardware
Complexidade não prevista da especificação de Requisitos

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Finalização da plataforma interna
 2. Módulos da plataforma do cliente (Formação e Satisfação)
 3. Nº Certificações em CB TIC: 10

Execução Financeira: 29.777 € / 86 % do Total Orçamento

Perspectivas: Cumprimento do plano previsto. Esforço no sentido de antecipar a implementação do sistema.

Aveiro digital **AMRiaSocial**



www.bussocial.org

Portugal Digital  Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital **AMRiaSocial**



Apresentação

Projecto: AMRiaSocial – Balcão Único de Solidariedade Social

EBP: Associação Betel – Ponte de Vagos

Resultado Mais Importante: Espaço na Internet para troca de bens e serviços de solidariedade

Utilidade: Potenciar as relações humanas criando oportunidades solidariedade

Orçamento: 115.750,00 €

Início/Fim 10.2004 – 09.2006/ 24 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 7

Portugal Digital  Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Construção do sítio de apoio à gestão
 2. Definição da primeira versão do *Backoffice* e *Frontoffice*
 3. Lançamento do sítio: www.bussocial.org

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 38.805,58 € / 33,53 % do Total
Comparticipação Recebida: 11.603,82 € / 14,32 % do Total

Avaliação: Dificuldade em sistematizar a produção de conteúdos, em passar a ideia de solidariedade na *Internet*
Gestão actualizada com as exigências do programa Aveiro-Digital e dossier técnico-financeiro

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Alargamento do leque de parceiros e de utilizadores
 2. Início da formação específica aos técnicos das entidades
 3. 30 Certificações em CB TIC

Execução Financeira: 103.832,00 € / 89,70 % do Total Orçamento

Perspectivas: Alargamento e divulgação do projecto a toda a área da AMRia;
Capacidade em dar resposta a uma possível massificação



Aveiro digital

Digivacas



Estação de Apoio à Bovinicultura Leiteira



INTRODUÇÃO

A Associação para o Desenvolvimento da Estação de Apoio à Bovinicultura Leiteira (EABL), sediada em Verdemilho, tem como objectivo promover e dinamizar o melhoramento genético dos bovinos Holstein e contribuir para a formação técnica dos criadores.

Fundada em 1991, teve na sua génese o dinamismo do movimento cooperativo a que as instituições da Administração Pública souberam dar a necessária resposta, imanando-se na vontade de erguer uma estrutura capaz de congregar os esforços que permitissem a avaliação genética dos bovinos da raça Holstein.

Desde logo, a construção a nível nacional de uma base de dados das acções do melhoramento genético, foi considerada tarefa prioritária a que esta associação tem dedicado o melhor do seu esforço. Partindo do zero, foi-se desenvolvendo a aplicação que hoje permite tratar os dados e disponibilizar a informação que mais interessa à gestão das explorações leiteiras.

www.anable.pt/eabl



Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



Aveiro digital

Digivacas



Apresentação

Projecto: DigiVacas – As TIC e o Melhoramento Genético dos Bovinos Leiteiros

EBP: EABL – Estação de Apoio à Bovinicultura Leiteira

Resultado Mais Importante: Dotar os contrastadores de terminais portáteis que permitam a recolha de dados do contraste leiteiro de forma mais expedita e célere, eliminando erros de transcrição e disponibilizar relatórios aos criadores em suporte físico ou através da internet.

Utilidade: Celeridade e fiabilidade nas acções de melhoramento genético

Orçamento: 102 620 €

Início/Fim JUL.2004 – DEZ.2006 / 32 Meses»

Nº de Entidades Beneficiárias: 1



Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

**Execução
Técnica:**

1. Aquisição Servidor e Terminais Portáteis
2. Desenvolvimento e Implantação do Backoffice no Servidor Local
3. Desenvolvimento e Implantação do Software nos Terminais Portáteis.

Execução Financeira: Despesa apresentada → 29 872,93 € / ≈ 29 % do Total
Comparticipação recebida → 1 637 € / ≈ 3,9 % do Total

Avaliação: Pontos Fracos → Zonas não cobertas pelo projecto A. D.
Pontos Fortes → Envolvimento de Associações congéneres a nível nacional

Execução Planeada até Dezembro de 2005

**Execução
Técnica:**

1. Fase de testes concluída com sucesso
2. Implantação no terreno dos objectivos pretendidos
3. N° Certificações em CB TIC: 315

Execução Financeira: 92 620 € / ≈ 90 % do Total Orçamento

Perspectivas: Projecto será realizado conforme o planeado



Imagem XXI



Uma Imagem

Uma Imagem

+Projecto +Objectivos +Tarefas +Contactos

Projecto O Projecto

A Uma Imagem está sediada no Concelho de Aveiro, no entanto tem uma filial em Águeda e outra no Porto, nos estúdios da RTP. É fundamental que os serviços base da firma estejam num ambiente Web, pois assim estarão acessíveis em qualquer parte.

Pretende-se implementar um sistema que acompanhe o funcionamento intrínseco da empresa em todas as vertentes possíveis, com um principal enfoque para um centro de convergência de informação interna. Pretende-se centralizar a informação e disponibilizá-la de forma orientada.

As funcionalidades identificadas numa primeira análise apontam para os seguintes itens (em plataforma Web):

- Gestão de Conhecimento - é importante o know how pertencer à firma,
- Gestão de Económato e do parque informático
- Gestão do parque informático,
- Gestão Documental,
- Gestão Comercial,
- Gestão de Produção (ligar dados aos clientes e fornecedores e controlo de processos de produção)
- Comércio Electrónico/Gestão de vendas

Desenvolvido por: NETU.L

www.umaimagem.com/imagem21

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



Imagem XXI



Apresentação

Projecto:	IMAGEM XXI – Uma Imagem do Século XXI
EBP:	Uma Imagem – Produções Audiovisuais e Multimédia, Lda
Resultado Mais Importante:	Intranet – Sistema de facturação via Web
Utilidade:	Tratamento digital financeiro
Orçamento:	48.272,00 €
Início/Fim	01/2005 – 12/2005 – 12 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

Execução Técnica:

1. Web Site
2. Intranet de serviços – primeiras versões

Execução Financeira: Despesa apresentada: 13.617,22 € / 28,21 % do Total
Comparticipação recebida: 1.206,80 € / 5% do Total

Avaliação: Pontos Fracos da Execução: Não aquisição de equipamento
Pontos Fortes da Execução: Primeiras versões da intranet bastante úteis

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica:

1. 1º Resultado Importante a Alcançar: Aquisição de equipamento
2. 2º Resultado Importante a Alcançar: Conclusão da intranet
3. Nº Certificações em Competências Básicas TIC: 30

Execução Financeira: Despesa total prevista em 15 de Nov 2005:
48.272,00 € / 100 % do Total Orçamento

Perspectivas: Positivas: Digitalização total da Uma Imagem



www.cm-agueda.pt (acesso reservado)



Apresentação

Projecto:	AEI-Digital
EBP:	Câmara Municipal de Águeda
Resultado Mais Importante:	Disponibilizar Serviços On-line
Utilidade:	Modernizar e Estruturar Backoffices
Orçamento:	375.000 €
Início/Fim	12.2003 - 12.2006 / 36 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	3

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Harmonização dos BackOffice
 2. Implementação da Intranet
 3. Implementação dos WEBSERVICES

Execução Financeira: Despesa apresentada: 187.071,47 € / 49,89 % do Total
Comparticipação recebida: 7.473,38 € / 2,66 % do Total

Pontos Fracos: Falta de Apoio Administrativo ao Projecto

Avaliação: Pontos Fortes: Abertura de um conjunto de serviços a disponibilizar na Internet para os municípios (Webservices) e internamente para os funcionários (Intranet)

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Aumento de funcionalidades a disponibilizar nos Webservices e Intranet
 2. Desenvolver Interfaces de Comunicação com a Administração Central
 3. Nº Certificações em CB TIC: 260

Execução Financeira: 236.828,16 / 63.20 % do Total

Perspectivas:
Positivas: Melhorar as condições de trabalho dos funcionários e aproximar o município da autarquia; Formação dos funcionários
Negativas: Dificuldades na harmonização intermunicipal de alguns serviços a disponibilizar

Aveiro digital e-NTL

NETUAL e-NTL

+Projecto +Objectivos +Tarefas +Contactos

Projecto **E-NTL - IntraNetual** ▲

A empresa é confrontada com mutações da envolvente nacional e internacional, evoluções técnicas e constrangimentos de competitividade no sector. Os diferenciais de competitividade geram-se na conjugação da qualidade da organização empresarial com o domínio dos sistemas de informação relativos aos vários domínios/funções da empresa. Desta forma, é importantíssimo que a Netual optimize o seu método de funcionamento ao nível comercial, gestão e serviços.

Pretende-se implementar um sistema que acompanhe o funcionamento intrínseco da Netual em todas as vertentes possíveis, com um principal enfoque para um centro de convergência de informação interna. Pretende-se centralizar a informação e disponibilizá-la de forma orientada.

As funcionalidades identificadas numa primeira análise apontam para os seguintes itens (em plataforma Web):

- i. Gestão de Conhecimento - é importante o know how pertencer à firma, e não só aos RH,
- ii. Gestão de Econmato e do parque informático
- iii. Gestão do parque informático, ▼

Desenvolvido por: NETUAL

www.netual.pt/e-ntl

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital e-NTL

Apresentação

Projecto:	E-NTL- IntraNet...ual
EBP:	Netual - Multimédia e Telecomunicações Lda.
Resultado Mais Importante:	Intranet de serviços
Utilidade:	Melhoria dos serviços internos
Orçamento:	44.400,00 €
Início/Fim	01/2004 - 12/2005 - 24 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

**Execução
Técnica:**

1. Infra-estrutura de rede
2. Equipamento
3. Intranet de serviços

**Execução
Financeira:**

Despesa apresentada: 38.758,84 € / 87,29 % do Total
Comparticipação recebida: 12.048,83 € / 54,27% do Total

Avaliação:

Pontos Fracos da Execução: Falta de formação
Pontos Fortes da Execução: Salto qualitativo em serviços de gestão e produção.

Execução Planeada até Dezembro de 2005

**Execução
Técnica:**


1. 1º Resultado Importante a Alcançar: Formação
2. 2º Resultado Importante a Alcançar: Conclusão do Projecto
3. Nº Certificações em Competências Básicas TIC: 45

**Execução
Financeira:**

Despesa total prevista em 15 de Nov 2005:
44.400,00 € / 100 % do Total Orçamento

Perspectivas:

Positivas: Melhoria geral da empresa
Negativas: Nada a registar

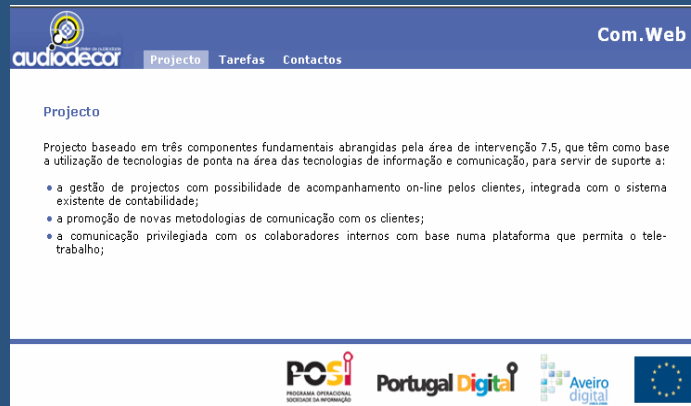





audiodecor Projecto Tarefas Contactos **Com.Web**

Projecto

Projecto baseado em três componentes fundamentais abrangidas pela área de intervenção 7.5, que têm como base a utilização de tecnologias de ponta na área das tecnologias de informação e comunicação, para servir de suporte a:

- a gestão de projectos com possibilidade de acompanhamento on-line pelos clientes, integrada com o sistema existente de contabilidade;
- a promoção de novas metodologias de comunicação com os clientes;
- a comunicação privilegiada com os colaboradores internos com base numa plataforma que permita o tele-trabalho;

www.audiodecor.pt/com_web

Apresentação

Projecto:	Com.Web – Comunicação e Imagem na Web
EBP:	Audiodecor – Atelier de Publicidade, Lda
Resultado Mais Importante:	Gestão de projectos e comunicação com o cliente
Utilidade:	Informatização de processos internos e melhoria da relação com o cliente
Orçamento:	44.609 €
Início/Fim	Out / 2004 – Set/2005 – 12 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1



Execução Realizada

Execução Técnica:

1. Identificação de Requisitos
2. Primeira versão da Intranet (S.G.Q.) e componente CRM
3. Aprovisionamento de Hardware

Execução Financeira: Despesa apresentada: 23.333 € / 52% do Total
Comparticipação recebida: 1.117 € / 5 % do Total

Avaliação: Ligeiro atraso na operacionalização dos sistemas. Pretende-se antecipar a plataforma de Tele-Trabalho.

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica:

1. Operacionalização da intranet e integração ERP
2. Desenvolvimento extranet (Comunicação com cliente)
3. Nº Certificações em CB TIC: 10

Execução Financeira: Despesa total acumulada prevista em 15 de Nov 2005:
44.471 € / 99 % do Total Orçamento

Perspectivas: Cumprimento do plano previsto



www.cm-aveiro.pt/bibria



Apresentação

Projecto:	BibRIA – Biblioteca Digital dos Municípios da Ria
EBP:	Câmara Municipal de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Criação de uma Biblioteca Digital onde o conhecimento organizado do Património Documental da região da ria seja livremente disponibilizado.
Utilidade:	Digitalização de documentos gráficos e colocação destes na Web através de uma estrutura de gestão documental.
Orçamento:	329,489 €
Início/Fim	Março.2004 – Março.2006 / 24 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	4

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Desenvolvimento da arquitectura do sistema
 2. Relatório específico dos requisitos do sistema
 3. Digitalização de Documentos

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 202.046,84 € / 61,32% do Total
Comparticipação recebida: 7.102,87 € / 2,99 % do Total

Avaliação:

Ponto fraco: Cumprimento das tarefas nos prazos apresentados no plano técnico-financeiro

Ponto forte: Realização das adjudicações de equipamentos e dos serviços que integram o Projecto.

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Formação em Software da Biblioteca Digital
 2. Apresentação de 187,500 imagens gratuitas na Web
 3. N° Certificações em CB TIC: 56

Execução Financeira: 323.877,03 € / 98.30 % do Total Orçamento

Perspectivas:

Positiva: Digitalização e colocação na Web de núcleos documentais.

Negativa: Cumprimento das tarefas nos prazos apresentados no plano técnico-financeiro

Aveiro digital **RED-AVEIRO**

RED Rede de Empreendedores Digitais

EXPOSIÇÃO AVEIRO DIGITAL Parque de Exposições de Aveiro

Mapa de Sítio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

RED WIRELESS Rede Wi-Fi no Centro Empresarial de Aveiro
Permite às empresas mobilidade e acesso em banda larga à Internet e às várias aplicações do projecto.

RED TRAINING Plataforma de E-Learning
Permite às empresas uma formação contínua dos seus colaboradores na utilização das aplicações do projecto. Permite também uma utilização noutras áreas de interesse específico para a empresa.

RED DESKTOP Serviços e Aplicações de Apoio à Gestão
Permite às empresas uma gestão interna de sua empresa baseada na Internet. A aplicação disponibiliza um ecossistema central com um conjunto de aplicações de gestão e serviços de apoio.

RED COMMERCE Plataforma de e-commerce
Permite às empresas um relacionamento com o mercado através da Internet e uma integração da gestão interna com o desempenho comercial.

www.anje.pt/red

Portugal Digital | Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital **RED-AVEIRO**

Apresentação

Projecto: RED-AVEIRO – Rede de Empreendedores Digitais de Aveiro

EBP: ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários

Resultado Mais Importante: Captar empreendedores para Aveiro e disponibilizar novos serviços on-line às empresas instaladas no CEA.

Utilidade: Gerar novas dinâmicas de e-working

Orçamento: 196.777 €

Início/Fim: 03-2004 a 12-2006 / 34 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 1

Portugal Digital | Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Realização de 2 estudos: diagnóstico de necessidades tecnológicas e Avaliação de conceito
 2. Desenho de processos e desenvolvimento da plataforma
 3. Website Red Aveiro

Execução Financeira: Despesa apresentada: 8 203,76 € / 4,17 % do Total
Comparticipação recebida: 1 272,08 € / 1,29 % do Total

Avaliação:

- Heterogeneidade das empresas Vs solução tecnológica comum
- Derrapagem no cronograma de execução previsto

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Operacionalização da aplicação RED_Desktop
 2. Operacionalização da aplicação RED_Training
 3. Operacionalização da aplicação RED_Commerce

Execução Financeira: 156.661 € / 80% do Total Orçamento

Perspectivas: Adaptação das empresas incubadas à novas formas de trabalho on-line.

Aveiro digital 2005-2006

SAD-SOS

SAD-SOS - Santa Casa da Misericórdia da Murtosa

Objectivos do Projecto

Protege-se criar um sistema de apoio a idosos que funcionará em duas vertentes:

1. A distância, recorrendo a equipamentos telefónicos e a um call center;
2. No local, com o apoio de equipas de apoio domiciliário (ou dos familiares).

Ligações temáticas...

- Utilidade sobre idosos
- O idoso no quotidiano actual
- A depressão no idoso
- Novas realidades
- Técnicas ocupacionais
- Acidentes com idosos

Os idosos que seremos

É importante pensar nos idosos que seremos em 10, 20, 30, 40, 50 anos. Que já foram jovens saudáveis. Já tiveram filhos, estudaram, trabalharam, casaram, tiveram filhos, estudaram, trabalharam, casaram, tiveram filhos... Mas hoje dependem de nós e precisam da nossa ajuda. Vamos ajudá-los no seu tempo.

Façamos hoje como gostáramos que nos fossem amanhã. É simples. Muito simples.

SOS-1
234 86
preocu

BLOG

Temos um blog de notícias e organizando a melhor e mais

sad.misericordiamurtosa.pt

Portugal **digital** **si** Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital 2005-2006

SAD-SOS

Apresentação

Projecto: SAD-SOS – Serviço de Apoio Domiciliário-SOS

EBP: Santa Casa da Misericórdia da Murtosa

Resultado Mais Importante: Implementação de um Call Center

Utilidade: Apoio telefónico a idosos isolados 24 horas por dia

Orçamento: 42 700.00 €

Início/Fim Janeiro 2005 – Dezembro 2006/ 24 meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 1

Portugal **digital** **si** Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Implementação de um call-center
 2. Formação de agentes para o call-center
 3. Atendimento, triagem e resolução de problemas – diário 24horas/7 dias na semana

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 15 067.25 € / 35 % do Total
Comparticipação Recebida: 1.171.00 € / 3,92 % do Total

Avaliação: Fornecedores com alguns atrasos
Formação de agentes de triagem e de atendimento a idosos com problemas e que estejam isolados em casa

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Implementação de um sistema de apoio a idosos isolados
 2. Aumento da capacidade de resposta para essas situações
 3. 62 Certificações em CB TIC

Execução Financeira: Despesa total acumulada prevista em 15 de Nov 2005:
42,700.00 em € / 100 % do Total Orçamento

Perspectivas: Transformação do projecto em valência da Misericórdia



e-ri@

- : [introdução](#)
- : [descrição](#)
- : [tarefas](#)
- : [cronograma](#)
- : [parceiros](#)
- : [formação](#)
- : [fórum](#)
- : [faq](#)
- : [contactos](#)
- : [área pessoal](#)

Introdução

O uso de Tecnologias da informação nas escolas, tem sido uma das grandes apostas do Ministério da Educação, que simultaneamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, desenvolveu e implementou um cada vez maior uso dos serviços de informação a nível das escolas, nomeadamente com a instalação das linhas de acesso Internet pela RCTS nas escolas.

O CAE de Aveiro, representando a DREC, concorreu em conjunto com algumas escolas ao programa Aveiro Digital, numa primeira fase com 5 projectos dos quais dois foram aprovados, E-ria! (840.000€) e Forum! (300.000€). Numa segunda fase temos três projectos em aprovação sendo que todos eles pertencem à medida 3 do Aveiro Digital e se destinam a desenvolver competências na área educativa. Estes projectos representam um investimento enorme por parte das escolas e das entidades envolvidas que querem cada vez mais implementar o sucesso educativo através do uso de sistemas de informação rápidos e eficientes e pedagógicos.

O projecto E-Ria teve o seu início oficial em 27 de Novembro de 2003, sendo um projecto que envolve 45 entidades (Estabelecimentos de ensino e DREC) e irá implementar um serviço de comunicação eficaz entre as escolas e comunidade educativa da AMRIA.

www.prof2000.pt/e-ria



Apresentação

Projecto:	e-Ria – Escolas da Ria
EBP:	Direcção Regional de Educação do Centro – Coordenação Educativa de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Secretaria Virtual – facilitar o relacionamento administrativo das escolas com a comunidade educativa.
Utilidade:	Combater as carências das Escolas relativamente às novas tecnologias e aproximar as Escolas dos agentes educativos e à sociedade em geral.
Orçamento:	840.000 €
Início/Fim	11.03 – 10.06 / 36 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	45

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Instalação das redes nas respectivas Entidades Educativas
 2. Final do processo de Adjudicação dos BackOffices e FrontOffice
 3. Início do processo de adjudicação da Secretaria Virtual

Execução Financeira: Despesa apresentada: 501,318 € / 59,68% do Total
Comparticipação recebida: 77.868,63 € / 12,36% do Total

Avaliação: Dificuldades em cumprir o calendário proposto; Dificuldade de investimento por parte de algumas Escolas Parceiras
Maior aproximação do previsto no projecto em relação ao ano de 2004.

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. 80% de parceiros com FrontOffices
 2. Contratação do serviço de Secretaria Virtual
 3. Nº Certificações em CB TIC: 1.100

Execução Financeira: Despesa total acumulada prevista em 15 de Nov 2005:
626.558 € / 74,6 % do Total Orçamento

Perspectivas:

- Sustentabilidade futura do projecto
- Boas possibilidades de conclusão dentro do prazo previsto com os objectivos atingidos

Aveiro digital 2005, 2006

ABDigital

www.abimota.pt/abdigital

Portugal Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

ABDigital

Apresentação

Projecto:	ABDigital – Abimota Digital
EBP:	ABIMOTA – Associação Nacional da Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins
Resultado Mais Importante:	Aumentar a Eficiência da ABIMOTA
Utilidade:	Melhorar o Desempenho e Interação com os Clientes
Orçamento:	126.967 €
Início/Fim	Nov/2004 – Jan/2005 / 14 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Portugal Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Aquisição parcial de equipamento
 2. 1ª versão do sistema (módulo de formação)

Execução Financeira: Despesa Apresentada: 36.057 € / 28,4 % do Total
Comparticipação Recebida 3.067 € / 4,83 % do Total

Avaliação: Pontos Fracos: Nada a assinalar nesta fase do projecto
Pontos Fortes: Modernização do equipamento existente e melhoria da imagem institucional da ABIMOTA

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Modelo de Gestão do LEA-Laboratório de Ens. da ABIMOTA
 2. Aquisição de equipamento
 3. Nº Certificações em CB TIC: 45 (já executadas 46)

Execução Financeira: 117.688 € / 92,7% do Orçamento Total

Perspectivas: Positivas: Criação de um sistema global de gestão da ABIMOTA
Negativas: Dificuldades de cumprimento de execução financeira de acordo com o plano.



www.prof2000.pt/pormat



Apresentação

Projecto:	PorMat, Curricula digital de português e matemática
EBP:	Direcção Regional de Educação do Centro – CE de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Criação de um ambiente virtual de aprendizagem do Português e Matemática.
Utilidade:	Construir um ambiente virtual de ensino/aprendizagem da matemática e da língua portuguesa ao nível do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico
Orçamento:	300 000 €
Início/Fim	01.04 – 12.06 / 36 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	7

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Processo de elaboração dos storyboards pelos professores
 2. Especificação de todos os módulos
 3. Processo de contratação da empresa para os módulos on-line

Execução Financeira: Despesa apresentada: 99.653,54 € / 33,22% do Total
Comparticipação recebida: 3.300,00 € / 1,47% do Total

Avaliação: Dificuldades em cumprir o calendário proposto.

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Execução de 10 protótipos Português e Matemática é Bué
 2. 400 Certificações em CB TIC:

Execução Financeira: Despesa total acumulada prevista em 15 de Nov 2005:
185.000 € / 70,4 % do Total

Perspectivas:


- Sustentabilidade futura do projecto
- Boas possibilidades de conclusão dentro do prazo previsto com os objectivos atingidos

Aveiro digital e-SI

www.hfa.pt (acesso reservado)

Portugal Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Aveiro digital e-SI



Apresentação

Projecto: e-SI – Sistema de Informação HFA

EBP: HFA – Henrique Fernando e Alves, Lda.

Resultado Mais Importante: Recolha e Tratamento dos dados On-Line com Informação para os Clientes

Utilidade: Falta de Informação para os Clientes

Orçamento: 60.000 €

Início/Fim 10.2004 – 10.2005 / 12 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 1

Portugal Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

Execução Técnica:

1. Trabalho em equipa para definição dos requisitos
2. Entusiasmo / Aprovação dos Clientes
3. Protótipo a funcionar com a recolhas de dados interna

Execução Financeira: Despesa Apresentada: 27.295 € / 45,49 % do Total
Comparticipação Recebida: 1.502 € / 5 % do Total

Avaliação: Dificuldade na definição de regras
Bom entendimento entre equipa ID e a HFA

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica:

1. Fechar o projecto com todos os requisitos cumpridos
2. Upgrades ao sistema, o que nos leva a dizer que o projecto terá continuidade
3. Nº Certificações em CB TIC: 20

Execução Financeira: 60.000 € / 100 %

Perspectivas: Positivas: Aceitação do projecto
Negativas: Parte burocrática do mesmo



Professor

professor

Introdução

Introdução
Objectivos
Metodologias
Tarefas
Contactos

O projecto Professor surge no âmbito do Programa Aveiro Digital para conceber, regular e qualificar os serviços de formação a distância para professores, garantindo a criação de condições de operação e o estabelecimento de modelos de perfil com vista à futura sustentabilidade destes serviços. Os serviços instalados e operacionalizados ao longo do projecto terão amplamente divulgados nos meios académicos e educativos com vista à sua sustentabilidade futura.

As acções de formação deverão contemplar o desenvolvimento de competências de actuação / publicação em formato electrónico e o desenvolvimento de materiais pedagógicos digitais. Serão promovidas acções de formação que fomentem a actuação de formadores locais com competências de apoio técnico nos vários ambientes dos projectos para os quais existirem (que possam participar gratuitamente). Neste âmbito, considerando o papel dos centros de formação e a importância da cooperação com outros locais de funcionamento, contemplar-se-á a criação, desenvolvimento e avaliação de acções de formação contínua de professores nos territórios relacionados com as disciplinas específicas, com as disciplinas de suporte e com a aplicação das TIC na educação, visando o ensino à distância.

A disponibilização de plataformas de ensino a distância permite também explorar outros elementos da comunidade educativa, nomeadamente alunos, funcionários e encarregados de educação. A plataforma será disponibilizada para apoiar a aquisição de competências básicas em TIC e respectivas certificação bem como para apoiar a outros projectos na área da educação.

Portugal Digital POI

www.prof2000.pt/professor

Portugal Digital POI

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



Professor






Apresentação

Projecto:	Professor – Serviços de Formação à Distância e Portal do Professor
EBP:	Direcção Regional de Educação do Centro – CE de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Desenvolvimento e expansão dos serviços de formação à distância do prof2000
Utilidade:	Aumentar a eficiência dos processos de formação
Orçamento:	127.200 €
Início/Fim	12.2004 – 11.2006 / 24 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Portugal Digital POI

Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

Execução Técnica: 1. Instalação dos Serviços Básicos de http, correio electrónico e FTP

Execução Financeira: Despesa Apresentada: 25.705,80 € / 20,21 % do Total
Complicação Recebida: 3.757,50 € / 3,94% do Total

Avaliação: Algum atraso no projecto

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica: 1. Desenvolvimento da plataforma de ensino à distância
2. 750 Certificações em CB TIC

Execução Financeira: 90.000 € / 70,8 % do Total Orçamento

Perspectivas:

- Sustentabilidade futura do projecto.
- Muito boas possibilidades de conclusão dentro do prazo previsto com os objectivos atingidos.



PROJECTO

Título do Projecto:
Tecnologias de Informação e Comunicação para disponibilização de serviços na Região de Turismo Rota da Luz - TIC & TU

Duração:
24 meses - Data de início: 2 de Novembro de 2004
Data de fim: 31 de Outubro de 2006

Descrição do Projecto:
Tendo em conta a competitividade crescente no sector do turismo a nível mundial, a Região de Turismo da Rota da Luz pretende, com a implementação duma plataforma Web, apostar

www.rotadaluz.pt/tic&tu

Apresentação



Projecto:	TIC & TU – Tecnologias de Informação e Comunicação para Disponibilização de Serviços na Região de Turismo Rota da Luz
EBP:	Região de Turismo Rota da Luz
Resultado Mais Importante:	Aumento da qualidade dos serviços associados ao sector do turismo
Utilidade:	Melhor conhecimento da Região; Informação e serviços actualizados
Orçamento:	162.879 €
Início/Fim	Nov. 2004 – Out. 2006 / 24 meses
Nº Entidades Beneficiárias	1

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Recolha e Tratamento da Informação
 2. Aquisição de equipamento informático
 3. Criação da Base de Dados

Execução Financeira: Despesa Apresentada: 62.484,83 € / 38 % do Total
Comparticipação Recebida 9.617,60 € / 11,8 % do Total

Avaliação: Dificuldade na coordenação do trabalho de equipe
Boa coordenação entre a execução técnica e a execução financeira do projecto

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Colocação on-line da Plataforma Web
 2. Implementação de uma Intranet na RT Rota da Luz
 3. N° Certificações em CB TIC: 20

Execução Financeira: 113.084 € / 70% do Total do Orçamento

Perspectivas: Aumento da eficiência dos serviços da Rota da Luz
Adesão à Plataforma de entidades externas
Análise dos resultados do 1º ano do projecto e correcção de desvios

universidade de aveiro		PROGRAMA Aveiro Digital 2003 - 2006
introdução		
estrutura de coordenação		
projectos	PROJECTOS	
documentação	<ul style="list-style-type: none"> e-UAProcurement - e-ABS (99.310 €) 	
ligações	<ul style="list-style-type: none"> Sistema Integrado de Tele-Trabalho da UA - SITUA (820.000 €) 	
contacto	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de Contacto e Interação com a UA - ContactUA (200.000 €) 	
outros projectos com a participação da ua	<ul style="list-style-type: none"> Sistema Integrado para Biblioteca e Arquivo Digitais - SInBAD (325.000 €) 	
2º concurso aveiro digital	<ul style="list-style-type: none"> Rede de Aprendizagem Interactiva - Radical (175.000 €) 	
notícias	<ul style="list-style-type: none"> NARTURAL: Natureza e Arte - NARTURAL (200.000 €) 	

www.pad.ua.pt/

Apresentação

Projecto:	SITUA - Sistema Integrado de Tele-Trabalho da UA
EBP:	Universidade de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Construção de um Sistema de Tele-Trabalho da UA
Utilidade:	Possibilitar, de modo seguro, que qualquer utente ou colaborador da UA possa aceder aos serviços de modo adequado ao desempenho das suas funções
Orçamento:	1.024.999,00 €
Início/Fim	01.2004 -12.2006 / 36 Meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	1

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Aquisição de todo o Hardware e Software previstos»;
 2. Construção do plano de classificação e da tabela de selecção;
 3. Operacionalização do Centro de Recursos em e_learning;
 4. Aquisição do Backoffice de RH e desenvolvimento de funcionalidades específicas da Universidade de Aveiro;
 5. Criação do site SIG da UA e levantamento dos conteúdos em campo (<http://websig.ua.pt>).

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 494.000,00 € / 48 % do Total
Comparticipação Recebida: 16.000,00 € / 2 % do Total

Avaliação: Dificuldades de execução das tarefas no enquadramento financeiro do projecto. Dificuldade em obter resposta do mercado às necessidades do projecto, devido ao seu carácter inovador.
Capacidade de resposta da equipa associada ao projecto

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Instalação e início de exploração da GD. Implementação de vários Workflow's;
 2. Início de exploração do sistema de gestão remota;
 3. Implementação da Secretaria Virtual dos RH;
 4. Nº Certificações em CB TIC: 1552.

Execução Financeira: 809.000,00 € / 79 % do Total do Orçamento

Perspectivas: O início da exploração de um conjunto de novos serviços enquadrados no presente projecto



www.aceav.pt/ria.edu



Apresentação

Projecto:	RIA.Edu – Rede Intermunicipal de Apoio à Educação
EBP:	ACEAV – Associação da Comunidade Educativa de Aveiro
Resultado Mais Importante:	Serviços úteis para a Comunidade Educativa
Utilidade:	Novas redes de aprendizagem e processos inovadores de aprendizagem cooperativa
Orçamento:	400 000 €
Início/Fim	01/04 – 12/06 / 36 meses
Nº de Entidades Beneficiárias:	42

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Portal da Comunidade Educativa
 2. Dossier Pedagógico do Professor
 3. Caderneta Electrónica do Aluno

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 261.945,97 € / 65,49 % do Total
Comparticipação Recebida: 90.869,56€ / 30,29% do Total

Avaliação: Atrasos na conclusão do CME-OnLine e Aplicação de Conteúdos
Consolidação da Comunidade; benefícios dos alunos/famílias;
aquisição de competências por professores, Alunos e Enc. Educação

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Arranque do próximo ano lectivo com mais turmas
 2. Nova versão do Portal que já incluirá CME On-Line, ...
 3. Nº Certificações em CB TIC: 3.250

Execução Financeira: Despesa total acumulada prevista em 15/11:
320 000 € / 80 % do Total Orçamento

Perspectivas: Boa execução física e financeira, atendendo ao empenhamento das entidades e dos agentes envolvidos.
A dependência da formação como instrumento de regulação individual é um factor crítico no processo.



www.lacticoop.pt/smia



Apresentação

Projecto:	SMIA – Serviço de Melhoramento Inseminação Artificial
EBP:	LP–Lacticoop Produtos Agrícolas, Lda
Resultado Mais Importante:	Melhoria na prestação de serviços de inseminação artificial
Utilidade:	Acesso a informação completa e actualizada relativa à exploração leiteira, vacas a inseminar e sêmen a utilizar na inseminação artificial
Orçamento:	90.840€
Início/Fim	Setembro 2003 / Dezembro 2005

Execução Realizada

**Execução
Técnica:**

1. O Software específico para os PDA's encontra-se operacional
2. O software está totalmente integrado no ERP da empresa

**Execução
Financeira:**

Despesa apresentada: 83.539€ / 91,96%
Comparticipação recebida: 36.037€ / 79,63%

Avaliação:

Equipa altamente motivada na execução do projecto
Software desenhado por inseedadores experientes
Infra-estrutura tecnológica existente em adaptação

Execução Planeada até Dezembro de 2005

**Execução
Técnica:**

1. Integração da base de dados com outras entidades
2. Acesso através do site de indicadores de fertilidade da exploração
3. Nº Certificações em CB TIC:150

**Execução
Financeira:**

Despesa total acumulada prevista em 15 de Nov 2005: 100%

Perspectivas:

A médio prazo, os benefícios a alcançar pela utilização atempada de indicadores de performance/fertilidade baseados em informação quantitativa e qualitativa farão com que as Best practices do sector sejam interiorizadas e partilhadas por todos os intervenientes.



GALILEU DIAG



www.galileu-diag.com




 Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



GALILEU DIAG






Apresentação

Projecto: GALILEU DIAG – A Webização do Diagnóstico à Gestão da Formação

EBP: Activos e Recursos (Galileu)

Resultado Mais Importante: Melhorar substancialmente a área de DIAGNÓSTICO e torná-la um factor decisivo para o sucesso dos nossos serviços.

Utilidade: Diminuir a discrepância entre os objectivos e os resultados da actividade formativa

Orçamento: 50 000,00 €

Início/Fim: Nov. de 2004 a Nov. de 2005 – 12 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 1




 Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

- Execução Técnica:**
1. Desenvolvimento da Metodologia de Diagnóstico
 2. Análise e Planeamento
 3. Definição do Modelo de dados

Execução Financeira: Despesas Apresentadas: 26.003,05 € / 52,01 % do Total
Comparticipação Recebida: 2.500,00 € / 5,00 % do Total

Avaliação: (-) Algumas diferenças entre o Cronograma e a execução
(+) Prazos e sucesso técnico

Execução Planeada até Dezembro de 2005

- Execução Técnica:**
1. Primary Debugging
 2. Implementação e Teste Piloto

Execução Financeira: 50 000, 00 € / 100 % do Total

Perspectivas: Excesso (embora compreensível) de controlo administrativo e financeiro



ADIRA

+Projecto
+Documentação
+Contactos

Projecto

Descrição do Projecto

O objectivo deste projecto é criar um portal do associativismo regional. Pretende-se criar um espaço onde todas as associações possam colocar as suas actividades e aceder a aplicações que ajudem a gerir o próprio organismo. Haverão conteúdos públicos (Internet/frontoffice) e privados (intranet/backoffice). O portal terá uma saída privilegiada para as autarquias que terão acesso imediato aos eventos municipais por forma a publicarem nos meios habituais. Neste âmbito haverá uma agenda que permite, aquando da colocação dos eventos por parte das associações, ajudar a gerir e coordenar a adequada marcação de datas. Desta forma poderá ser evitado o aglomerado de eventos para determinadas datas, possibilitando a expansão dos mesmos por um tempo maior, assim podem-se garantir actividades para o ano todo com maior rigor.

Outra vertente deste portal é a possibilidade de cada associação ter, na área restrita, aplicações que lhe permitam ajudar na sua própria gestão. As aplicações que, numa primeira análise, serão disponibilizadas são as seguintes:

- Gestão de associados
- Gestão de quotas
- Publicação e pesquisa de actas
- Gestão comercial (Facturação, notas de crédito, estatísticas...)
- Calendário





Desenvolvido por: NETU.L




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005



ADIRA






Apresentação

Projecto: ADIRA – Associações Digitais da Ria de Aveiro

EBP: Sociedade Recreio Artístico

Resultado Mais Importante: Equipamento

Utilidade: Dotar as entidades de meios informáticos

Orçamento: 321.740,00 €

Início/Fim: 01/2005 – 12/2006 – 24 Meses

Nº de Entidades Beneficiárias: 55




Reunião de Concertação AD | Aveiro, PEA | 1, 2 e 3 de Julho de 2005

Execução Realizada

Execução Técnica:

1. Aquisição de equipamento
2. 1ª Versão do sistema

Execução Financeira: Despesa apresentada: 179.304,62 € / 55,73 % do Total
Comparticipação recebida: 11.053,51 € / 4,77% do Total

Avaliação: Pontos Fracos da Execução: Nada a registar
Pontos Fortes da Execução: Universo vasto de participantes

Execução Planeada até Dezembro de 2005

Execução Técnica:

1. 1º Resultado Importante a Alcançar: Conclusão Plataforma
2. 2º Resultado Importante a Alcançar: Angariação de mais entidades
3. Nº Certificações em Competências Básicas TIC: 200

Execução Financeira: Despesa total prevista em 15 de Nov 2005:
250.000,00 € / 78 % do Total Orçamento

Perspectivas: Positivas: Criação de um sistema verdadeiramente global de apoio às associações e modernização das mesmas.
Negativas: Não cumprimento dos 95% de despesa total para 2005
