



Programa Aveiro Digital 2003–2006

Relatório de Actividades

Ano 2005

ÍNDICE

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2005

Sumário Executivo	3
Capítulo 1: Relatório de Progresso Material e Financeiro Medida 1.1 – 2005	4
Capítulo 2: Relatório de Progresso Material e Financeiro Medida 2.3 – 2005	25
Capítulo 3: Relatório de Progresso Material e Financeiro Medida 2.4 – 2005	130

SUMÁRIO EXECUTIVO

A gestão global do Programa Aveiro Digital, assumida pela Associação Aveiro Digital e pela Associação de Municípios da RIA é baseada num modelo de execução que contempla:

- Os projectos enquadrados na Área de Intervenção 1 – “Comunidade Digital”, que são da responsabilidade directa da Comissão Executiva, pois constituem investimentos estruturantes de alinhamento e alavanca de todo o Programa.
- Os projectos enquadrados nas restantes Áreas de Intervenção, da responsabilidade das Entidades Beneficiárias que, seleccionadas através de Concurso Público, se responsabilizam pela sua execução perante a Comissão Executiva do Programa.

Dada a natureza das Medidas de financiamento do Programa Aveiro Digital e as responsabilidades assumidas pela Comissão Executiva Aveiro Digital, este Relatório contempla a descrição detalhada das actividades associadas a cada Medida de financiamento, com especial destaque para os projectos da Área de Intervenção “Comunidade Digital”, com financiamento associado às Medidas 2.3 e 1.1.

O Relatório de Actividades – 2005 está organizado em 3 capítulos:

O 1º capítulo descreve a execução da Medida 1.1: Competências Básicas, conforme Relatório de Execução Material e Financeira enviado ao POSI.

O 2º capítulo descreve a execução da Medida 2.3: Cidades e Regiões Digitais, com especial destaque para os projectos enquadrados na Área de Intervenção 1: Comunidade Digital, da responsabilidade directa da Comissão Executiva, conforme Relatório de Execução Material e Financeira enviado ao POSI.

O 3º capítulo descreve a execução da Medida 2.4: Acções integradas de formação, conforme Relatório de Execução Material e Financeira enviado ao POSI.



Capítulo 1

Programa Aveiro Digital 2003–2006
POSI 95/1.1/C/CEN
Medida 1.1 – Competências Básicas
Relatório de Progresso Material e Financeiro – 2005

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Relatório de Progresso Material e Financeiro – 2005 da Medida 1.1 – Competências Básicas é da responsabilidade da Comissão Executiva Aveiro Digital e tem como objectivo descrever e documentar as actividades desenvolvidas entre 1 Janeiro e 31 Dezembro de 2005, no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003–2006.

A execução desta Medida, que tem como objectivo último certificar, em Competências Básicas nas TIC, 45.000 residentes na Região da AMRia, é um indicador directamente associado a um dos principais objectivos do Programa Aveiro Digital 2003–2006: contribuir para a qualificação das pessoas e organizações da Região.

Assim, a Comissão Executiva Aveiro Digital considera que a qualidade e eficiência da sua execução vão contribuir directamente para o êxito do Programa Aveiro Digital.

Este documento contempla o enquadramento da Certificação em Competências Básicas em TIC no Programa Aveiro Digital 2003–2006 e a descrição do seu Modelo de Execução. Em seguida descreve-se o Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital – SAVAD, com particular detalhe na área de Gestão da Certificação.

Finalmente é analisada a Execução Material e Financeira da Medida 1.1 – Competências Básicas e apresentam-se as conclusões e as perspectivas de execução desta medida.

Fazem parte integrante deste Relatório os seguintes Anexos:

Anexo 01	Modelo de Execução da Medida 1.1
Anexo 02	Lista de Entidades Credenciadas para a Certificação
Anexo 03	Convite às Entidades Beneficiárias
Anexo 04	Recomendações AD para CCBTIC


ENQUADRAMENTO DA CERTIFICAÇÃO EM COMPETÊNCIAS BÁSICAS

O Programa Aveiro Digital 2003–2006 assume-se como um motor do desenvolvimento social, económico e cultural, perspectivando a modernização dos serviços e a qualificação das pessoas na região da Associação de Municípios da Ria.

A gestão deste Programa é da responsabilidade conjunta da AAD – Associação Aveiro Digital e da AMRIA – Associação de Municípios da Ria e a sua execução é, fundamentalmente, baseada na contratualização dos projectos seleccionados através de Concursos Públicos e apresentados pelas entidades adequadas e beneficiárias em cada Área de Intervenção.

O modelo de execução reflecte métodos e formatos já consolidados, assumindo uma natureza claramente matricial:

- A direcção operacional dos projectos enquadrados na Área “Comunidade Digital” é da responsabilidade directa da Comissão Executiva do Programa, pois estes projectos constituem os investimentos estruturantes de alinhamento e alavanca de todo o Programa.
- A direcção operacional dos projectos enquadrados nas restantes Áreas de Intervenção é da responsabilidade dos agentes respectivos, que através de Concurso Público, se comprometem pela sua execução perante a Comissão Executiva do Programa Aveiro Digital.

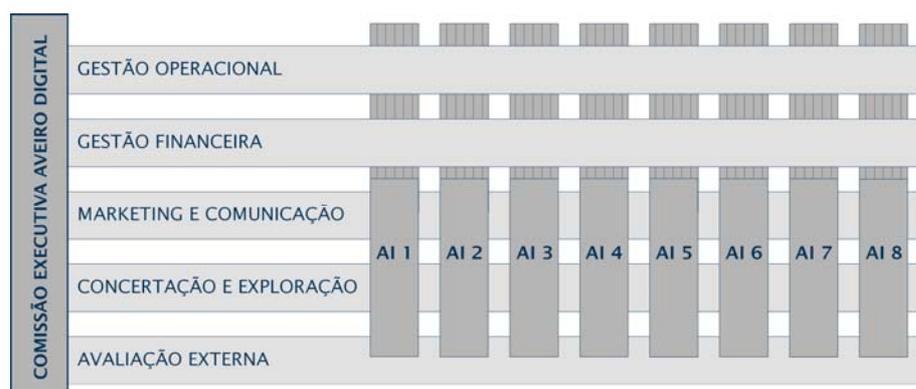

Através de 2 concursos públicos foram seleccionados 71 projectos, abrangendo todas as Áreas de Intervenção do Programa Aveiro Digital 2003–2006.

O Programa Aveiro Digital 2003–2006 é financiado pelo POSI através de 3 Medidas distintas:

- Medida 1.1 – Competências Básicas
- Medida 2.3 – Projectos Integrados: das Cidades Digitais ao Portugal Digital
- Medida 2.4 – Acções integradas de formação

A visão integrada da execução das 3 Medidas obrigou a um esforço de harmonização de procedimentos, com o objectivo de minimizar a complexidade da execução e gestão de três medidas distintas no âmbito de cada Projecto Aveiro Digital.

Aveiro Digital 2003 - 2006
www.aveiro-digital.pt

SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital
piar

- GAD
- PAD 2003-2006
- AI 1
- AI 2
- AI 3
- AI 4
- AI 5
- AI 6
- AI 7
- AI 8
- *bíblia*
- *INFORDICO*
- *MEMDigital*
- *P@Z*
- *SIGRED*
- *AAD - TA*
- *Adira*
- *IPDIGITAL*
- *piar*
 - Plano Técnico e Fin.
 - Identificação
 - Entidades Beneficiárias
 - Descrição Sumária
 - Descrição Detalhada
 - Tarefas e Resultados
 - A-Gestão
 - B-Concertação
 - C-Avaliação
 - D-Formação
 - 1-Identificação de requisitos e formatação de informação
 - 2-Desenvolvimento
 - 3-Integração e teste de "laboratório"
 - 4-Aquisição, instalação e teste em campo
 - 5-Validação e operação
 - Cronograma
 - Lista de Recursos
 - Orçamento
 - Documentos Adicionais
 - Relatório de Impressão
 - **Gestão Técnica**
 - **Gestão Formação**
 - **Gestão Certificação**
 - **Gestão Financeira**
- *POMADA*
- Sair

TAREFA NºD - Formação - piar

Tarefa: Formação

Data de Início: 1 Data de Fim: 36 Duração (meses): 36

Dependências: 2 5 Total RH(hm): 6

Responsável: rtn

Participantes: p1 p2 p3 p4 p5 ...

Objectivos:

1 Qualificação em TIC e Certificação em Competências Básicas
 População: responsáveis por associações culturais, recreativas, desportivas....
 Justificação: para poderem usufruir das potencialidades do projecto PIAR

2 Qualificação nos Serviços e Aplicações do Projecto
 População: responsáveis por associações culturais, recreativas, desportivas....
 Justificação: para poderem contribuir com a informação da actividade da sua organização

Descrição:

1 Histórico de Formação (210 caracteres)
 formação básica na utilização das ferramentas de edição de texto
 Formação básica no acesso à internet e na utilização de e-mail

2 Programas de Formação (1150 caracteres)
 -formação em gestão e operação de redes locais
 -formação básica na utilização das TICs
 -formação avançada na utilização das ferramentas de "office" (edição de texto, folhas de cálculo, bases de dados simples, apresentação com apoio informático, construção de páginas web, ferramentas de comunicação via web-"netmeeting", chat,...)
 -formação na utilização da plataforma do projecto PIAR

3 Entidades Certificadas para o fornecimento de Formação (210 caracteres)
 PT Inovação/GIAGI/Companhia Própria/Ideia Verde/CNS/....

Lista de Resultados e Calendário:

Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	Início	Fim	Duração	Local	Nº de acções	Total de Formandos
utilização da plataforma	7	36	30h/5dias	Ilhavo	18	180
utilização da plataforma	7	36	30h/5dias	Aveiro	18	180
utilização da plataforma	7	36	30h/5dias	Estarreja	18	180

Formação Competências Básicas em TIC D.L. 140/2001 (Práticas Simuladas)	Início	Fim	Duração	Local	Nº de acções	Total de Formandos
competências básicas	6	36	15h/3dias	ilhavo	9	90
competências básicas	6	36	15h/3dias	aveiro	9	90
competências básicas	6	36	15h/3dias	Estarreja	9	90

Certificação em Competências Básicas	Início	Fim	Local	Nº de Certificações
utilização de ferramentas	6	24	ilhavo	100
utilização de ferramentas	6	24	aveiro	150

Orçamento da Tarefa

Rúbrica de Investimento	Ano 1 €	Ano 2 €	Ano 3 €	Total €	%
Despesas de Capital / Imobilizadas Corpóreas					
Equipamento	0	0	0	0	0
Outras despesas de investimento	0	0	0	0	0
Sub-Total					

Plano Técnico e Financeiro: Tarefa D – Formação

Copyright © 2006, Comissão Executiva Aveiro Digital

7 / 181

A harmonização da execução das 3 Medidas foi conseguida através da concepção de um modelo para o Plano Técnico e Financeiro como referência base das Candidaturas e que, após a selecção e aprovação dos Projectos, se assumiu como compromisso de execução de cada Projecto onde constam todos os resultados técnicos e respectivos orçamentos que as Entidades Beneficiárias contratualizaram com a CEAD.

A estrutura do Plano Técnico e Financeiro contempla quatro tarefas mandatórias: Gestão, Concertação, Avaliação e Formação. A Tarefa D – Formação tem um formato especificamente orientado para os requisitos do FSE na identificação da Formação e mais especificamente, quanto à natureza da Medida 1.1, na indicação do número de Certificações em Competências Básicas a executar.

O objectivo global comprometido pelo Programa Aveiro Digital é de 45.000 certificações em Competências Básicas. Os 71 Projectos Aveiro Digital assumiram o compromisso de certificar 25.491 pessoas, cabendo à CEAD a responsabilidade de executar as restantes certificações através das Iniciativas Horizontais planeadas para toda a Região da AMRia e baseadas nos 11 Espaços Internet Municipais.

O Projecto P 1.6 – Serviços de Certificação em Competências Básicas nas TIC, integrado na AI1, tem como objectivo principal a gestão dos Serviços de Certificação em Competências Básicas nas TIC, de acordo com o D.L. 140/2001, respeitando as orientações e modelo de execução aprovado pela CEAD, competindo-lhe conduzir e gerir horizontalmente a execução desta Medida.

MODELO DE EXECUÇÃO DA CERTIFICAÇÃO EM COMPETÊNCIAS BÁSICAS

A CEAD, na sua 17ª reunião, realizada no dia 21 de Setembro de 2004, tendo em conta a legislação que regula o Processo de Certificação em Competências Básicas nas TIC, aprovou o Modelo de Execução da Medida 1.1, (Anexo 01) e a credenciação de 86 Entidades para a Certificação das Competências Básicas nas TIC, no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003–2006, considerando as condições necessárias para prestarem serviços de certificação, de acordo com a legislação aplicável.

Posteriormente e já em 2005, foram seleccionadas pela CEAD mais 16 Entidades resultantes quer dos projectos aprovados no âmbito do 2º Concurso Aveiro Digital, quer dos pedidos efectuados por Entidades Beneficiárias Aveiro Digital, totalizando uma lista de 102 Entidades Credenciadas para a CCB nas TIC, na Região da AMRia e no âmbito do Programa Aveiro Digital. (Anexo 2)

Foi dado conhecimento à UMIC e ao POSI do Modelo adoptado e da Lista de Entidades Credenciadas, dado o papel destas Entidades na gestão do processo de Certificação a nível nacional.

As Entidades Beneficiárias Aveiro Digital, credenciadas para a Certificação em Competências Básicas, foram convidadas a prestar serviços de certificação no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003–2006, respeitando um conjunto de condições e de recomendações para garantir a harmonização e a credibilidade dos procedimentos de Certificação. (Anexos 03 e 04).

Cada EBP deverá seleccionar da lista de Entidades Credenciadas, a(s) Entidade(s) que considerar mais adequada(s) para a prestação dos Serviços necessários à execução dos seus compromissos de Certificação em Competências Básicas nas TIC.

As EBPs quando requisitam Serviços de Certificação obrigam-se à inscrição dos seus Formandos através do fornecimento às Entidades Certificadoras de um Ficheiro Word contendo a sua completa identificação de acordo com as normas do FSE.

As Entidades Certificadoras quando terminam cada processo de Certificação obrigam-se a manter em Arquivo todos os documentos de registo recomendados pela CEAD e a entregar às Entidades Beneficiárias Principais o respectivo ficheiro Excel de Certificados emitidos, extraído do Sistema Nacional de Certificação em <http://www.sidiploma.unic.pcm.gov.pt>, para posterior apresentação no SAVAD (Gestão Certificação). (Anexo 04)

Os serviços de Certificação em Competências Básicas nas TIC são gratuitos para os Projectos Aveiro Digital não podendo ser facturados às EBP.


As Entidades Credenciadas devem facturar com base nos preços de referência POSI, os serviços de Certificação directamente à Associação Aveiro Digital, como Serviços de Monitoria de CCBTIC, indicando o número de Certificados executados e o Projecto Aveiro Digital associado.

SAVAD: GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO

Integrada no Sistema SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital, foi criada uma área de Gestão da Certificação que implementa os procedimentos de gestão e controlo do FSE e contempla as seguintes funcionalidades:

- o Gestão da Certificação: Inserir Certificados

Nesta área a Entidade Beneficiária Principal selecciona a Entidade Certificadora da lista de Entidades definidas pela CEAD, que lhe prestou os serviços de Certificação e insere o ficheiro extraído do Sistema de Informação Diploma de Competências Básicas em Tecnologias de Informação e Comunicação, que lhe foi fornecido por essa Entidade.

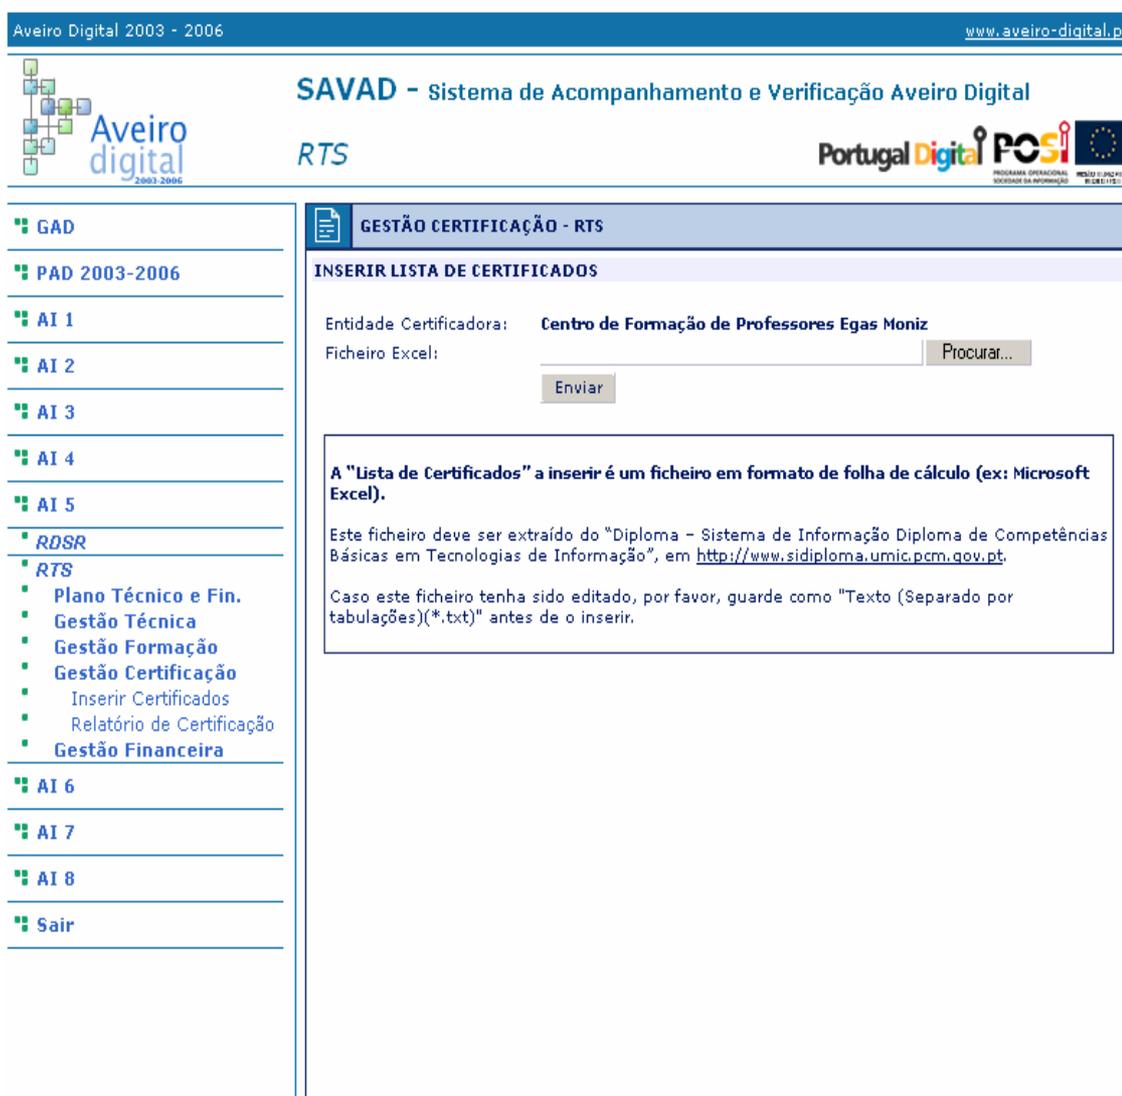

Aveiro Digital 2003 - 2006 www.aveiro-digital.pt

SAVAD - Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital
RTS

Portugal Digital **POSI** 
PROGRAMA OPERACIONAL
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
2002-2006
INICIATIVA
COMUNITÁRIA

- GAD
- PAD 2003-2006
- AI 1
- AI 2
- AI 3
- AI 4
- AI 5
- RDSR
- RTS
 - Plano Técnico e Fin.
 - Gestão Técnica
 - Gestão Formação
 - Gestão Certificação
 - Inserir Certificados
 - Relatório de Certificação
 - Gestão Financeira
- AI 6
- AI 7
- AI 8
- Sair

GESTÃO CERTIFICAÇÃO - RTS

INSERIR LISTA DE CERTIFICADOS

Entidade Certificadora: **Centro de Formação de Professores Egas Moniz**

Ficheiro Excel:

A "Lista de Certificados" a inserir é um ficheiro em formato de folha de cálculo (ex: Microsoft Excel).

Este ficheiro deve ser extraído do "Diploma - Sistema de Informação Diploma de Competências Básicas em Tecnologias de Informação", em <http://www.sidiploma.umic.pcm.gov.pt>.

Caso este ficheiro tenha sido editado, por favor, guarde como "Texto (Separado por tabulações)(* .txt)" antes de o inserir.

Gestão da Certificação: Inserir Certificados

- o Gestão da Certificação: Relatório da Certificação

Nesta área são disponibilizados todos os ficheiros de certificação já entregues pelo projecto, com a possibilidade de impressão do Relatório da Certificação em formato de tabela com o acumulado à data de todos os Certificados atribuídos.

Aveiro Digital 2003 - 2006
www.aveiro-digital.pt



SAVAD - Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

Ria.EDU



- GAD
- PAD 2003-2006
- AI 1
- AI 2
- AI 3
 - e-RIA
 - PorMat
 - Professor
 - e-CMEI
 - Ria.EDU
 - Plano Técnico e Fin.
 - Gestão Técnica
 - Gestão Formação
 - Gestão Certificação
 - Inserir Certificados
 - Relatório de Certificação
 - Gestão Financeira
- AI 4
- AI 5
- AI 6
- AI 7
- AI 8
- Sair

GESTÃO CERTIFICAÇÃO - Ria.EDU

RELATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO

Centro de Formação de Professores de Águeda

	Ficheiro	Certificações	Estado	Data	Apagar
1	para_posi_agueda.xls	400	Entregue	07/01/2005	

Centro de Formação de Professores de Albergaria-a-Velha

	Ficheiro	Certificações	Estado	Data	Apagar
1	para_posi_albergaria.xls	207	Entregue	07/01/2005	

Centro de Formação José Pereira Tavares

	Ficheiro	Certificações	Estado	Data	Apagar
1	para_posi_aveiro1.xls	539	Entregue	07/01/2005	

Centro de Formação de Escolas do Concelho de Ílhavo

	Ficheiro	Certificações	Estado	Data	Apagar
1	para_posi_ilhavo.xls	766	Entregue	07/01/2005	

Centro de Formação de Professores de Oliveira do Bairro

	Ficheiro	Certificações	Estado	Data	Apagar
1	para_posi_Oliveira do Bairro.xls	26	Entregue	07/01/2005	

Centro de Formação de Professores do Concelho de Ovar

	Ficheiro	Certificações	Estado	Data	Apagar
1	para_posi_Ovar.xls	82	Entregue	07/01/2005	

Centro de Formação da Assoc. de Escolas de Sever de Vouga

	Ficheiro	Certificações	Estado	Data	Apagar
1	para_posi_Sever Vouga.xls	116	Entregue	07/01/2005	

Total de Certificados: 2136



Gestão da Certificação: Relatório de Certificação

Copyright © 2006, Comissão Executiva Aveiro Digital

12 / 181

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MATERIAL

ÁREA DE INTERVENÇÃO 1: COMUNIDADE DIGITAL

O objectivo da CEAD, inscrito no Projecto P1.6 – Serviços de Certificação em Competências Básicas em TIC da Área de Intervenção 1, é certificar 45.000 pessoas da Região da AMRia, das quais 25.491 serão certificadas no âmbito dos 71 projectos verticais.

A CEAD assumiu a responsabilidade de executar as restantes 19.509 certificações não só através das Iniciativas Horizontais planeadas para toda a Região e baseadas nos 11 Espaços Internet Municipais mas também por iniciativa das Entidades Beneficiárias Aveiro Digital credenciadas para a certificação em CBTic. Esta Execução está associada à conjugação dos recursos inscritos nos projectos P1.1 – Espaços Internet Aveiro Digital e P1.6 – Serviços de Certificação em Competências Básicas em TIC, incluídos na Área de Intervenção 1.

O processo de Certificação em Competências Básicas nas TIC foi estimulado em 2005 através das iniciativas marketing, divulgação e de mobilização horizontal, conforme planeado nos projectos directamente dirigidos pela CEAD – Ver Relatório de Execução Material e Financeira – 2005 da Medida 2.3.

Das 19.509 CCB nas TIC da responsabilidade directa da CEAD, foram já executadas 2.416 CCB nas TIC, conforme a seguir se evidencia:

Execução Medida 1.1: AI 1	Executado
Execução Medida 1.1: Espaços Internet Aveiro Digital	
- EIAD Águeda	0
- EIAD Albergaria-a-Velha	401
- EIAD Aveiro	304
- EIAD Estarreja	23
- EIAD Ílhavo	5
- EIAD Mira	0
- EIAD Murtosa	51
- EIAD Oliveira do Bairro	521
- EIAD Ovar	203
- EIAD Sever do Vouga	258
- EIAD Vagos	0
- EIAD da Freguesia de Esgueira	287
- EIAD da Área Militar de São Jacinto	74
Execução Medida 1.1: Outras Entidades	
- EB 2,3 A. Simões Dias (Ovar)	280
- Activos e Recursos, Lda.	7
- Abimota	2
Total	2.416

Em seguida, evidenciam-se os compromissos e a execução em 2005 das Certificações por Projecto nas restantes Áreas de Intervenção.

ÁREA DE INTERVENÇÃO 2: AUTARQUIAS E SERVIÇOS CONCELHIOS

Os 10 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 3.784 Certificações, tendo sido executadas 503 CCB nas TIC.

Projecto	Ref. PAD	Compromisso	Registo por Projecto		Registo no P1.6	
			Nº	%	Nº	%
SICAVIM	Ref. PAD 017	250	0	0,0%	0	0,0%
SIGRia	Ref. PAD 001	100	25	25,0%	32	32,0%
Sal-ON LINE	Ref. PAD 016	1.000	192	19,2%	191	19,1%
AEI	Ref. PAD 020	870	0	0,0%	0	0,0%
VAGOSINFORMA	Ref. PAD 018	200	0	0,0%	0	0,0%
SEVERINFORMA	Ref. PAD 023	120	60	50,0%	60	50,0%
Ambi-Ria	Ref. PAD 140	60	18	30,0%	18	30,0%
Mobi-Ria	Ref. PAD 138	24	0	0,0%	5	20,8%
Secur-Ria	Ref. PAD 101	60	18	30,0%	18	30,0%
Ria-on-line	Ref. PAD 141	1.100	138	12,5%	179	16,3%
Totais		3.784	451	11,9%	503	13,3%

ÁREA DE INTERVENÇÃO 3: ESCOLAS E COMUNIDADES EDUCATIVAS

Os 5 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 6.480 Certificações, tendo sido executadas 5.299 CCB nas TIC.

Projecto	Ref. PAD	Compromisso	Registo por Projecto		Registo no P1.6	
			Nº	%	Nº	%
e-ria	Ref. PAD 060	1.600	1209	75,6%	1.160	72,5%
Pormat	Ref. PAD 067	240	338	140,8%	401	167,1%
ria.edu	Ref. PAD 006	3.250	3110	95,7%	3.401	104,6%
e-cmei	Ref. PAD 022	250	10	4,0%	10	4,0%
Professor	Ref. PAD 145	1.140	311	27,3%	327	28,7%
Totais		6.480	4.978	76,8%	5.299	81,8%

ÁREA DE INTERVENÇÃO 4: UNIVERSIDADE E COMUNIDADE

UNIVERSITÁRIA

Os 6 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 10.000 Certificações, tendo sido executadas 738 CCB nas TIC.

Projecto	Ref. PAD	Compromisso	Registo por Projecto		Registo no P1.6	
			Nº	%	Nº	%
e-abs	Ref. PAD 008	470	189	40,2%	189	40,2%
situa	Ref. PAD 009	5.174	547	10,6%	547	10,6%
contactua	Ref. PAD 010	1.009	0	0,0%	0	0,0%
sinbad	Ref. PAD 012	1.514	0	0,0%	0	0,0%
Natural	Ref. PAD 108	1.000	2	0,2%	2	0,2%
radical	Ref. PAD 014	833	0	0,0%	0	0,0%
Totais		10.000	738	7,4%	738	7,4%

ÁREA DE INTERVENÇÃO 5: SERVIÇOS DE SAÚDE

Os 2 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 385 Certificações, tendo já sido executadas 44 CCB nas TIC.

Projecto	Ref. PAD	Compromisso	Registo por Projecto		Registo no P1.6	
			Nº	%	Nº	%
RDSR	Ref. PAD 039	85	19	22,4%	44	51,8%
RTS	Ref. PAD 071	300	112	37,3%	0	0,0%
Totais		385	131	34,0%	44	11,4%

ÁREA DE INTERVENÇÃO 6: SOLIDARIEDADE SOCIAL

Os 6 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 523 Certificações, tendo já sido executadas 238 CCB nas TIC.

Projecto	Ref. PAD	Compromisso	Registo por Projecto		Registo no P1.6	
			Nº	%	Nº	%
saiss	Ref. PAD 015	200	147	73,5%	147	73,5%
Estar	Ref. PAD 128	68	0	0,0%	13	19,1%
SAD-SOS	Ref. PAD 102	100	62	62,0%	62	62,0%
ISSI	Ref. PAD 133	30	9	30,0%	0	0,0%
Inluinet	Ref. PAD 132	50	0	0,0%	16	32,0%
AMRia Social	Ref. PAD 113	75	0	0,0%	0	0,0%
Totais		523	218	41,7%	238	45,5%

ÁREA DE INTERVENÇÃO 7: TECIDO PRODUTIVO

Os 31 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 1.979 Certificações, tendo sido executadas 510 CCB nas TIC.

Projecto	Ref. PAD	Compromisso	Registo por Projecto		Registo no P1.6	
			Nº	%	Nº	%
Geo-MKT	Ref. PAD 029	100	0	0,0%	0	0,0%
TIC & TU	Ref. PAD 112	20	20	100,0%	20	100,0%
Geoinvest	Ref. PAD 027	50	17	34,0%	17	34,0%
red-aveiro	Ref. PAD 072	100	0	0,0%	0	0,0%
Tup	Ref. PAD 044	100	0	0,0%	0	0,0%
Hmc	Ref. PAD 042	13	14	107,7%	14	107,7%
Smia	Ref. PAD 052	150	0	0,0%	0	0,0%
fig-net	Ref. PAD 031	30	0	0,0%	0	0,0%
Digivacas	Ref. PAD 064	315	0	0,0%	0	0,0%
Marc	Ref. PAD 074	100	56	56,0%	69	69,0%
e-ntl	Ref. PAD 069	45	11	24,4%	17	37,8%
Sani	Ref. PAD 047	100	0	0,0%	0	0,0%
Estag	Ref. PAD 033	30	0	0,0%	0	0,0%
Inovortal	Ref. PAD 032	250	0	0,0%	219	87,6%
Onda	Ref. PAD 021	6	0	0,0%	0	0,0%
abs XXI	Ref. PAD 036	60	0	0,0%	0	0,0%
Sipa	Ref. PAD 026	80	39	48,8%	0	0,0%
Caderno Digital	Ref. PAD 147	7	0	0,0%	0	0,0%
Abdigital	Ref. PAD 106	45	51	113,3%	51	113,3%
SEMIAR	Ref. PAD 130	35	0	0,0%	25	71,4%
BRAXEN	Ref. PAD 115	45	0	0,0%	10	22,2%
uebe.SI	Ref. PAD 103	20	5	25,0%	0	0,0%
Com.Web	Ref. PAD 137	18	0	0,0%	0	0,0%
GALILEU-DIAG	Ref. PAD 148	20	4	20,0%	0	0,0%
JFD	Ref. PAD 117	45	0	0,0%	0	0,0%
DigiPot	Ref. PAD 119	45	0	0,0%	3	6,7%
Imagem XXI	Ref. PAD 118	30	0	0,0%	0	0,0%
ATLETICA	Ref. PAD 139	60	15	25,0%	15	25,0%
Extraplas	Ref. PAD 110	30	30	100,0%	30	100,0%
VLM On-line	Ref. PAD 104	10	10	100,0%	0	0,0%
e-SI	Ref. PAD 123	20	20	100,0%	20	100,0%
Totais		1.979	292	14,8%	510	25,8%

ÁREA DE INTERVENÇÃO 8: INFORMAÇÃO, CULTURA E LAZER

Os 11 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 2.340 Certificações, tendo sido executadas 739 CCB nas TIC.

Projecto	Ref. PAD	Compromisso	Registo por Projecto		Registo no P1.6	
			Nº	%	Nº	%
Infordico	Ref. PAD 024	1.000	476	47,6%	476	47,6%
MEMDigital	Ref. PAD 055	200	65	32,5%	65	32,5%
P@Z	Ref. PAD 050	20	32	160,0%	32	160,0%
bibria	Ref. PAD 066	50	56	112,0%	66	132,0%
AAD-TA	Ref. PAD 038	20	0	0,0%	0	0,0%
piar	Ref. PAD 003	250	0	0,0%	0	0,0%
MUSEAVE	Ref. PAD 107	100	100	100,0%	100	100,0%
SIGRed	Ref. PAD 114	300	0	0,0%	0	0,0%
IPJDIGITAL	Ref. PAD 120	100	0	0,0%	0	0,0%
Adira	Ref. PAD 142	200	0	0,0%	0	0,0%
POMADA	Ref. PAD 136	100	0	0,0%	0	0,0%
Totais		2.340	729	31,2%	739	31,6%

Em seguida, evidencia-se a execução em 2005 das Certificações pelas Entidades Beneficiárias Credenciadas Aveiro Digital.

Entidade Beneficiária Credenciada Aveiro Digital	Concelho	Executado
Centro de Formação de Professores de Águeda	Águeda	874
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Fermentelos	Águeda	26
Escola Secundária Marques Castilho	Águeda	143
Instituto Duarte Lemos	Águeda	70
Abimota	Águeda	122
Centro de Formação de Professores de Albergaria-a-Velha	Albergaria-a-Velha	207
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos da Branca	Albergaria-a-Velha	82
Escola Básica Integrada de S. João de Loure	Albergaria-a-Velha	44
EIAD Municipal de Albergaria-a-Velha	Albergaria-a-Velha	472
Agrupamento de Escolas de Eixo	Aveiro	61
AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro	Aveiro	47
AMRia – Associação de Municípios da Ria	Aveiro	247
APPACDM	Aveiro	147
Associação Educ. e Valorização Rec. Humanos Distrito de Aveiro	Aveiro	79
Centro de Formação José Pereira Tavares	Aveiro	1308
EIAD Municipal de Aveiro	Aveiro	438
Universidade de Aveiro	Aveiro	738
Sub-Região de Saúde de Aveiro	Aveiro	44
Netual – Multimédia e Telecomunicações, Lda.	Aveiro	249
EIAD da Freguesia de Esgueira	Aveiro	287
Área Militar de São Jacinto	Aveiro	74
Activos e Recursos, Lda.	Aveiro	7
Centro de Formação de Professores Egas Moniz	Estarreja	98
Escola Básica dos 2º e 3º Padre Donaciano de Abreu Freire	Estarreja	60
Espaço Internet Municipal de Estarreja	Estarreja	91
Centro de Formação de Escolas do Concelho de Ílhavo	Ílhavo	1331
EIAD Municipal de Ílhavo	Ílhavo	217
CerciMira	Mira	13
Escola Básica Integrada da Torreira	Murtosa	94
EIAD Municipal de Murtosa	Murtosa	91
Associação de Solidariedade Social do Silveiro	Oliveira do Bairro	16
Centro de Formação de Professores de Oliveira do Bairro	Oliveira do Bairro	98
Escola Secundária de Oliveira do Bairro	Oliveira do Bairro	92
EIAD Municipal de Oliveira do Bairro	Oliveira do Bairro	571
Centro de Formação de Professores do Concelho de Ovar	Ovar	152
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos António Dias Simões	Ovar	280
Escola Secundária com 3º Ciclo Júlio Dinis	Ovar	40
Escola Secundária com 3º Ciclo José Macedo Fragateiro	Ovar	91
EIAD Municipal de Ovar	Ovar	308
Centro de Formação da Associação de Escolas de Sever de Vouga	Sever do Vouga	481
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Sever de Vouga	Sever do Vouga	119
Espaço Internet Municipal de Sever do Vouga	Sever do Vouga	318
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Dr. João Rocha-Pai	Vagos	142
EIAD Municipal de Vagos	Vagos	18
	Total	10.487

Assim, durante o ano de 2005 foram executadas 10.487 CCB nas TIC.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

GESTÃO FINANCEIRA

A execução financeira da Medida 1.1 é da responsabilidade exclusiva da Comissão Executiva Aveiro Digital. Assim as Entidades Credenciadas facturaram directamente à Associação Aveiro Digital, os Serviços de Monitoria de CCBTIC com base nos preços de referência POSI, indicando o número de Certificados executados e o Projecto Aveiro Digital associado.

A Gestão Financeira é realizada por dois técnicos, um com formação em Gestão e outro com formação em Auditoria Contabilística.

As actividades de gestão financeira planeadas para esta medida contemplam os seguintes pontos:

- Análise e avaliação regular da execução financeira;
- Elaboração de relatórios de apresentação de despesas à entidade financiadora (POSI), de acordo com as normas e os regulamentos estabelecidos;
- Registo e verificação da movimentação das contas bancárias do Programa Aveiro Digital 2003–2006;
- Especificação dos requisitos da Gestão Financeira do Sistema SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital.

METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO DE DESPESAS

A CEAD definiu uma metodologia para as Apresentações de Despesas baseada num processo de workflow, complementada com o desenvolvimento de uma ferramenta de apoio – o SAVAD, onde está incorporada toda a legislação aplicável, de forma a simplificar a complexidade destes processos e onde todos os projectos têm uma área própria de Gestão Financeira.

A metodologia consolidada para o processo de apresentação de despesas à entidade financiadora da Medida 1.1 é a seguinte:

- Identificação, selecção e recolha de todos os documentos de despesa, aceites apenas quando coerentes com os respectivos Ficheiros de Certificações em CBTIC introduzidos no SAVAD;
- Introdução dos dados no SAVAD pelo Gabinete Aveiro Digital;
- Pré-verificação pelo GAD das despesas registadas;

- Elaboração do dossier financeiro com as despesas e documentos justificativos associados;
- Análise e verificação dos dossiers financeiros;
- Anulação dos documentos contabilísticos originais, com a aposição do carimbo de financiamento POSI e FSE, respectiva taxa de imputação e rubrica do técnico GAD;
- Numeração sequencial de todos os documentos que integram o dossier financeiro, contendo o número do Pedido de Pagamento e o número da Ref. PAD;
- Verificação e Extracção do SAVAD de todos os ficheiros e formulários POSI associados à Medida 1.1;
- Envio ao POSI dos formulários em formato papel, acompanhados de cópias de todos os documentos de despesas e respectivos justificativos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2005

No dia 22 de Dezembro, data da 4ª Apresentação de Despesas e última de 2005, estavam executados 52.434,79€, correspondendo a 26% do Orçamento Total para a Medida 1.1 – FSE.

Com a execução material dos 77 Projectos, o Programa Aveiro Digital 2003–2006 atingiu a sua dimensão plena, prevendo-se que a execução financeira de 2006 atinja 147.565,21€.

O quadro seguinte mostra a execução financeira já realizada:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado		% execução
		2005	Total	
Monitoria	200.000,00 €	52.434,79 €	52.434,79 €	26,22%

FLUXO FINANCEIRO POSI – PROGRAMA AVEIRO DIGITAL

Durante o ano de 2005, realizou-se a primeira, segunda, terceira e quarta Apresentações de Despesas Aveiro Digital 2003–2006 ao POSI, no valor total de 52.434,79€:

- 1ª Apresentação de Despesas – Realizada em 18 de Abril, num montante de despesas apresentadas de 11.980,00€;
- 2ª Apresentação de Despesas – Realizada em 1 de Agosto, num montante de despesas apresentadas de 21.360,00€;
- 3ª Apresentação de Despesas – Realizada em 24 de Outubro, num montante de despesas apresentadas de 11.564,85€;
- 4ª Apresentação de Despesas – Realizada em 22 de Dezembro, num montante de despesas apresentadas de 7.529,94€.

O Quadro seguinte mostra o fluxo de caixa semestral entre o POSI e o Programa Aveiro Digital:

Período	Despesa Apresentada Acumulada	Comparticipação Financeira	Valor Recebido Acumulado	Saldo do Semestre
1º Semestre 2004	- €	- €	- €	- €
2º Semestre 2004	- €	- €	11.250,01€	-11.250,01€
1º Semestre 2005	11.980,00 €	8.985,00 €	11.250,01€	-2.265,01 €
2º Semestre 2005	52.434,79 €	39.326,09 €	21.932,15 €	17.393,94 €

PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2006

Tendo em conta o desenvolvimento e consolidação do modelo de execução da Medida 1.1 – Competências Básicas, prevê-se a seguinte calendarização de execução do respectivo Orçamento:

Rubricas Orçamental	2003	2004	2005	2006	Total
Monitoria	- €	- €	52.434,79 €	147.565,21€	200.000,00 €

ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÕES

O processo de Certificação em Competências Básicas em TIC está embebido no modelo matricial de execução do Programa Aveiro Digital.

À Área de Intervenção 1 – Comunidade Digital, conduzida pela CEAD, está cometida a responsabilidade de 19.509 Certificações que serão executadas quer por iniciativa dos Espaços Internet Municipais Aveiro Digital quer por iniciativa das Entidades Beneficiárias Aveiro Digital credenciadas pela CEAD para a CCBTIC.

Nas restantes 7 Áreas de Intervenção, onde estão comprometidas 25.491 Certificações, cada projecto tem responsabilidades de certificar o segmento da população que lhe está naturalmente associado. Abrangem-se assim na AI2: 3.784 técnicos e funcionários da administração pública local e regional, na AI3: 6.480 professores, funcionários, alunos e encarregados de educação, na AI4: 10.000 docentes, alunos e funcionários da Universidade de Aveiro, na AI5: 385 profissionais de saúde, na AI6: 523 técnicos e utentes das Instituições de Solidariedade Social, na AI7: 1.979 gestores, técnicos e operários das empresas, na AI8: 2.340 agentes culturais e das associações desportivas e recreativas.

Tendo sido executadas 10.487 CCB nas TIC durante o ano de 2005, a CEAD considera que o modelo operacional adoptado para esta Medida, cria condições de harmonização regional, credibilidade e de agilidade que facilitam a sua execução e fundamentam as expectativas de boa execução em 2006.

No entanto a CEAD considera que, no quadro nacional do processo de CCBTIC, urge definir um adequado racional de enquadramento das CCBTIC na certificação geral de competências e criar medidas adequadas de credibilização para valorizar as CCBTIC e estimular a sua massiva execução.



Capítulo 2

Programa Aveiro Digital 2003–2006
POSI 401/2.3/C/CEN
Medida 2.3 – Cidades e Regiões Digitais
Relatório de Progresso Material e Financeiro – 2005

SUMÁRIO EXECUTIVO

Este Relatório de Progresso Material e Financeiro do ano 2005 é da responsabilidade da Comissão Executiva Aveiro Digital e tem como objectivo descrever detalhadamente a Execução Material e Financeira do Programa Aveiro Digital 2003–2006, na componente financiada pela Medida 2.3: Cidades e Regiões Digitais do Programa Operacional da Sociedade da Informação.

A conjugação das Medidas 1.1: Competências Básicas e da Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação sustentam a execução da Tarefa de Formação, mandatária e integrada nos Planos Técnicos e Financeiros dos 77 Projectos Aveiro Digital actualmente em curso.

Assim, este Relatório, que se reporta ao objecto central do Programa Aveiro Digital 2003–2006, só reflecte a dimensão integral do Programa quando complementado pelos Relatórios de Progresso Material e Financeiro – 2005 da Medida 1.1 – Competências Básicas e da Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação.

Este documento está subdividido em duas Secções contemplando as grandes áreas da Execução Material e da Execução Financeira.

Na Secção da Execução Material deste Relatório contempla-se:

- a) A descrição detalhada da execução da Área de Intervenção¹: Comunidade Digital porque inclui os 6 Projectos horizontais e de alavanca de todo o Programa, decisivos para a qualidade e eficiência da Gestão Técnica e Financeira de todo o Programa e para garantir a toda a população da AMRia o acesso aos Serviços Internet.
- b) Uma abordagem mais sintetizada das restantes 7 Áreas de Intervenção do Programa, acompanhada de uma breve apreciação do estado da Execução Material de cada Projecto que, mais detalhadamente, está sempre disponível no SAVAD.

Na Secção da Execução Financeira deste Relatório contempla-se:

- a) A descrição detalhada da metodologia de Gestão Financeira global, dos procedimentos adoptados e dos sistemas de acompanhamento e verificação operados complementada pelo quadro de Execução Financeira global da Medida 2.3.
- b) Uma abordagem mais sintetizada das 8 Áreas de Intervenção do Programa acompanhada dos quadros de Execução Financeira por rubrica. A análise mais

detalhada da Execução Financeira de cada Projecto está sempre disponível no SAVAD.

- c) A análise semestral dos fluxos financeiros POSI-CEAD e o Orçamento para o ano 2006.

Finalmente, o relatório termina com uma Análise Crítica e Conclusões, que inclui a apreciação da CEAD sobre o estado actual da Execução Material e Financeira desta Medida e também as suas perspectivas de execução para o ano 2006.

Faz parte integrante deste Relatório um DVD, contendo os seguintes Anexos:

- Anexo 01 – Protocolo de Adesão ao Projecto EIAD
- Anexo 02 – EIAD Freguesia – Equipamento
- Anexo 03 – EIAD Municipais – Equipamento
- Anexo 04 – EIAD Municipal, Ílhavo – Equipamento
- Anexo 05 – Área Militar de S.Jacinto – Adesão aos EIAD
- Anexo 06 – EIAD de Freguesia – Extensão Protocolo 2006
- Anexo 07 – EIAD de Freguesia – Solicitação de Horário
- Anexo 08 – Regulamento Prémio Melhor EIAD
- Anexo 09 – Reunião dos EIAD e Prémio Melhor EIAD
- Anexo 10 – Relatório da Iniciativa IRS na Internet – 2005
- Anexo 11 – Actas das Reuniões da CEAD – 2005
- Anexo 12 – Reuniões: Acompanhamento dos Projectos AD
- Anexo 13 – Apresentação AD nas CMs AMRia – Template
- Anexo 14 – Relatório: 2ª R. Concertação e 1ª Exposição AD
- Anexo 15 – Relatório: 2ªs Reuniões de Concertação por AI
- Anexo 16 – Relatório: 3ªs Reuniões de Concertação por AI
- Anexo 17 – Avaliação das Propostas para o SAE-PAD
- Anexo 18 – Comissão de Acompanhamento e Peritos
- Anexo 19 – Relatório da Fase I do SAE-PAD
- Anexo 20 – Brochura Aveiro Digital
- Anexo 21 – Cartazes Aveiro Digital
- Anexo 22 – Posters Aveiro Digital
- Anexo 23 – Tapetes de Rato Aveiro Digital
- Anexo 24 – Flyers “Diploma em CB em TIC”
- Anexo 25 – Tarjas e Pendões Aveiro Digital
- Anexo 26 – Placas Prémio Melhor EIAD
- Anexo 27 – Press Releases Aveiro Digital
- Anexo 28 – Notícias nos Órgãos de Comunicação Social
- Anexo 29 – Divulgação da iniciativa “IRS na Internet”
- Anexo 30 – Divulgação da iniciativa “Diploma em CBTIC”

- Anexo 31 – DVD, “Aveiro Digital...mais próximo de Si”
- Anexo 32 – Docs. “Aveiro Digital...mais próximo de Si”
- Anexo 33 – Divulgação no Portal CRDs – POSI
- Anexo 34 – Divulgação na Rede de Painéis Piar
- Anexo 35 – Campanha – Delta Cafés
- Anexo 36 – Apresentação na CIUMED, Valência, Out 2005
- Anexo 37 – Artigo na Revista Autárquica, nº2, 2005
- Anexo 38 – Artigo na Revista País Positivo, nº 4, 2005
- Anexo 39 – Artigo na Revista e.Ciência, nº 39, 2005
- Anexo 40 – Artigo no Jornal de Negócios, 2005
- Anexo 41 – Artigo no Jornal Expresso, 2005
- Anexo 42 – Contributo – J. Nascimento Rodrigues
- Anexo 43 – Estudos, Mestrados e Doutoramentos – PAD
- Anexo 44 – Pós-Graduação de Enói Natividade, FEP
- Anexo 45 – Pós-Graduação de Ana Oliveira, UC
- Anexo 46 – Estágio Curricular de Bruno Curto, ISCTE
- Anexo 47 – Case Study GEIAD: Gestão de EIAD, Edinfor
- Anexo 48 – Protocolo com Madeira Tecnopolo, S.A.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MATERIAL

ÁREA DE INTERVENÇÃO 1: CONSTRUIR A COMUNIDADE DIGITAL

Introdução

Esta Área de Intervenção é executada directamente pela CEAD e inclui os 6 Projectos horizontais e de alavanca de todo o Programa, decisivos para a qualidade e eficiência da Gestão Técnica e Financeira de todo o Programa e para garantir a toda a população da AMRia o acesso aos Serviços Internet.

Estão contemplados nesta AI os Projectos P1.1, P1.2 e P1.6 que contribuem para a promoção da igualdade de oportunidades e de acesso público e universal à informação, estimulando a formação generalizada e massiva da população para o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação.

No Projecto P1.3 enquadram-se os serviços de gestão e coordenação do Programa Aveiro Digital, baseados numa estrutura logística, técnica e humana com experiência, agilidade e qualidade, para as funções de gestão e controlo operacional, financeiro e administrativo de todos os Projectos.

Nos Projectos P1.4 e P1.5 enquadram-se as actividades associadas à regular comunicação pública ao longo das diferentes fases de execução do programa e dos seus resultados, de forma a garantir o estabelecimento de uma plataforma aberta e transparente que é a garantia do reforço e expansão da rede de confiança social.

A intervenção horizontal e estruturante desta área é fundamental, não só pelo impacto directo na criação de condições socio-culturais de adesão massiva dos cidadãos à Sociedade da Informação, mas também pelo impacto indirecto na avaliação, concertação e promoção dos serviços criados em todas as Áreas de Intervenção.

P 1.1 – Espaços Internet Aveiro Digital

O Projecto 1.1 – Espaços Internet Aveiro Digital (EIAD) representa um forte compromisso do Programa Aveiro Digital 2003–2006 na criação de instrumentos que permitam a toda a população da AMRia o acesso gratuito à Internet, em particular, e às TIC, em geral, apoiada por Monitores preparados para prestar apoio e acompanhamento.

Esta rede de 91 EIAD, é gerida de forma integrada, pela CEAD em parceria com as Autarquias, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia e conta com o apoio dos Interlocutores Municipais.

Tendo em conta o orçamento disponível, a dimensão dos objectivos para a Região da AMRia e a importância da sustentabilidade destes Espaços Internet, a CEAD aprovou, na reunião de 28-01-04, o plano de execução para este projecto, bem como o protocolo de adesão ao Projecto EIAD, Anexo 01, baseado num formato que contempla a partilha de responsabilidades e das despesas de exploração com as Câmaras Municipais e com as Juntas de Freguesia, que foram convidadas a aderir a este formato.

No âmbito deste plano, os Espaços Internet Municipais que funcionam 40h por semana, foram equipados com 10 Computadores, uma impressora, um scanner e um hub/switch de 16 portas e a sua operação é assegurada por dois monitores, enquanto que os novos Espaços Internet nas Juntas de Freguesia que funcionam 20h por semana, foram equipados com 4 Computadores, uma impressora, um scanner e um hub/switch de 8 portas e a sua operação é assegurada por apenas um monitor.

São da responsabilidade das Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia as despesas de acesso à Internet e de manutenção dos equipamentos, assumindo a CEAD as despesas de investimento nos novos Espaços Internet e as despesas mensais com monitoria (250€) e consumíveis (25€), inicialmente durante dois anos, agora até ao final de 2006.

Assim, se no início de 2004 estavam em funcionamento 11 EIAD, no início de 2005 estavam prontos para operação 79 EIAD de Freguesia e 11 EI Municipais.

Durante o ano de 2005 aderiu ao P.1.1 o EIAD da Área Militar de São Jacinto, o que totaliza no final de 2005, 91 EIAD.

Instalação e Harmonização dos Serviços

Infra-estruturas

No início de 2005 a rede de EI tinha em operação 79 Espaços Internet em Freguesias e 11 Espaços Internet Municipais.

Tendo em conta a racionalização dos recursos disponíveis, a CEAD decidiu avaliar a qualidade dos equipamentos dos EI de Freguesia do Município de Aveiro que estavam em operação desde 1999 e os EI Municipais que já estavam em funcionamento desde 2001, para garantir a máxima eficiência de serviço na rede de EIAD.

Redistribuição de equipamento nos EIAD do Município de Aveiro

Conforme decisão da CEAD, um técnico do GAD deslocou-se, em Fevereiro, aos EIAD de Freguesia do Município de Aveiro, com o objectivo de averiguar as condições de funcionamento do equipamento instalado nestes EIAD.

Paralelamente foi efectuado o levantamento do número de horas mensais de funcionamento dos EIAD e a respectiva média mensal de utilizadores e utilizações, durante o ano 2005.

Considerando toda a informação recolhida e o tempo de uso do equipamento foi decidido actualizar o equipamento dos EIAD de Freguesia do Município de Aveiro, conforme se evidencia na tabela seguinte.

EIAD	Equipamento				
	PC's	Monitores	Impressora	Scanner	UPS
Eixo	2	2	0	1	1
Santa Joana	2	2	0	1	1
Oliveirinha	2	2	1	1	1
Cacia	2	2	1	0	1
São Bernardo	2	2	1	1	1
Aradas	3	3	1	1	1
Requeixo	2	2	1	1	1
Glória	2	2	0	1	1
Esgueira	3	3	1	1	1
N. S ^a de Fátima	2	2	1	1	1
São Jacinto	1	1	0	0	0
Total	23	23	7	9	10

Para operacionalizar o processo de entrega do equipamento foi enviado a cada Junta de Freguesia um ofício, Anexo 02, comunicando o equipamento disponibilizado pela CEAD e estabelecendo um prazo para o seu levantamento no GAD. Posteriormente o técnico do GAD responsável deslocou-se ao EI e procedeu à instalação e configuração de todos os equipamentos.

Redistribuição de equipamento nos EI Municipais

Aquando da deslocação aos EIAD Municipais do técnico do GAD responsável foram averiguadas as condições de funcionamento do equipamento instalado nestes EI.

Com o objectivo de atingir 10 computadores efectivos por EI e considerando as condições técnicas dos equipamentos existentes, a CEAD decidiu proceder à actualização do equipamento computadores, monitores e impressoras, dos EIAD Municipais, nas quantidades evidenciadas na tabela seguinte.

EIAD	Equipamento		
	PC's	Monitores	Impressora
Aveiro	0	0	0
Albergaria-a-Velha	3	3	0
Águeda	0	0	0
Estarreja	2	2	0
Ílhavo	5	5	1
Mira	2	2	1
Murtosa	1	1	0
Ovar	4	4	0
Oliveira do Bairro	2	2	0
Sever do Vouga	2	2	0
Vagos	1	1	0
Total	22	22	2

Para operacionalizar o processo de entrega do equipamento foi enviado a cada Câmara Municipal um ofício, Anexo 03, comunicando o equipamento disponibilizado pela CEAD e estabelecendo o prazo para ser levantado no GAD.

Os equipamentos saíram já com todo o software instalado, prontos a utilizar.

Redistribuição de equipamento EIAD Municipal de Ílhavo

O EI Municipal de Ílhavo é da rede dos 11 EI Municipais o mas antigo, por isso também o seu equipamento é o que se encontra em pior estado, assim coincidindo também com uma mudança de espaço, a Câmara Municipal de Ílhavo solicitou à CEAD a actualização do equipamento do seu EI, Anexo 04.

A CEAD, considerando que os dados de Operação deste Espaço Internet Municipal, extraídos do sistema GEIAD, mostravam uma grande dinâmica e considerando o estado de obsolescência operacional dos Equipamentos em operação desde 2001, atestado pelo técnico do GAD responsável, decidiu proceder à actualização dos equipamentos do EIAD Municipal de Ílhavo, conforme tabela seguinte.

EIAD	Equipamento	
	PC's	Monitores
Ílhavo	6	6

Instalação do EIAD da Área Militar de São Jacinto

Foi proposto à CEAD pelo Comando da Área Militar de São Jacinto a instalação de um EIAD, nas instalações da Área Militar, com a tipologia e no formato dos EI de Freguesia, no entanto sem custos com a monitoria. A proposta apresentada, Anexo 05, que enquadra e justifica a utilidade deste EIAD, foi aceite pela CEAD.

Assim o EIAD da Área Militar de São Jacinto foi instalado com 4 Computadores, uma Impressora e um scanner e iniciou a sua operação em Maio de 2005.

Equipamento em operação em 2005

A tabela seguinte evidencia o número e a tipologia de equipamentos actualmente em operação na rede de Espaços Internet Aveiro Digital, instalada na Região da AMRia:

Equipamento em operação				
	Nº EIAD	Nº PC's	Nº Impressoras	Nº Scanner's
Freguesias + Área Militar	80	369	80	80
Municípios	11	115	11	11
Total	91	484	91	91

Gestão e estatísticas

O registo dos utilizadores nos EIAD foi feito até Abril de 2005 pelos Monitores numa folha de cálculo, com evidentes problemas de fiabilidade e de rigor.

Cedo foi detectada a necessidade de encontrar um formato de registo e gestão da utilização dos EIAD que garantisse a fiabilidade e a credibilidade destes processos. O processo de identificação dos produtos existentes no mercado com interesse foi complexo e foi necessário um desenvolvimento adicional do produto seleccionado.

Instalação e configuração do GEIAD

Concluído o processo de desenvolvimento da aplicação, o técnico responsável do GAD deslocou-se a todos o EIAD e procedeu à instalação do Sistema de Gestão de Espaços Internet Aveiro Digital, GEIAD.

Antes desta instalação que decorreu de 05 de Abril a 09 de Maio, realizou-se no GAD uma reunião com todos os monitores Aveiro Digital, onde um dos pontos da ordem de trabalhos foi o GEIAD. Foi evidenciado o processo de instalação e explicado o funcionamento do GEIAD, gestão de utilizadores, de terminais de mensagens, e foram distribuídas as passwords de acesso à aplicação.

Operação Regular dos Espaços Internet Aveiro Digital

A operação regular dos EIAD é da responsabilidade dos Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia, que para o efeito contratam Monitores com o adequado perfil.

Compete ao GAD e aos Interlocutores Municipais acompanhar esta operação de modo a garantir que são cumpridos os horários de funcionamento comprometidos e é dado o necessário apoio aos utilizadores.

A verificação do funcionamento é feita com regularidade através do GEIAD, de onde se extraem todos os dados estatísticos.

Extensão do Protocolo de Adesão ao P 1.1

No âmbito do Programa Aveiro Digital, estão em operação 79 EIAD nas Freguesias da AMRia, ao abrigo do protocolo formalizado com as Freguesias estava previsto o financiamento da operação regular destes EI pelo período de 2 anos.

Considerando que a adesão foi repartida em 3 fases durante o ano de 2004, o que implica datas de fim do protocolo diferentes e tendo em conta a importância de harmonizar a operação dos EIAD de freguesia e destes com os Municipais, mantendo assim a rede completa, a CEAD, decidiu prolongar, até 31 de Dezembro, as condições de financiamento da operação dos Espaços Internet Aveiro Digital de Freguesia. Foi enviado um ofício às Juntas de Freguesia, Anexo 06, comunicando esta decisão com a respectiva adenda ao protocolo para ser assinada e devolvida ao GAD.

Pedido de Horário aos EIAD – Avaliação da Operação

O protocolo de adesão ao P 1.1, Anexo 01, refere no ponto 4 que “a operação regular dos Espaços Internet, será assegurada pelo Programa Aveiro Digital 2003–2006 nas seguintes condições:

- Despesas de Monitoria no montante máximo de 250€ mensais, não acumuláveis.
- Despesas Correntes de operação no montante máximo de 25€ mensais, acumuláveis trimestralmente.”

Os serviços de Monitoria devem assegurar “a operação regular dos EI, entendida na base mínima de 20 horas de funcionamento, de Segunda a Sábado a partir das 17h.”


Assim a CEAD decidiu solicitar a cada Junta de Freguesia a indicação formal do horário de funcionamento praticado no respectivo EIAD, tendo sido enviado um ofício, Anexo 07, com essa solicitação e com um modelo de fax, que devia ser preenchido e remetido à Comissão Executiva Aveiro Digital.

Estatísticas da Utilização dos Espaços Internet Aveiro Digital

Apresentam-se em seguida os resultados da frequência dos utilizadores e das utilizações dos EIAD no período de Janeiro a Dezembro de 2005.


O número total de utilizadores dos EIAD no ano de 2005, foi de 68.007, sendo este resultado obtido, até Abril com base no registo mensal produzido pelos Monitores dos EIAD e de Abril a Dezembro os dados foram retirados do Sistema de Gestão dos Espaços Internet Aveiro Digital, GEIAD.

Gráfico 1 - Número de utilizadores dos EIAD/Mês - 2005

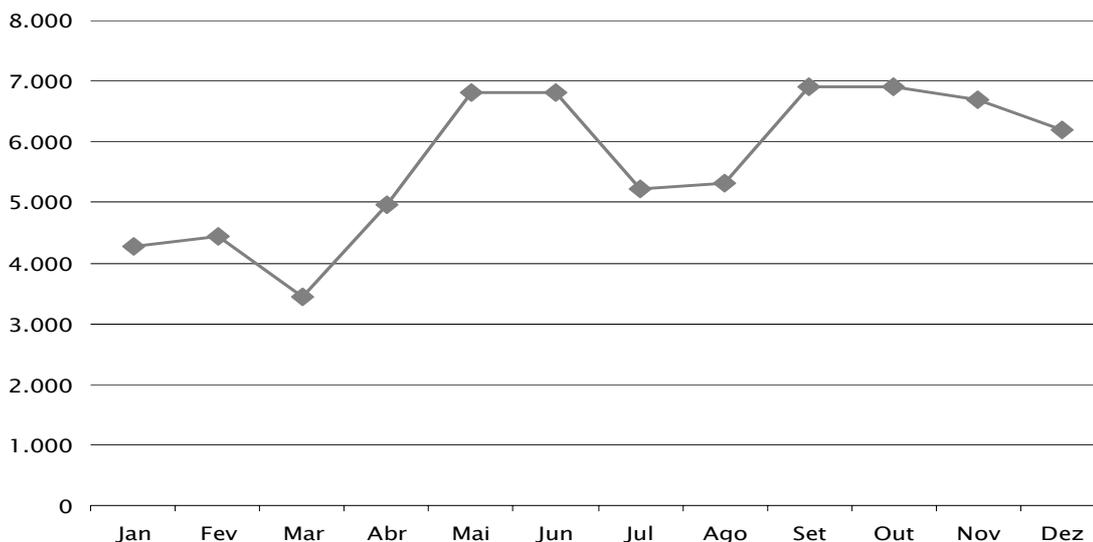


A distribuição destes utilizadores por faixa etária, é evidenciada nos gráficos seguintes:

Gráficos 2 e 3 - Distribuição dos utilizadores por faixa etária

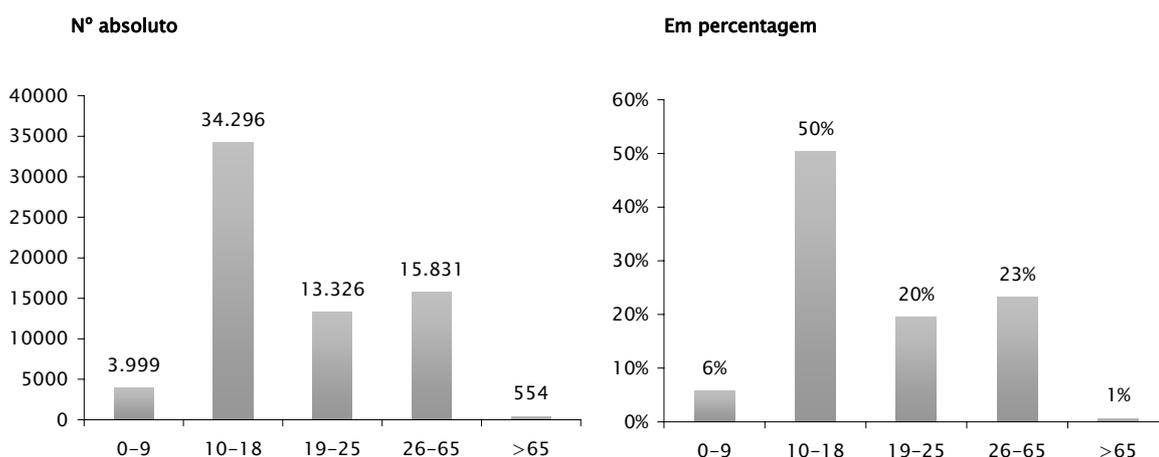


A ocupação dos utilizadores, obtida com base em valores anuais, pode ser visualizada nos gráficos seguintes.

Gráficos 4 e 5 - Ocupação dos Utilizadores

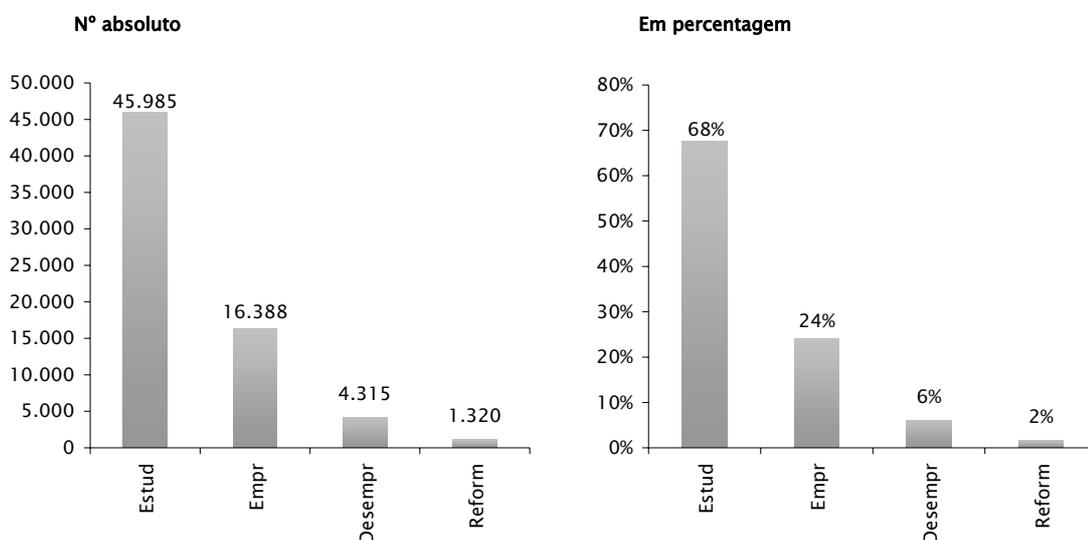

O número total de utilizações dos EIAD no ano de 2005 foi de 594.812, numa média de 49.568 utilizações por mês. A distribuição destas utilizações ao longo dos meses de 2005, pode ser visualizada no gráfico seguinte.


Gráfico 6 - Número de utilizações nos EIAD/Mês - 05

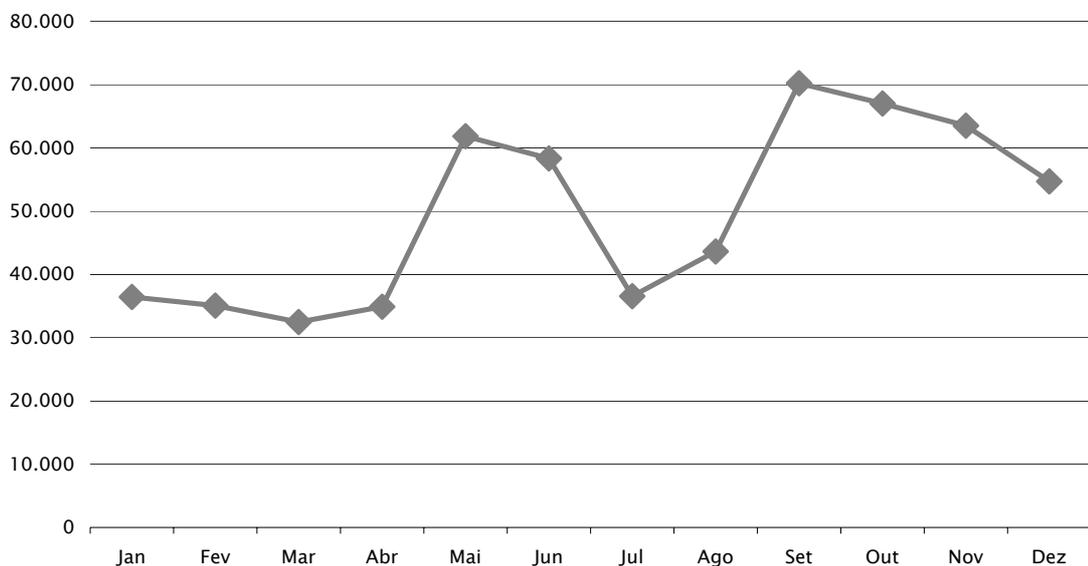

Como se pode verificar pela análise do gráfico anterior, existe um aumento significativo das utilizações em Abril e Maio devido ao início de operação do GEIAD e entrada para esta contabilização dos restantes EI Municipais. A quebra em Agosto é normal, pois o


mês de férias é sempre mais fraco em termos de utilização dos EI, por outro lado a quebra de Julho deveu-se a problemas técnicos com a aplicação, que foram resolvidos e a aplicação estabilizada. O aumento em Abril fica a dever-se ao início de operação do GEIAD e entrada para esta contabilização dos restantes EI Municipais. Analisando o gráfico 7 verificamos que existe um aumento em Janeiro relativamente ao ano anterior que é devido principalmente à entrada em operação dos EIAD da 3ª fase.

Gráfico 7 - Evolução das utilizações dos EIAD

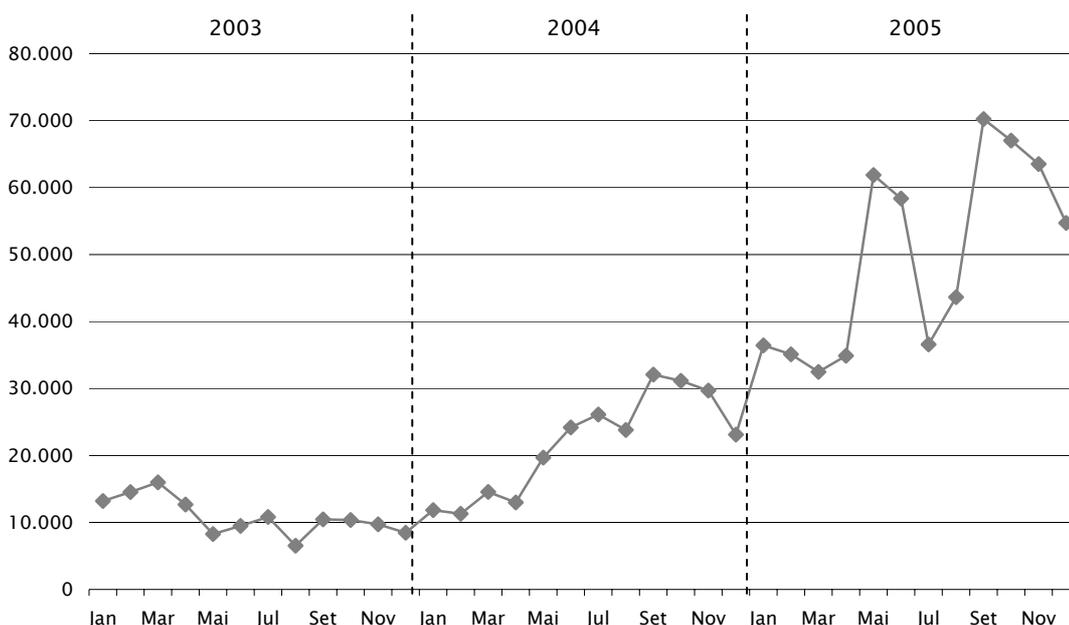


De referir, que estas utilizações são, na sua grande maioria, dedicadas à realização de trabalho pessoal/profissional, 93%, como é evidenciado nos gráficos seguintes. Para melhor compreensão esclarece-se que a utilização da Internet e/ou do MSN são entendidas como utilizações do tipo Pessoal/Profissional.

Gráficos 8 e 9 - Utilizações por tipo de utilização

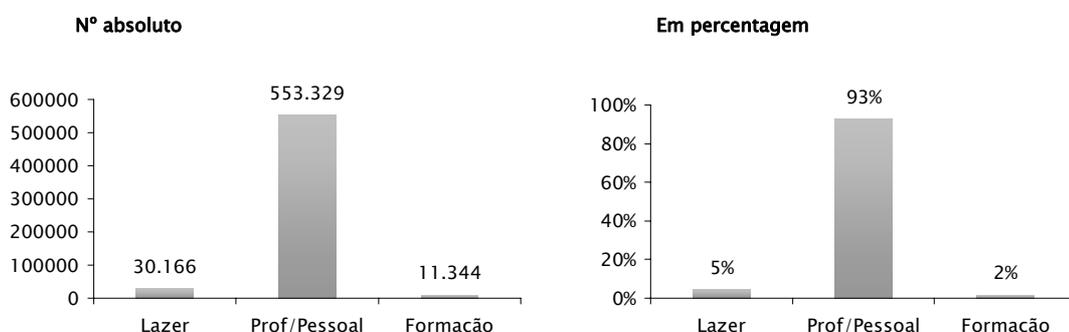

No gráfico seguinte, podem ser visualizadas as ferramentas/aplicações mais usadas pelos utilizadores dos Espaços Internet Aveiro Digital.

Gráficos 10 e 11 – Utilizações por Serviços e Aplicações

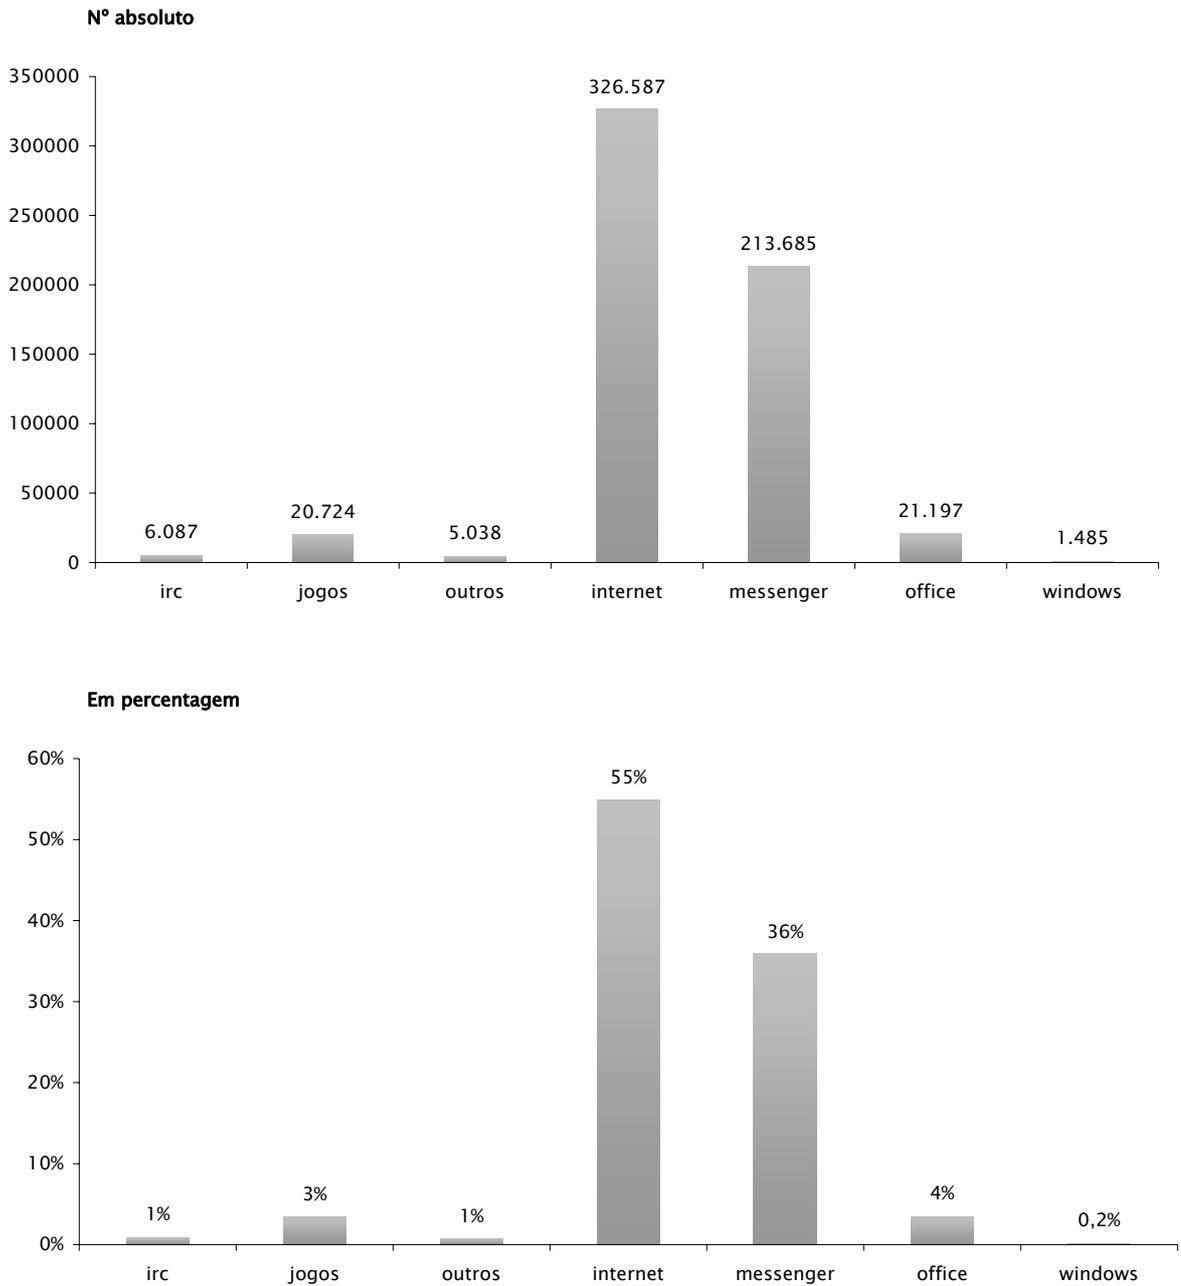

Iniciativas

Durante o ano de 2005 foram realizadas algumas iniciativas, reuniões e/ou encontros. São apresentadas de seguida as iniciativas mais relevantes realizadas no âmbito do projecto P 1.1 EIAD.

1ª Reunião de Monitores dos EIAD

A Convite da Comissão Executiva Aveiro Digital realizou-se no dia 31 de Março, pelas 14:30H na sede do Programa Aveiro Digital 2003–2006, no Parque de Exposições de Aveiro uma reunião com os Monitores dos EIAD.

Nesta Reunião, foi apresentado o software Guardian para a Gestão dos EIAD, GEIAD e demonstrando-se a sua instalação e o seu funcionamento e foi apresentado ainda o plano de instalação.

No sentido de otimizar a comunicação entre os Monitores dos EIAD e o GAD foram criados email para todos os EI e uma Mailing list, cujos endereços e respectivas passwords foram distribuídas aos Monitores nesta reunião.

Nesta Reunião, foram ainda tratados assuntos relacionados com a operação regular dos EIAD e esclarecidas todos os tipos de dúvidas.

Prémios melhor Espaço Internet AD – 1º Semestre

Com o objectivo distinguir o Espaço Internet com melhores serviços úteis aos cidadãos do seu Município ou Freguesia, a CEAD decidiu atribuir o prémio ao melhor EIAD da AMRia.

Este prémio será atribuído semestralmente aos EIAD Municipais e trimestralmente aos EIAD de Freguesia e é constituído por 2 Computadores, um Hot-Spot e uma Marca Distintiva e por 1 Computador e uma Marca Distintiva respectivamente. Os regulamentos de candidatura e atribuição, deste prémio constituem o Anexo 08.

Foi ainda decidido que estes prémios deveriam ser entregues semestralmente em cerimónia pública.

Assim no dia 3 de Julho realizou-se a 1ª entrega de prémios aos melhores EIAD 1º semestre de 2005. O prémio de melhor EIAD de Freguesia 1º Trimestre foi atribuído ao EIAD de Silva Escura, o 2º trimestre foi para o EIAD de Esmoriz, e o prémio de melhor EIAD Municipal 1º Semestre foi para o EIAD de Albergaria-a-Velha.

Nesta reunião para além da atribuição dos prémios aos EIAD foi apresentado o estado de execução do projecto EIAD e alguns dados estatísticos referentes à utilização dos EI,

Anexo 09, e foi entregue um pacote de material promocional a todos os EIAD, contendo tapetes de rato, t-shirt's, bonés, brochuras “ensina o teu computador”, tarjas e cartazes.

Iniciativas Horizontais

O Projecto Espaços Internet Aveiro Digital prevê no seu Plano Técnico e Financeiro a realização de um conjunto de Iniciativas Horizontais.

Estas Iniciativas Horizontais têm como objectivo estimular a utilização de serviços disponíveis na Internet, com evidente utilidade para os cidadãos, promovendo uma metodologia comum de operação dos 11 Espaços Internet Municipais, focada na utilidade dos serviços e nos segmentos da população com maiores problemas de inclusão.

IRS na Internet 2005

Durante o ano de 2005 realizou-se apenas a iniciativa IRS na Internet, pois foi dada prioridade à instalação do GEIAD e consolidação da Rede de EIAD.


Esta iniciativa foi desenvolvida em colaboração com as Direcções Distritais de Finanças de Aveiro e Coimbra e as Câmaras Municipais de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos e decorreu de 23-02-05 a 30-05-05.

Foi uma Iniciativa claramente oportuna e útil aos contribuintes de toda a região da AMRia, o que transparece na adesão que teve na maioria dos EIAD, conforme se pode verificar pela análise dos números apresentados na tabela seguinte:

Tabela Resumo da Iniciativa IRS na Internet (Totais de Aderentes por Município)	
Adesão por Município	Nº de Aderentes à iniciativa
Águeda	0
Albergaria	37
Aveiro	52
Estarreja	16
Ílhavo	13
Mira	2
Murtosa	0
Oliveira do Bairro	0
Ovar	0
Sever	55
Vagos	0
Total	175

Para uma ideia mais clara os mesmos números são apresentados sobre a forma gráfica:

Gráfico 12 – Adesão à iniciativa IRS na Internet (por Município)

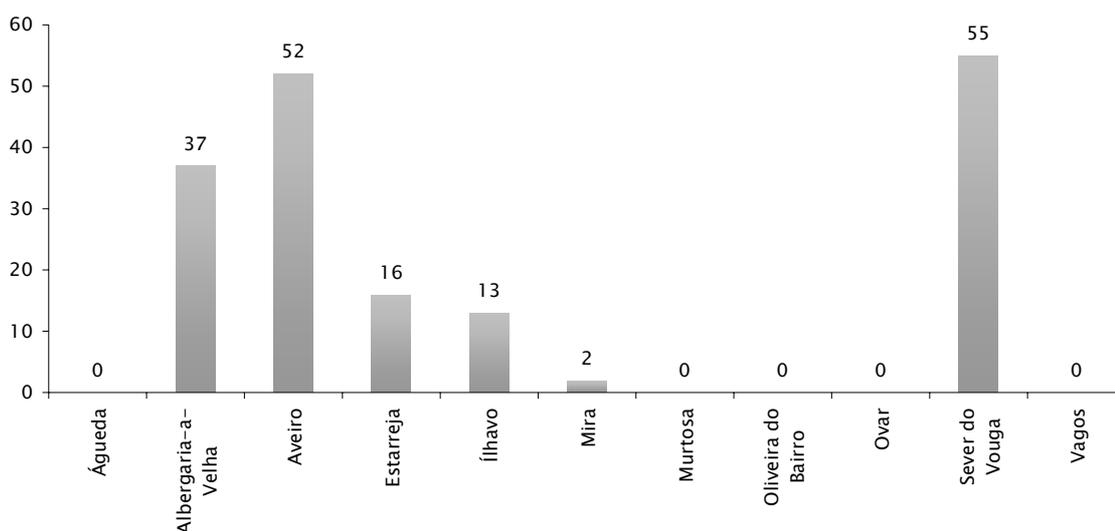

Para um conhecimento mais profundo desta iniciativa, pode ser consultado o Relatório da Iniciativa IRS na Internet 2005, Anexo 10.

Iniciativas Horizontais 2006

As Iniciativas Horizontais planeadas para 2005 serão estruturadas seguindo o modelo de outras iniciativas realizadas anteriormente, com base no formato definido no Documento “Notas de uma aprendizagem...Pequena contribuição para a iniciativa Espaços Internet” publicado em Março de 2001 pelo Programa Aveiro Digital. Entre estas iniciativas, contam-se, por exemplo, a “Internet para as Mulheres” ou “Preparar o futuro para lá dos 50”.

Estas Iniciativas Horizontais são organizadas com base na articulação com entidades locais e regionais com experiência nos sectores específicos a dinamizar ou nos serviços a promover e envolvem grandes recursos de divulgação nos OCS e na rede global dos Espaços Internet.

A metodologia para a organização das Iniciativas Horizontais obedece a um modelo comum, caracterizado pelas seguintes fases:

- Identificação e convite à(s) Entidade(s) apropriada(s) para a organização conjunta da Iniciativa Horizontal;

- Identificação das necessidades específicas do público alvo e dos serviços disponíveis na Internet úteis às suas necessidades;
- Sistematização de uma lista de sítios web, contendo uma descrição sumária dos serviços oferecidos e com interesse directo para o público alvo;
- Aplicação à população alvo do guia de formação básica “Ensina o teu Computador”
- Promoção de debates on-line, moderados por pessoas de reconhecida competência nas áreas de interesse do público alvo;
- Implementação sincronizada baseada nos 11 Espaços Internet Municipais, de forma a assegurar a harmonização de processos e o impacto alargado a toda a Região da AMRia.

Todos os materiais produzidos ao longo de cada Iniciativa Horizontal integram áreas específicas do site www.aveiro-digital.pt para garantir a continuidade da sua utilidade para a população.

Assim, tendo em conta a importância destas iniciativas na qualificação da população em geral e de sectores da população em particular, e considerando que durante o ano de 2005 se consolidou a rede de EI, nomeadamente com a instalação da aplicação GEIAD, foi elaborado e aprovado na 24ª reunião da CEAD, em 15-12-05, o plano macro de Iniciativas Horizontais para 2006, apresentado na tabela seguinte.

Iniciativa – Designação	Mês	Entidades Envolvidas
"IRS na Internet"	Fev–Abr 2006	CEAD, CM da AMRia, DDF de Aveiro e Coimbra
"Procura Emprego? O Rato ajuda..."	Mai 2006	CEAD, CM da AMRia, JF da AMRia, IEPF
"Admin. Pública na Internet"	Mai–Jun 2006	CEAD, CM da AMRia, JF da AMRia, Loja do Cidadão
"Conta Bancária na Internet"	Jun–Jul 2006	CEAD, CM da AMRia, Instituições Bancárias
"A Internet para as Mulheres"	Set–Out 2006	CEAD, CM da AMRia, JF da AMRia
"A Internet para os +Velhos"	Out–Nov 2006	CEAD, CM da AMRia, JF da AMRia, IPSS

Adicionalmente, o Projecto P1.6 – Certificação em Competências Básicas nas TIC, vai mobilizar os 11 Espaços Internet Municipais e alguns Espaços Internet de Freguesia com condições adequadas, para o plano global de execução de 20.000 CCBTic na Região da AMRia, como uma iniciativa horizontal mobilizadora destes recursos localizados em toda a Região e próximos da população.

Análise crítica e conclusões

A rede de EIAD no final de 2005 é constituída por 79 EIAD nas Freguesias da AMRia, 1 EIAD na Área Militar de São Jacinto e 11 EIAD nas sedes de Município. Durante o ano 2005 atingiram-se mais de 594.812 utilizações em 234.877 horas de operação efectiva dos terminais, repartidas por 68.007 Utilizadores.

Considerando a dimensão geográfica do Projecto EIAD o ano 2005 foi um exercício muito positivo de conjugação e articulação de vontades, da CEAD, das Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia, o que permitiu, consolidar a rede de EIAD e sistematizar procedimentos, em toda a região da AMRia, e assim criar uma vasta rede de equipamentos oferecendo à população acesso gratuito à Internet e aos serviços que esta oferece.

Considerando a importância das Iniciativas Horizontais para a qualificação da população em geral e o seu contributo no combate à info exclusão de vários sectores, a sua realização assumirá um papel fundamental nas actividades de 2006.

Assim, prevê-se que as Iniciativas Horizontais planeadas com os Espaços Internet mobilizem sincronizadamente em toda a região da AMRia, segmentos da população específicos como os idosos, as mulheres e os imigrantes para a utilização dos serviços na Internet. Adicionalmente e para promover e divulgar os serviços úteis à generalidade dos cidadãos, as Iniciativas Horizontais nos Espaços Internet, vão também permitir o treino nas aplicações da Administração Pública Local e Central, da Banca on line e da Administração Fiscal.

P 1.2 – Serviços Básicos Aveiro Digital

Este Projecto tem como objectivo facilitar o acesso a serviços Internet de forma livre, gratuita e fiável ao público em geral, às famílias, aos utilizadores dos Espaços Internet Aveiro Digital, às escolas e às associações culturais, recreativas e sociais.

Pretende-se por um lado disponibilizar à população da Região da AMRia toda a informação relevante no âmbito do Programa Aveiro Digital através do site www.aveiro-digital.pt e por outro, facilitar o uso das TIC, através dos serviços de correio electrónico e de páginas pessoais, www.aveiro-digital.net, estimulando-se assim a massificação e uso das TIC consideradas fundamentais para a qualificação generalizada da população da Região.

As principais actividades realizadas em 2005, no âmbito deste Projecto, foram:

Serviços .PT


Através do site www.aveiro-digital.pt foi garantida, em 2005, a divulgação e apresentação das actividades desenvolvidas no âmbito do Programa Aveiro Digital, destacando-se o suporte às várias iniciativas, promovendo a regular comunicação com a população da Região da AMRia. Assim, no caso concreto dos Projectos de execução directa pela CEAD, foi garantido o seguinte:

EIAD – Espaços Internet Aveiro Digital

Foi divulgada e mantida actualizada toda a informação sobre os Espaços Internet Aveiro Digital da região da AMRia. Foi disponibilizado um acesso directo ao GEIAD – Sistema de Gestão dos Espaços Internet Aveiro Digital através da página na Internet www.aveiro-diigtal.pt.



Site www.aveiro-digital.pt – Acesso ao GEIAD

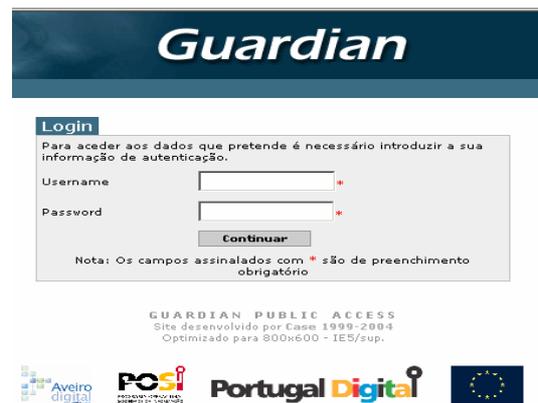

GEIAD – Página de Acesso

Programa Aveiro Digital	Quarta-feira , 8 de Fevereiro de 2006	www.aveiro-digital.pt
-------------------------	---------------------------------------	-----------------------

		Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital	 <small>PROGRAMA OPERACIONAL SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO</small>	 <small>UNÃO EUROPEIA FEDER/FSE</small>
---	---	---	--	---

<ul style="list-style-type: none"> Apresentação Projectos Serviços Documentação Outros Destinos Contactos <div style="text-align: center;">  </div> <p>Atalhos de acesso ao menú: ALT + Letra sublinhada</p> <p>Visitantes: 2826298</p>	[Início]
---	----------------------------

Espaços Internet Aveiro Digital :: Município de Mira		
Espaço Internet Aveiro Digital de Mira		
Morada:	Biblioteca Municipal de Mira 3070 Mira	Horário: Segunda: 13:30h -19:30h Terça a Quinta: 9:30h-19:30h Sexta: 9:30h-19:00h Sábado: 9:30h-13:00h
Tel:	231480550	Fax:
Email:		Url
Monitor:		Foto: Ver Interior >> Ver Exterior >>
Espaço Internet Aveiro Digital da Freguesia de Mira		
Morada:	Largo do Cruzeiro 3070-232 Lentisqueira	Horário: Segunda a Sexta: 17:00h - 20:30h Sábado: 10:00h - 13:00h
Tel:	231451252	Fax: 231451213
Email:		Url
Monitor:	Marcio Cravo	Foto:
Espaço Internet Aveiro Digital da Freguesia de Praia de Mira		
Morada:	Rua da Praia de Mira 3070 Praia de Mira	Horário: Segunda a Sábado: 16:30h - 20:00h
Tel:		Fax: 231472796
Email:		Url
Monitor:	Sara Milheirão	Foto:
Espaço Internet Aveiro Digital da Freguesia do Seixo		
Morada:	Rua dos Libórios 3070 - 536 Seixo	Horário: Terça ,Quinta e Sexta: 18:00h - 22:00h Sábado: 14:00h - 22:00h
Tel:	231452436	Fax: 231452436
Email:		Url
Monitor:	Albano Lourenço	Foto:

EIAD – Informações

GCAD – Gestão e Coordenação do Programa Aveiro Digital

No sentido de racionalizar os meios para a comunicação com os grupos de entidades mais relevantes no âmbito do Programa Aveiro Digital, foram mantidas e actualizadas regularmente um conjunto de listas de correio electrónico:

- CEAD@aveiro-digital.pt: Comissão Executiva Aveiro Digital;
- Gad@aveiro-digital.pt: Gabinete Aveiro Digital;
- Interlocutores@aveiro-digital.pt: Interlocutores Aveiro Digital;
- EBC@aveiro-digital.pt: Entidades Beneficiárias Credenciadas Aveiro Digital;
- EBP@aveiro-digital.pt: EBPs – Entidades Beneficiárias Principais dos 72 Projectos Aveiro Digital;

- EBP1@aveiro-digital.pt: EBPs dos Projectos AD Aprovados no âmbito do 1º Concurso;
- EBP2@aveiro-digital.pt: EBPs dos Projectos AD Aprovados no âmbito do 2º Concurso;
- AI2 a AI8@aveiro-digital.pt: EBPs dos Projectos AD nas várias Áreas de Intervenção;
- OCS@aveiro-digital.pt: Órgãos de Comunicação Social.

Foram também criadas novas listas de correio electrónico:

- cap@aveiro-digital.pt: Comissão de Acompanhamento e de Peritos;
- eiad@aveiro-digital.pt: Espaços Internet Aveiro Digital (EIAD's de freguesia e EIAD's municipais);
- eiadfreguesias@aveiro-digital.pt : Espaços Internet de Freguesia;
- eiadmunicipais@aveiro-digital.pt: Espaços Internet Municipais;

Foi melhorado o serviço de chat moderado, baseado num servidor de irc, que é utilizado em www.aveiro-digital.pt, na secção de debates por Áreas de intervenção do Programa Aveiro Digital.

Programa Aveiro Digital Terça-feira, 7 de Fevereiro de 2006 www.aveiro-digital.pt

Aveiro digital 2003-2006

Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

POSI PROGRAMA OPERACIONAL SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO UNÃO EUROPEIA FEDER / FSE Portugal Digital

[Início]

Debates :

Acesso às Salas de Debate Aveiro Digital

Introduza um nome (ex. Pedro; Pedro Santos):

AI 8 - Informação, Cultura e Lazer Entrar

<< Anterior

Atalhos de acesso ao menú: ALT + Letra sublinhada

Visitantes: 2816621

Serviço de chat com moderação

Através da página na Internet www.aveiro-digital.pt é disponibilizado um acesso directo ao SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital.



Site www.aveiro-digital.pt – Acesso ao SAVAD




SAVAD – Página de Acesso

MARKAD – Marketing e Promoção para Ganhar Massificação:

Foram publicados eventos, acontecimentos, notícias e iniciativas do Programa Aveiro Digital e dos 77 Projectos em execução.

APAD – Aprender e Partilhar Aveiro Digital:

Publicaram-se os materiais produzidos, nomeadamente os PowerPoint's e também os documentos relevantes produzidos pelo MCTES, POSI e UMIC para as Cidades e Regiões Digitais. O *site* do Programa Aveiro Digital registou, em 2005, uma média de 73 mil acessos por mês. Salienta-se que um número significativo de acessos ao SAVAD – Sistema de Apoio e Verificação Aveiro Digital é feito através do endereço www.aveiro-digital.pt, embora este Sistema tenha um acesso independente através do endereço www.aveiro-digital.pt/savad.

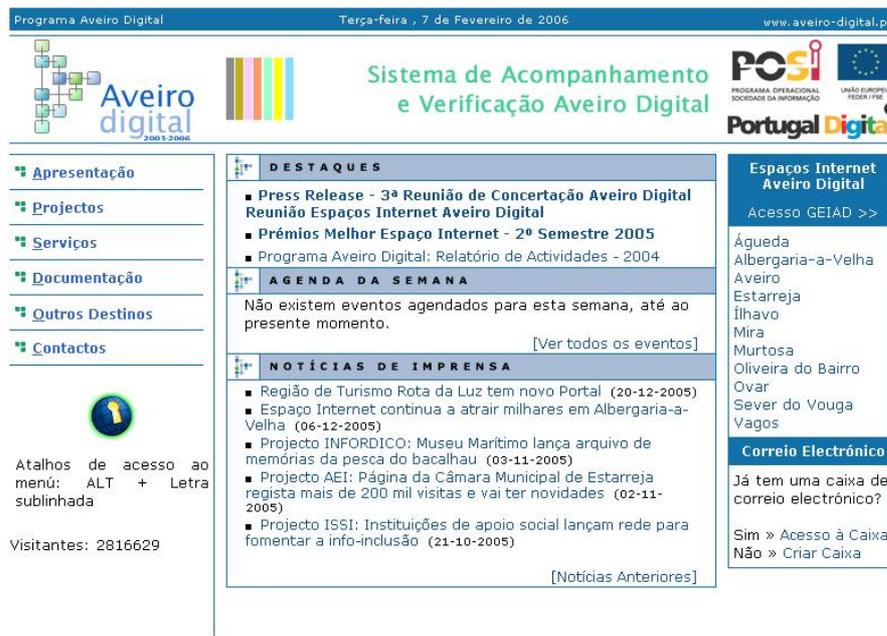

Site www.aveiro-digital.pt

Serviços.NET

Os serviços oferecidos gratuitamente em aveiro-digital.net são fundamentais para estimular a aprendizagem e utilização regular das TIC e dos serviços Internet. São oferecidos serviços de páginas pessoais e de correio electrónico com a extensão [@aveiro-digital.net](mailto:aveiro-digital.net). O serviço de chat com moderação é usado para debates específicos por iniciativa concreta como por exemplo as Iniciativas Horizontais planeadas para os Espaços Internet e também por Área de Intervenção do Programa.

O serviço de páginas pessoais permite o alojamento com um tamanho máximo de 10 MB, por utilizador. O serviço de e-mail tem a mais valia de ser uma ferramenta útil na operação dos Espaços Internet Aveiro Digital, possibilitando a criação de contas de correio electrónico com 10 MB para cada utilizador.

Serviço de páginas pessoais

Para garantir a utilização massiva destes serviços e a correcção atempada dos problemas, foi feita a sua sistemática monitorização, tendo sido ainda disponibilizado um help-desk que respondeu em tempo útil e caso a caso, às dúvidas dos utilizadores, nomeadamente sobre a configuração dos serviços.

Serviço de correio electrónico

Foi ainda disponibilizada uma área de suporte aos utilizadores em www.aveiro-digital.net, onde se encontram manuais de apoio à configuração dos serviços de correio electrónico e de páginas pessoais.

Em Dezembro de 2005, estavam alojadas nos serviços www.aveiro-digital.net 491 páginas pessoais e 7968 caixas de correio electrónico com utilização regular, que traduz um aumento de 847 caixas de correio electrónico em relação a 2004.

P 1.3 – Gestão e Coordenação do Programa Aveiro Digital


O Projecto 1.3 – Gestão e Coordenação do Programa Aveiro Digital, tem como objectivo a gestão e coordenação do Programa Aveiro Digital 2003–2006.

Compete à Comissão Executiva Aveiro Digital, constituída com base num protocolo entre a Associação de Municípios da Ria e a Associação Aveiro Digital, a direcção e gestão do Programa Aveiro Digital 2003–2006, bem como a promoção das actividades de concertação e avaliação.

A CEAD é apoiada pelo Gabinete Aveiro Digital com uma estrutura logística, técnica e humana adequada à execução das decisões de gestão, nomeadamente para o acompanhamento e verificação da execução dos 71 Projectos verticais enquadrados nas Áreas de Intervenção, para a execução das iniciativas de concertação e avaliação e à execução dos Projectos incluídos na Área de Intervenção 1: Comunidade Digital.

A CEAD reúne periodicamente e extraordinariamente quando necessário, sendo produzidas Actas e Agendas de todas as Reuniões. Em 2005 realizaram-se 6 Reuniões da CEAD. (Anexo 11)

Foi adoptada uma arquitectura funcional que representa a intervenção da CEAD na execução global do Programa:

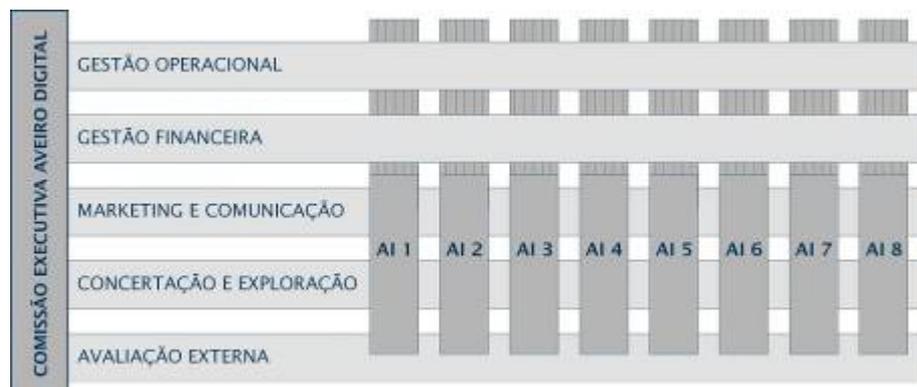

As principais actividades realizadas em 2005, no âmbito deste Projecto, foram as seguintes:

Gabinete Aveiro Digital

Tendo em conta as funções técnicas de gestão operacional e financeira necessárias ao Programa Aveiro Digital 2003–2006, foi tida particular atenção com a estrutura logística e humana do GAD – Gabinete Aveiro Digital.

O Gabinete Aveiro Digital funciona nas instalações do Parque de Exposições de Aveiro, ocupando 4 gabinetes e dispondo ainda de uma Sala de Reuniões, um Arquivo Documental, um Espaço de Armazém e um Gabinete da CEAD.

O GAD é constituído por 3 Técnicos Superiores (Planeamento Regional e Urbano, Gestão de Empresas e Auditoria Contabilística); 3 Técnicos (Profissional de Informática, Bacharel em Planeamento Regional e Urbano e Bacharel em Gestão) e uma Secretária. Neste Gabinete estão incluídos os serviços de apoio técnico, atendimento e secretariado que mantém o arquivo e registo documental e de correspondência actualizados e que em 2005 processou e deu encaminhamento à entrada e saída de, respectivamente, 1864 e 2490 Ofícios, garantindo o melhor seguimento dos contactos telefónicos com o PAD 2003–2006 a mais de 320 entidades diferentes.

Em 2005, e dada a necessidade de garantir ferramentas informáticas de trabalho fiáveis e eficientes e tendo em conta as exigências de segurança e qualidade de serviço no processamento e arquivo de informação no GAD, foram adquiridos os seguintes equipamentos: PCs Portáteis (2), Impressora Multifunções; Projector Vídeo, Access Points (2); Máquina Fotográfica, DVD RW e Memórias RAM (2+5). Foram ainda renovadas as licenças do software Symantec Norton Corporate Anti-Virus (10 clientes e 1 de servidor) e adquiridos módulos adicionais ao Software de Contabilidade Primavera necessários à produção de mapas contabilísticos no GAD.

Para agilizar e racionalizar os procedimentos de acompanhamento e verificação da execução dos 77 Projectos Aveiro Digital, foi concebido e desenvolvido o SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital, tendo a CEAD nomeado desde 2004 um Técnico como gestor GAD e contacto único para cada Projecto Aveiro Digital.

O Gestor GAD de cada Projecto é o elo de ligação preferencial com a Entidade Beneficiária Principal de cada Projecto e acompanha de perto a execução dos Projectos AD que lhe estão atribuídos, estando-lhe cometidas as funções de harmonização e validação prévia de processos de Aquisição de Equipamentos, de análise e verificação dos Resultados documentais, de emissão de pareceres para a Alteração dos Planos Técnicos e Financeiros e para a validação técnica dos Reembolsos de Despesas.

Em 2005, os Contactos GAD verificaram 110 processos de Aquisição de Equipamentos, 1015 Resultados Documentais e emitiram pareceres para validação técnica de 103 Reembolsos de Despesas e para 89 alterações aos PTFs.

Os Gestores GAD realizaram ainda um conjunto de Reuniões de acompanhamento dos Projectos Aveiro Digital, nas instalações das Entidades Beneficiárias, com o objectivo de

verificar a execução técnica e financeira e o cumprimento das normas de publicitação Aveiro Digital, POSI e UE. (Anexo 12)

O SAVAD permite que toda a informação da execução material e financeira dos 77 Projectos Aveiro Digital seja harmonizada e arquivada em formato digital, bem como o seu processamento e agregação em três níveis distintos: PAD 2003–2006, Área de Intervenção e Projecto.

O acesso ao SAVAD é feito através de logins e passwords específicos, que permitem aceder a áreas e funcionalidades específicas conforme o tipo de perfil atribuído. Foram criados os perfis das EBPs, do GAD, do POSI, das Entidades Avaliadoras e dos Fornecedores de Formação.

Além das funcionalidades para o acompanhamento e verificação das tarefas dos Projectos AD associadas à Medida 2.3 – Cidades e Regiões Digitais, financiamento FEDER, foram também implementadas no SAVAD, funcionalidades de Gestão das Certificações e de Gestão da Formação, para o acompanhamento e verificação dos Resultados das Medidas 1.1 – Competências Básicas e 2.4 – Acções Integradas de Formação, ambas com financiamento FSE.

Assim, as EBPs dispõem no SAVAD de 4 áreas específicas para a Gestão Técnica e Financeira dos respectivos Projectos: Gestão Técnica, Gestão Financeira, Gestão da Formação e Gestão da Certificação.

As funcionalidades SAVAD para a Gestão Financeira são descritas em detalhe no Relatório de Execução Financeira e a descrição detalhada das funcionalidades SAVAD para a Gestão Técnica é apresentada de seguida.

Gestão Técnica no SAVAD

Conforme referido, o SAVAD está estruturado em três níveis diferentes: PAD 2003–2006, Área de Intervenção e Projecto AD, que contemplam funcionalidades e informação específica por perfil.

Assim, na área da Gestão Técnica do PAD 2003–2006, encontra-se a Lista e Estado dos Resultados comprometidos nos Projectos AD, conforme os Planos Técnicos e Financeiros aprovados. A informação é agregada por Projecto AD e ordenada por Área de Intervenção, não sendo passível de qualquer intervenção. Esta área de informação é disponibilizada a todas as Entidades Beneficiárias Principais, no sentido de estimular a sua participação.

Aveiro Digital 2003 - 2006		www.aveiro-digital.pt																																																																																																																																					
		SAVAD - Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital																																																																																																																																					
																																																																																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> ■ GAD ■ PAD 2003-2006 <ul style="list-style-type: none"> ■ Gestão Técnica ■ Gestão Financeira ■ AI 1 ■ AI 2 ■ AI 3 ■ AI 4 ■ AI 5 ■ AI 6 ■ AI 7 ■ AI 8 ■ Sair 		PROGRAMA AVEIRO DIGITAL 2003-2006 Lista e Estado de Resultados <table border="1"> <thead> <tr> <th>AI</th> <th>Projecto</th> <th>Total</th> <th>Em Curso</th> <th>Atrasados</th> <th>Entregues</th> <th>A corrigir</th> <th>Verificados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>EIAD</td><td>60</td><td>32</td><td>27</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>SBAD</td><td>40</td><td>25</td><td>15</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>CERTICAD</td><td>29</td><td>20</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>GCAD</td><td>64</td><td>46</td><td>18</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>MARKAD</td><td>40</td><td>32</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>APAD</td><td>62</td><td>51</td><td>11</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>SICAVIM</td><td>49</td><td>38</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td>2</td><td>S.I.G.Ria</td><td>59</td><td>37</td><td>0</td><td>1</td><td>14</td><td>7</td></tr> <tr><td>2</td><td>Ambi-Ria</td><td>46</td><td>46</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>Mobi-Ria</td><td>43</td><td>43</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>Secur-Ria</td><td>43</td><td>43</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>SEVER INFORMA</td><td>65</td><td>47</td><td>8</td><td>0</td><td>3</td><td>7</td></tr> <tr><td>2</td><td>SAL- On Line</td><td>66</td><td>44</td><td>9</td><td>0</td><td>4</td><td>9</td></tr> <tr><td>2</td><td>AEI</td><td>66</td><td>42</td><td>8</td><td>0</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>2</td><td>VAGOS- INFORMA</td><td>65</td><td>43</td><td>6</td><td>0</td><td>7</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>						AI	Projecto	Total	Em Curso	Atrasados	Entregues	A corrigir	Verificados	1	EIAD	60	32	27	1	0	0	1	SBAD	40	25	15	0	0	0	1	CERTICAD	29	20	9	0	0	0	1	GCAD	64	46	18	0	0	0	1	MARKAD	40	32	8	0	0	0	1	APAD	62	51	11	0	0	0	2	SICAVIM	49	38	6	0	1	4	2	S.I.G.Ria	59	37	0	1	14	7	2	Ambi-Ria	46	46	0	0	0	0	2	Mobi-Ria	43	43	0	0	0	0	2	Secur-Ria	43	43	0	0	0	0	2	SEVER INFORMA	65	47	8	0	3	7	2	SAL- On Line	66	44	9	0	4	9	2	AEI	66	42	8	0	10	6	2	VAGOS- INFORMA	65	43	6	0	7	9
AI	Projecto	Total	Em Curso	Atrasados	Entregues	A corrigir	Verificados																																																																																																																																
1	EIAD	60	32	27	1	0	0																																																																																																																																
1	SBAD	40	25	15	0	0	0																																																																																																																																
1	CERTICAD	29	20	9	0	0	0																																																																																																																																
1	GCAD	64	46	18	0	0	0																																																																																																																																
1	MARKAD	40	32	8	0	0	0																																																																																																																																
1	APAD	62	51	11	0	0	0																																																																																																																																
2	SICAVIM	49	38	6	0	1	4																																																																																																																																
2	S.I.G.Ria	59	37	0	1	14	7																																																																																																																																
2	Ambi-Ria	46	46	0	0	0	0																																																																																																																																
2	Mobi-Ria	43	43	0	0	0	0																																																																																																																																
2	Secur-Ria	43	43	0	0	0	0																																																																																																																																
2	SEVER INFORMA	65	47	8	0	3	7																																																																																																																																
2	SAL- On Line	66	44	9	0	4	9																																																																																																																																
2	AEI	66	42	8	0	10	6																																																																																																																																
2	VAGOS- INFORMA	65	43	6	0	7	9																																																																																																																																

SAVAD - Execução Técnica: PAD 2003-2006

A informação relativa à Gestão Técnica associada a cada Área de Intervenção evidencia os Projectos, respectivos resultados e estado. Esta área permite ainda visualizar o orçamento e a execução financeira da Área de Intervenção seleccionada.

Aveiro Digital 2003 - 2006		www.aveiro-digital.pt																																																																																																																														
		SAVAD - Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital																																																																																																																														
																																																																																																																																
<ul style="list-style-type: none"> ■ GAD ■ PAD 2003-2006 ■ AI 1 ■ AI 2 ■ AI 3 ■ AI 4 ■ AI 5 ■ AI 6 ■ SAISS ■ Estar ■ SAD-SOS ■ Inclinet ■ ISSI ■ AMRIASocial ■ AI 7 ■ AI 8 ■ Sair 		ÁREA DE INTERVENÇÃO 6 - Solidariedade Social Lista e Estado de Resultados <table border="1"> <thead> <tr> <th>AI</th> <th>Projecto</th> <th>Total</th> <th>Em Curso</th> <th>Atrasados</th> <th>Entregues</th> <th>A corrigir</th> <th>Verificados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6</td><td>SAISS</td><td>66</td><td>49</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>12</td></tr> <tr><td>6</td><td>Estar</td><td>48</td><td>46</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>6</td><td>SAD-SOS</td><td>37</td><td>37</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>6</td><td>ISSI</td><td>49</td><td>45</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>6</td><td>Inclinet</td><td>48</td><td>47</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>6</td><td>AMRIASocial</td><td>51</td><td>49</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rúbrica de Investimento</th> <th>Orçamento</th> <th>Orçamento executado</th> <th>Orçamento por executar</th> <th>% execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Despesas de Capital / Imobilizadas Corpóreas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipamento</td> <td>341950</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>341950</td> </tr> <tr> <td>Outras despesas de investimento</td> <td>17825,02</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>17825,02</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>359775,02</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>359775,02</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes / Imobilizadas Incorpóreas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recursos Humanos</td> <td>203251</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>203251</td> </tr> <tr> <td>Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração</td> <td>288649</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>288649</td> </tr> <tr> <td>Aquisição de Serviços e manutenção</td> <td>179924</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>179924</td> </tr> <tr> <td>Aquisição de Formação a entidades acreditadas</td> <td>122350</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>122350</td> </tr> <tr> <td>Outras despesas correntes</td> <td>56000</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>56000</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>850174</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>850174</td> </tr> <tr> <td>Investimento Total</td> <td>1209949,02</td> <td></td> <td>1209949,02</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						AI	Projecto	Total	Em Curso	Atrasados	Entregues	A corrigir	Verificados	6	SAISS	66	49	3	2	0	12	6	Estar	48	46	0	2	0	0	6	SAD-SOS	37	37	0	0	0	0	6	ISSI	49	45	4	0	0	0	6	Inclinet	48	47	1	0	0	0	6	AMRIASocial	51	49	0	2	0	0	Rúbrica de Investimento	Orçamento	Orçamento executado	Orçamento por executar	% execução	Despesas de Capital / Imobilizadas Corpóreas					Equipamento	341950		0,00	341950	Outras despesas de investimento	17825,02		0,00	17825,02	Sub-Total	359775,02		0,00	359775,02	Despesas Correntes / Imobilizadas Incorpóreas					Recursos Humanos	203251		0,00	203251	Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	288649		0,00	288649	Aquisição de Serviços e manutenção	179924		0,00	179924	Aquisição de Formação a entidades acreditadas	122350		0,00	122350	Outras despesas correntes	56000		0,00	56000	Sub-Total	850174		0,00	850174	Investimento Total	1209949,02		1209949,02	
AI	Projecto	Total	Em Curso	Atrasados	Entregues	A corrigir	Verificados																																																																																																																									
6	SAISS	66	49	3	2	0	12																																																																																																																									
6	Estar	48	46	0	2	0	0																																																																																																																									
6	SAD-SOS	37	37	0	0	0	0																																																																																																																									
6	ISSI	49	45	4	0	0	0																																																																																																																									
6	Inclinet	48	47	1	0	0	0																																																																																																																									
6	AMRIASocial	51	49	0	2	0	0																																																																																																																									
Rúbrica de Investimento	Orçamento	Orçamento executado	Orçamento por executar	% execução																																																																																																																												
Despesas de Capital / Imobilizadas Corpóreas																																																																																																																																
Equipamento	341950		0,00	341950																																																																																																																												
Outras despesas de investimento	17825,02		0,00	17825,02																																																																																																																												
Sub-Total	359775,02		0,00	359775,02																																																																																																																												
Despesas Correntes / Imobilizadas Incorpóreas																																																																																																																																
Recursos Humanos	203251		0,00	203251																																																																																																																												
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	288649		0,00	288649																																																																																																																												
Aquisição de Serviços e manutenção	179924		0,00	179924																																																																																																																												
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	122350		0,00	122350																																																																																																																												
Outras despesas correntes	56000		0,00	56000																																																																																																																												
Sub-Total	850174		0,00	850174																																																																																																																												
Investimento Total	1209949,02		1209949,02																																																																																																																													

SAVAD - Execução Técnica e Financeira por AI

Na área Gestão Técnica dos Projectos AD, é possível não só visualizar cada um dos Resultados comprometidos e respectivo estado, como ainda permite às EBPs a inserção dos Resultados comprometidos nos PTF aprovados e das Justificações de Aquisição de Equipamento Tecnológico. A inserção de Processos de Aquisição de Equipamento Tecnológico é independente dos Resultados planeados no PTF, enquanto a inserção dos Resultados obriga à selecção prévia do Resultado comprometido.

Cada Resultado é um único ficheiro, num formato adequado à sua natureza, embora as EBPs adoptem preferencialmente o formato de folha de texto e.g. Microsoft Word ou PDF. Este último é especialmente usado, uma vez que permite a integração de vários documentos de vários formatos. Os vários estados de cada Resultado são:

- “Em curso”: quando o Resultado está em período de realização;
- “Atrasado”: quando a entrega do Resultado não é feita até ao último dia do mês comprometido no PTF aprovado;
- “Entregue”: quando o Resultado aguarda verificação pelo Contacto GAD do Projecto;
- “A Corrigir”: quando o Contacto GAD considera que o Resultado não está conforme a natureza, extensão, detalhe e qualidade do compromisso explícito no PTF;
- “Verificado”: quando o Contacto GAD do Projecto considera que o Resultado está conforme a natureza, extensão, detalhe e qualidade do compromisso explícito no PTF. Este estado não é passível de alteração, implicando o fim do compromisso da EBP relativamente a esse Resultado.

Sempre que um Resultado é entregue, o SAVAD gera a correspondente notificação para a EBP e para o Contacto GAD dessa entrega, colocando o respectivo Resultado no estado de “Verificar”.

O Contacto GAD do Projecto verifica então a qualidade do Resultado entregue, conforme PTF aprovado, colocando o Resultado num dos seguintes estados: “A Corrigir” ou “Verificado”. No caso “A Corrigir”, são inseridas as respectivas notas, sinalizando à EBP as sugestões de correcções a introduzir.

Cada Resultado pode ser colocado no Estado “A Corrigir”, mais do que uma vez, enquanto que a decisão de “Verificado”, implica o fim do processo de apresentação do Resultado, sendo a data dessa decisão identificada no SAVAD.

As funcionalidades para verificação dos Resultados estão disponíveis somente para o perfil associado ao GAD estando estabelecido o prazo limite de 5 dias para a análise do GAD.

Aveiro Digital 2003 - 2006 www.aveiro-digital.pt

SAVAD - Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

SAISS **Portugal Digital POSI**

GAD

PAD 2003-2006

AI 1

AI 2

AI 3

AI 4

AI 5

AI 6

SAISS

- Plano Técnico e Fin.
- Gestão Técnica
- Gestão Formação
- Gestão Certificação
- Gestão Financeira

Estar

- SAD-SOS
- Incluinet
- ISSI
- AMRIASocial

AI 7

AI 8

Sair

GESTÃO TÉCNICA - SAISS

Processos de Aquisição de Equipamento Tecnológico

Designação	Estado	Apagar	Documento	Verificação
Designação: <input type="text"/> <input type="button" value="Inserir"/>				

Lista de Resultados

Resultado	Designação	Mês	Estado		
B.1.1	Reuniões e Workshops	1	Verificado		21/09/2004
C.1.1	Inquéritos e Reuniões	2	Verificado		17/11/2004
B.1.2	Reuniões e Workshops	4	Verificado		11/01/2005
C.1.2	Inquéritos e Reuniões	5	Verificado		17/11/2004
A.1.1	Relatório de Execução Material e Financeira	6	Verificado		11/01/2005
A.2.1	Produção e Manutenção do site do Projecto	6	Verificado		09/09/2004
B.1.3	Reuniões e Workshops	7	Em Curso		
C.1.3	Inquéritos e Reuniões	8	Verificado		17/11/2004
1.1.1	Relatório global de análise de requisitos	8	Verificado		27/10/2004
1.2.1	Requisitos do PEU	8	Verificado		02/11/2004
1.3.1	Requisitos do SIDEI	8	Verificado		02/11/2004
1.4.1	Requisitos do STC	8	Verificado		02/11/2004
1.5.1	Requisitos do SSAD	8	Verificado		04/11/2004
B.1.4	Reuniões e Workshops	10	Em Curso		
C.1.4	Inquéritos e Reuniões	11	A corrigir		
3.1.1	Relatório de Especificação técnica do SIDEI	11	Atrasado		
A.1.2	Relatório de Execução Material e Financeira	12	Entregue		Verificar

SAVAD – Gestão Técnica por Projecto

A inserção do ficheiro de Resultado é feita numa área específica, onde existem as seguintes funcionalidades:

- “Inserir Ficheiro de Resultado”: Inserção do ficheiro do Resultado através de um upload intuitivo e simplificado, sendo solicitada unicamente a introdução do nome do ficheiro e a respectiva localização. Estas funcionalidades estão disponíveis para as EBPs e para o GAD;
- “Histórico de Resultados Inseridos”: Permite registar e visualizar o workflow de acções do GAD e das EBPs até à verificação final de cada Resultado, mantendo o histórico das versões entregues. Esta funcionalidade está disponível para as EBPs e para os respectivos contactos GAD que detêm ainda a permissão de eliminação de ficheiros, apenas quando e formalmente requerido pelas EBPs;
- “Listagem das Notificações”: Esta informação que está disponível para as EBPs e GAD, evidencia as notificações geradas pelo SAVAD. Estas notificações são geradas sempre que o Resultado se encontre em atraso ou sempre que existe uma mudança de estado dos Resultados. Estas notificações são geradas automaticamente pelo SAVAD e enviadas por e-mail e por SMS para a EBP e para o Contacto GAD do Projecto;

- o "Inserir Notificação": Esta função só está disponível para o GAD e permite gerar uma notificação específica, alertando a EBP para uma qualquer situação relevante;

Aveiro Digital 2003 - 2006
www.aveiro-digital.pt



Aveiro digital
2003-2006

SAVAD - Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

SAISS



Portugal Digital POSI
PROGRAMA OPERACIONAL
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
INICIATIVA DE EMPREENHABILIDADE

- GAD
- PAD 2003-2006
- AI 1
- AI 2
- AI 3
- AI 4
- AI 5
- AI 6
- SAISS
 - Plano Técnico e Fin.
 - Gestão Técnica
 - Gestão Formação
 - Gestão Certificação
 - Gestão Financeira
- Estar
 - SAD-SOS
 - Inclinet
 - ISSI
 - AMRIASocial
- AI 7
- AI 8
- Sair

Desenvolvido por **NETUAL**

GESTÃO TÉCNICA - SAISS

Resultado "1.5.1-Requisitos do SSAD"

1.1 Inserir ficheiro de Resultado

Título

Ficheiro

Não usar ficheiros com caracteres acentuados ou cedilhados.

1.2 Histórico de Resultados Inseridos

	Ficheiro	Estado	Data	Apagar	Entregar
1	d1_5_1.pdf	Verificado	04/11/2004	<input type="checkbox"/>	
2	d1_5_1.pdf	A corrigir ?	26/10/2004	<input type="checkbox"/>	

2.1 Listagem de Notificações

	Meio	De	Para	Notificação	Data Envio
1	email	GAD	appacdm@aveiro-digital.net;rogerio.pais@aveiro-digital.pt	Verificado	04/11/2004
2	email	GAD	appacdm@aveiro-digital.net;rogerio.pais@aveiro-digital.pt	Verificado	04/11/2004
3	email	GAD	appacdm@aveiro-digital.net;rogerio.pais@aveiro-digital.pt	Entrega de Documento	04/11/2004
4	sms	GAD	962443569	Atraso	
5	email	GAD	appacdm@aveiro-digital.net;rogerio.pais@aveiro-digital.pt	Atraso	03/11/2004
6	email	GAD	appacdm@aveiro-digital.net;rogerio.pais@aveiro-digital.pt	A corrigir	02/11/2004
7	email	GAD	appacdm@aveiro-digital.net;rogerio.pais@aveiro-digital.pt	Entrega de Documento	26/10/2004
8	sms	GAD	962443569	Atraso	
9	email	GAD	appacdm@aveiro-digital.net;rogerio.pais@aveiro-digital.pt	Atraso	20/10/2004
10	sms	GAD	962443569	Atraso	
11	email	GAD	appacdm@aveiro-digital.net;rogerio.pais@aveiro-digital.pt	Atraso	13/10/2004
12	sms	GAD	962443569	Atraso	
13	email	GAD	appacdm@aveiro-digital.net;rogerio.pais@aveiro-digital.pt	Atraso	06/10/2004
14	sms	GAD	962443569	Atraso	
15	email	GAD	appacdm@aveiro-digital.net;rogerio.pais@aveiro-digital.pt	Atraso	18/09/2004

2.2 Inserir Notificação

De "Origem"

Assunto

Meio de envio Os SMS apenas permitem 150 caracteres

SAVAD - Gestão Técnica: Entrega de Resultados

Em 2005 foi adicionada uma nova área de trabalho no SAVAD para o Sistema de Avaliação Externa do PAD da responsabilidade do CIES/ISCTE, que contempla uma área específica de interacção com os Projectos Aveiro Digital. Foi também adicionada uma funcionalidade, de uso exclusivo do GAD, para inserção das alterações aos Planos

Copyright © 2006, Comissão Executiva Aveiro Digital

57 / 181

Projectos Aveiro Digital em Execução

O ano de 2005 foi iniciado com a execução dos 78 Projectos Aveiro Digital, tendo estes atingido resultados visíveis e em operação através dos sites de serviços das respectivas EBs, tendo também sido demonstrados na 1ª Exposição Aveiro Digital, realizada em Julho de 2005. Estes 78 Projectos são constituídos pelos 6 Projectos da AI1, da responsabilidade directa da CEAD, mais os Projectos das outras Áreas de Intervenção, aprovados no âmbito do 1º e do 2º Concurso Aveiro Digital – 40 Projectos aprovados no âmbito do 1º Concurso e 32 no âmbito do 2º Concurso.

Em Fevereiro de 2005, a CEAD foi informada da desistência do Projecto web.IVE, Ref. PAD 129, tendo a respectiva EBP justificado esta desistência com a dificuldades de integração dos sistemas a desenvolver com o sistema da Direcção Geral de Viação. Assim, o número de Projectos em execução no Programa Aveiro Digital é agora de 77, constituídos por 6 da AI1 e por 71 das restantes Áreas de Intervenção.

Apresentam-se em seguida as listas dos 77 Projectos em curso por Área de Intervenção, evidenciando o resultado mais relevante de cada Projecto, Duração, Entidade Beneficiária Principal e Orçamento associado à Medida 2.3:

Área de Intervenção 1 – Comunidade Digital					
Projecto	Acrónimo	Resultado	Duração	EBP	Orçamento
1.1	eiad	Espaços Internet AD nos 11 Municípios e 95 freguesias da AMRia	48 Meses	CEAD	1.321.865€
1.2	sbad	Serviços aveiro-digital.pt e aveiro-digital.net	48 Meses	CEAD	100.000€
1.3	gcad	Gestão e Coordenação do PAD 2003-2006	48 Meses	CEAD	1.582.146€
1.4	markad	Acções de Marketing e Promoção do PAD 2003-2006	48 Meses	CEAD	400.000€
1.5	apad	Partilha de práticas e métodos com Outras Iniciativas similares	48 Meses	CEAD	50.000€
1.6	certicad	45.000 Certificações em Competências Básicas em TIC	48 Meses	CEAD (Medida 1.1)	
Orçamento AI 1					3.454.011€
Área de Intervenção 2 – Autarquias e Serviços Concelhios					
C. P.	Acrónimo	Resultado	Duração	EBP	Orçamento
1º 2.1	sicavim	Sistema Integrado de Gestão Cadastral	36 Meses	CM Mira	448.984€
1º 2.2	sig.ria	Serviços SIG da Região da AMRia	36 Meses	AMRia	2.470.497€
2º 2.3	ambi-ria	Planos e SIG do Ambiente e da Água para a Região da AMRia	24 Meses	AMRia	375.271€
2º 2.4	mobi-Ria	Serviços para a Gestão do Tráfego Urbano e Inter-Modal	24 Meses	CM Aveiro	367.400€
2º 2.5	secur-Ria	Planos e SIG de Risco e Segurança para a Região da AMRia	24 Meses	AMRia	390.055€
1º 2.6	aei	Serviços de Back-office e Front-office das Câmaras Municipais	36 Meses	CM Águeda	517.500€
1º 2.6	sal-on line	Serviços de Back-office e Front-office das Câmaras Municipais	36 Meses	CM Albergaria-a-Velha	870.611€
1º 2.6	severinforma	Serviços de Back-office e Front-office das Câmaras Municipais	36 Meses	CM Vagos	166.500€
1º 2.6	vagosinforma	Serviços de Back-office e Front-office das Câmaras Municipais	36 Meses	CM Sever do Vouga	172.540€
2º 2.7	ria-on-line	Portal Regional da AMRia	24 Meses	AMRia	20.000€
Orçamento AI2					5.799.358€
Área de Intervenção 3 – Escolas e Comunidades Educativas					
C. P.	Acrónimo	Resultado	Duração	EBP	Orçamento
1º 3.1	e-ria	Serviços de Gestão e Administração na Rede Escolar da AMRia	36 Meses	DREC - CAE de Aveiro	756.000€
1º 3.2	pormat	Curricula Digital e de E- Learning de Português e Matemática	36 Meses	DREC - CAE de Aveiro	269.500€
2º 3.3	professor	Serviços de Formação a Distância para Professores	24 Meses	DREC - CAE de Aveiro	115.200€
1º 3.4	e-cmei	Conselho Municipal de Educação de Ílhavo online	36 Meses	CM Ílhavo	119.250€
1º 3.4	ria.edu	Serviços <i>Online</i> para a Comunidade Educativa da AMRia	36 Meses	ACEAV	727.000€
Orçamento AI3					1.986.950€

Área de Intervenção 4 – Universidade e Comunidade Universitária						
C.	P.	Acrónimo	Resultado	Duração	EBP	Orçamento
1º	4.1	e-abs	Aquisição de Bens e Serviços em Ambiente Electrónico	36 Meses	Universidade de Aveiro	89.994€
1º	4.2	situa	Sist. Integrado de Tele-Trabalho para a Comunidade Universitária	36 Meses	Universidade de Aveiro	924.727€
1º	4.3	contactua	Sistema de Contacto e Interação <i>Online</i> com a UA	36 Meses	Universidade de Aveiro	180.000€
1º	4.4	sinbad	Sistema Integrado para Biblioteca e Arquivo Digitais	24 Meses	Universidade de Aveiro	392.025€
2º	4.5	natural	Produtos Pedagógicos para a Ciência através da Arte	24 Meses	Universidade de Aveiro	180.000€
1º	4.6	radical	Produtos Multimédia para a Aprendizagem Interactiva	36 Meses	Universidade de Aveiro	207.733€
Orçamento AI4						1.974.479€

Área de Intervenção 5 – Serviços de Saúde						
C.	P.	Acrónimo	Resultado	Duração	EBP	Orçamento
1º	5.3	rdsr	Serv. de Tele-Diagnóstico nos Hospitais e Centros Saúde da AMRIA	24 Meses	ARS Centro – SRS Aveiro	836.913€
1º	5.4	rts	Portal Regional da Saúde com Serv. para o Utente e Prof. da Saúde	36 Meses	Hospital Infante D. Pedro	795.750€
Orçamento AI5						1.632.663€

Área de Intervenção 6 – Solidariedade Social						
C.	P.	Acrónimo	Resultado	Duração	EBP	Orçamento
1º	6.1	saiss	Serviços de Gestão e Administração da Rede das IPSS da AMRIA	36 Meses	APPACDM	644.000€
2º	6.2	estar	Centros e Serviços de Info-Inclusão	24 Meses	Cercimira	72.000€
2º	6.4	sad_sos	Serviços de Apoio a Idosos em Situações de Risco	24 Meses	S. C. Misericórdia Murtosa	38.700€
2º	6.5	includnet	Centros e Serviços de Info-Inclusão	24 Meses	Solsil	99.900€
2º	6.5	issi	Centros e Serviços de Info-Inclusão	18 Meses	Cáritas Diocesanas Aveiro	128.249€
2º	6.8	amriassoc	Serviços de Oferta e de Procura de Solidariedade Social	24 Meses	Associação BETEL	104.750€
Orçamento AI6						1.087.599€


Área de Intervenção 7 – Tecido Produtivo						
C.	P.	Acrónimo	Resultado	Duração	EBP	Orçamento
1º	7.1	geo-mkt	Serv. de Marketing das ZING- Zonas Industriais de Nova Geração	24 Meses	AIDA	124.314€
2º	7.3	tic & tu	Serviço de Informação Turística e de Reservas da Rota da Luz	24 Meses	R. Turismo Rota da Luz	146.598€
1º	7.4	geolInvest	Serviços SIG de Localização das ZING na Região da AMRIA	24 Meses	AIDA	258.384€
1º	7.5	abs XXI	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Abril	24 Meses	Abril-Mob. Metálico, Lda	45.118€
1º	7.5	digivacas	Serviços de Back-office de Gestão e de Produção da EABL	32 Meses	Est. Apoio Bovin. Leiteira	122.428€
1º	7.5	e-ntl	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Netual	24 Meses	Netual, Lda	40.300€
1º	7.5	estag	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Estóragueada	24 Meses	Estóragueada, Lda	30.062€
1º	7.5	fig-net	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da FIG	24 Meses	FIG-Fáb. de Plásticos, Lda	29.594€
1º	7.5	hmc	Serv. de Gestão Doc. E de Processos de Clientes da HM	24 Meses	HM Consultores, Lda	80.600€
1º	7.5	inovortal	Serv. de Data-Center e de Marketing para as Empresas Associadas	24 Meses	Associação INOVA-RIA	90.300€
1º	7.5	marc	Serviços de Gestão da Produção Online da Empresa Marques	24 Meses	Marques, S.A.	131.226€
1º	7.5	onda	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da OndaVideo	12 Meses	OndaVideo, Lda.	92.000€
1º	7.5	red-aveiro	Serviços <i>Online</i> para a Rede de Jovens Empresas	36 Meses	ANJE	177.499€
1º	7.5	sani	Serv. Controlo e Gestão Integrada da Prod. e Stocks da Sanindusa	24 Meses	Sanindusa, S.A.	211.461€
1º	7.5	sipa	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da APA	27 Meses	APA-Adm. Porto de Aveiro	292.476€
1º	7.5	smia	Serviços de Informatização dos Processos de Produção da LP	12 Meses	LP, Lda	93.967€
1º	7.5	tup	Serv. Gestão de Encom., Fabrico, Armazéns e Exped. Da TUPAI	30 Meses	Tupai, S.A	195.040€
2º	7.5	abdigital	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Abimota	14 Meses	Abimota	114.700€
2º	7.5	atlética	Serviços de Back-office e de Gestão da Produção da Atlética	8 Meses	Atlética Ibérica, Lda	51.050€
2º	7.5	braxen	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Braxen	12 Meses	Braxen, Lda	40.740€
2º	7.5	cadernodigital	Serviços de Back-office e de Edição On-line da Caderno Digital	7 Meses	Caderno Digital, Lda	58.454€
2º	7.5	com.web	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Audiodecor	12 Meses	AudioDecor, Lda	40.095€
2º	7.5	digipot	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da 5ª Potência	12 Meses	5ª Potência, Lda	44.508€
2º	7.5	e-si	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da HFA	12 Meses	HFA, Lda	54.000€
2º	7.5	extraplas	Serviços de Back-office de Gestão e de Produção da Madaleno	12 Meses	Madaleno, Lda	55.168€
2º	7.5	galileu-diag	Serv. de Diagnóstico e Gestão Formação da Activos e Recursos	12 Meses	Activos e Recursos, Lda	45.400€
2º	7.5	imagemXXI	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Umalmagem	12 Meses	Uma Imagem, Lda	57.568€
2º	7.5	jfd	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Janeves	12 Meses	Janeves, Lda	44.577€
2º	7.5	semiar	Serviços de Back-office e de Edição On-line da Semiar	10 Meses	Semiar, Lda	41.200€
2º	7.5	uebe.SI	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Ponto.C.	12 Meses	Ponto.C, Lda	36.600€
2º	7.5	vlm-online	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da VLM Consultores	24 Meses	VLM Consultores, Lda	31.207€
Orçamento AI7						2.876.634€

Área de Intervenção 8 – Informação, Cultura e Lazer						
C.	P.	Acrónimo	Resultado	Duração	EBP	Orçamento
1º	8.1	bibria	Serv.on-line e de Arquivo Digital das Bibliotecas Região AMRia	24 Meses	CM Aveiro	297.189€
1º	8.1	infordico	Serv. on-line e Webização interna do Museu Marítimo de Ílhavo	24 Meses	CM Ílhavo	416.119€
1º	8.1	memdigital	Serviços on-line e Webização interna do Museu Egas Moniz	24 Meses	CM Estarreja	144.550€
1º	8.1	p@z	Serviços on-line e Arquivo Digital do Juizado de Paz da Murtosa	36 Meses	S. C. Misericórdia Murtosa	75.714€
2º	8.1	museave	Produtos e Serviços Pedagógicos para Pólos Museológicos	24 Meses	IPM – Museu de Aveiro	76.007€
2º	8.2	sigred	Serviços para a Gestão e Reserva de Recintos Desportivos	18 Meses	Associação Rededucativa	107.675€
1º	8.3	aad-ta	Academia de Artes Digitais	36 Meses	Teatro Aveirense	400.000€
1º	8.4	piar	Serviço Público de Informação via RDS	36 Meses	Cooperativa Terra Nova	695.668€
2º	8.4	adira	Serv. para Gestão e Promoção das Associações da Região AMRia	24 Meses	Soc. Recreio Artístico	360.740€
2º	8.4	ipjdigital	Serv. para Gestão e Promoção das Assoc. Juvenis da Região AMRia	24 Meses	IPJ – Aveiro	63.000€
2º	8.4	pomada	Serviços para a Gestão e Promoção da AAUA	24 Meses	Assoc. Académica da UA	31.500€
Orçamento AI8						2.668.162€

Representação do Programa Aveiro Digital 2003–2006

Foi assegurada a representação da CEAD em diversas reuniões e iniciativas, promovidas quer pelo POSI, quer por outras entidades e decidida em função da natureza da missão e da disponibilidade dos seus membros. No ano de 2005, a CEAD esteve representada nas iniciativas seguintes:

Iniciativa	Local de Realização	Data
Sessão de Lançamento do Programa de Compras Electrónicas e Portal compras.gov.pt	Lisboa	12.01.05
Apresentação do Programa Operacional Sociedade do Conhecimento	Lisboa	19.01.05
Reunião com a CG do POSI e Apresentação do Portal www.cidadesdigitais.pt	Lisboa	24.02.05
Sessão de Apresentação Pública do Projecto Évora Distrito Digital	Évora	19.04.05
Sessão de Apresentação do GAME – Gabinete de Apoio ao Município de Estarreja	Estarreja	20.04.05
Programa Prós e Contras da RTP1	Lisboa	25.04.05
Sessão de Apresentação do Site de Serviços Projecto AMRIASocial, 113	Aveiro	18.05.05
Sessão Pública de Apresentação do Projecto Ria.EDU, 006	Ílhavo	01.06.05
Sessão de Divulgação dos Projectos Aveiro Digital na CM de Aveiro	Aveiro	09.06.05
Sessão de Divulgação dos Projectos Aveiro Digital na CM de Oliveira do Bairro	Oliveira do Bairro	18.06.05
1ª Reunião da Comissão de Acompanhamento e Peritos	Aveiro	02.07.05
Sessão de Divulgação dos Projectos Aveiro Digital na CM de Estarreja	Estarreja	13.07.05
Encontro de Representantes dos Projectos de Cidades e Regiões Digitais	Lisboa	16.07.05
Lançamento do Programa Nacional para a SI –Ligar Portugal	Aveiro	30.07.05
Sessão da Tomada de Posse dos novos Órgãos Sociais da ABIMOTA	Águeda	03.09.05
Inauguração do novo EIAD de Ílhavo	Ílhavo	11.09.05
Apresentação dos Centros de Info-Inclusão do Projecto ISSI, 133	Aveiro	21.09.05
Sessão do Projecto SAL–Online, 016, destinada aos Executivos Municipais	Albergaria–a–Velha	21.11.05
Jornadas da Administração Pública Local	Tomar	23.11.05
Total:		19 Iniciativas

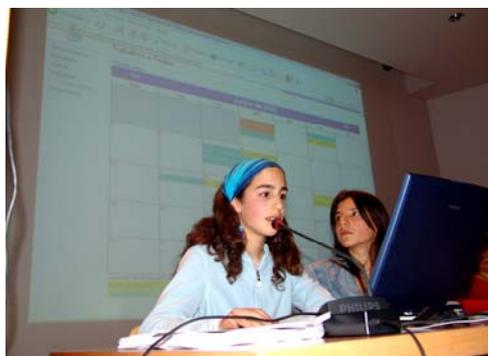

Sessão Pública de Apresentação Projecto Ria.EDU – 01.06.05



Lançamento Programa Nacional SI *Ligar Portugal* – 30.07.05

Iniciativas de Concertação

A Concertação Aveiro Digital enquadra as actividades de articulação dos 71 Projectos Aveiro Digital, promovendo a conjugação de esforços, a partilha de práticas e métodos e a promoção e divulgação dos seus resultados. A Concertação tem uma natureza global enquadrando todos os Projectos e também por Área de Intervenção, dada a especificidade de cada sector e a maior eficiência da concertação quando os actores envolvidos pertencem ao mesmo segmento social e organizacional. Em 2005, foram promovidas a 2ª Reunião de Concertação e 1ª Exposição Aveiro Digital com todos os Projectos, realizadas a 1, 2 e 3 de Julho. (Anexo 14)



2ª Reunião de Concertação e 1ª Exposição Aveiro Digital – 1, 2 e 3.07.05

Foram também realizadas as segundas e terceiras Reuniões de Concertação por AI, em Fevereiro (Anexo 15), e Novembro (Anexo 16), nas instalações das Entidades Beneficiárias dos Projectos AD onde foi apresentada a situação de cada projecto, partilhadas práticas e comunicadas as orientações de gestão Aveiro Digital.



2ª Reunião de Concertação AI4, UA – 22.02.05



2ª Reunião de Concertação AI7, Sanindusa – 21.11.05



3ª Reunião de Concertação AI2, CM Vagos – 08.11.05



3ª Reunião de Concertação AI5, Hosp. Águeda- 8.11.05

Nas 3^{as} Reuniões de Concertação por AI, realizadas em Novembro de 2005, foi lançado o processo de concertação interna e autónoma por cada Área de Intervenção. As Entidades Beneficiárias, organizadas por AI foram assim convidadas a trabalharem em conjunto para a preparação e organização de iniciativas de promoção e divulgação dirigidas aos respectivos públicos alvo, a iniciarem a reflexão e avaliação da sua área de Intervenção e a identificarem perspectivas da sua evolução futura.

É esperado de cada Área de Intervenção a produção de um documento de “Balanço e Perspectivas por AI” para ser apresentado no Fórum Aveiro Digital, onde se espera o debate e a contribuição alargada da sociedade civil, científica e académica a nível nacional e internacional.

Avaliação Externa do PAD 2003–2006

O Programa Aveiro Digital 2003–2006 prevê, para o bom acompanhamento, monitoria e intervenção regular na sua condução global, a instalação de um Sistema de Avaliação Externa, que garanta também a avaliação dos impactos directos e indirectos no desenvolvimento social, cultural e económico na Região da AMRia.

Considerando que só no 4^o trimestre de 2004, o Programa Aveiro Digital atingiu a sua plena dimensão, com a execução dos 77 Projectos, cobrindo todas as 8 Áreas de Intervenção, a Comissão Executiva Aveiro Digital decidiu, na sua 17^a Reunião, realizada a 21.09.2004, lançar um convite a 6 Entidades nacionais de reconhecido mérito para apresentação de propostas de Serviços de Avaliação Externa, tendo sido recebidas 3 propostas.

A CEAD na sua 19^a Reunião, realizada a 25.02.05, decidiu a adjudicação ao CIES – Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, conforme classificação atribuída com base nos critérios de selecção publicitados. (Anexo 17)

No âmbito do Sistema de Avaliação Externa do PAD, foram já realizadas várias reuniões de trabalho entre o CIES e a CEAD e disponibilizado espaço no GAD para instalação de um técnico permanente do CIES.

Foi também aprovada pela CEAD, na sua 21^a Reunião, realizada a 17.06.05, a constituição da CAP – Comissão de Acompanhamento e Peritos. (Anexo 18). A CAP integra representantes de diversas instituições locais e regionais, do POSI, da CEAD, da equipa de consultores e da equipa do CIES, tendo a CAP já sido solicitada a dar os seus contributos ao Relatório da Fase I do SAE – PAD, entregue à CEAD em Julho de 2006. (Anexo 19)

Em 2005, foram também implementadas no SAVAD funcionalidades específicas para a equipa responsável pelo SAE-PAD, conforme proposta do CIES de Desenvolvimento de Conteúdos Electrónicos do SAE-PAD 2003-2006 e aprovada pela CEAD na sua 21ª Reunião, realizada a 17.06.05. Estas funcionalidades tem como objectivo a comunicação regular e exclusiva entre o CIES e as EBPs, bem como acesso pelo CIES com perfil de consulta a toda informação técnica e financeira dos Projectos Aveiro Digital no SAVAD.

Gestão da Avaliação no SAVAD

A utilização do SAVAD como ferramenta preferencial do Sistema de Avaliação Externa tem em conta a eficácia e utilidade do SAVAD como instrumento unificado e de integração de todos os processos de gestão associados aos Projectos Aveiro Digital. Assim, em 2005, foram criadas funcionalidades no SAVAD, que permitem produzir, arquivar, gerir e sistematizar todo o fluxo de informação entre a entidade avaliadora do Programa Aveiro Digital, CIES-ISCTE e as EBPs dos Projectos Aveiro Digital.

As funcionalidades no SAVAD do Sistema de Avaliação Externa, cuja operação é da exclusiva responsabilidade do CIES-ISCTE, dividem-se em 4 áreas: Informações; Documentos, Inquéritos e Resultados.

Foi também criada uma área adicional para cada um dos projectos que permite interagir com o SAE e consultar todas as informações, inquéritos e documentos que o CIES - ISCTE disponibilizou até ao momento para aquele projecto.

Para que o CIES - ISCTE possa operar no SAVAD, foi criado um perfil específico, que dá permissão aos seus técnicos para utilizar as funcionalidades desenvolvidas para o SAE e dá permissão de consulta à informação que o SAVAD disponibiliza sobre os projectos, nomeadamente, Plano Técnico e Financeiro, Resultados Técnicos já entregues, toda a informação sobre a Gestão Financeira, Gestão da Formação e Gestão da Certificação.

De seguida, faz-se uma breve descrição das funcionalidades desenvolvidas no SAVAD para apoiar o Sistema de Avaliação Externa do Programa Aveiro Digital.

Gestão da Avaliação no SAVAD – Página de Entrada do CIES

A página de entrada do SAE no SAVAD mostra aos técnicos do CIES - ISCTE as últimas informações, inquéritos e documentos que disponibilizaram aos projectos de uma forma estruturada, permitindo que facilmente tenham acesso a toda a documentação produzida através do SAE.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt

SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

Portugal Digital **POSI** 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO EXTERNA

Informação em Destaque

teste de email de reply
teste de email de reply

[+ Ver Mais](#)

► [Listas de Informações](#)

Inquéritos Activos

Inquérito	Início	Fim

Lista de Documentos

Documento	Data
Relatório Fase I - Sistema de Avaliação Externa do Programa Aveiro Digital 2003-2006	14/11/2005
Fase II - Matrizes 1.1, 1.2 e 2	14/11/2005

SAVAD – Página de Entrada no SAE

Gestão da Avaliação no SAVAD – Informações

Esta área de trabalho tem como objectivo permitir ao CIES – ISCTE enviar todas as informações que pretende distribuir pelos Projectos e, automaticamente, gerar um arquivo dessas informações. A página de entrada da área “Informações” disponibiliza a funcionalidade “Inserir Informação”, mostrando também a Lista de Informações por enviar e a Lista de Informações Enviadas, arquivadas por ordem cronológica de envio.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt

SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

Portugal Digital **POSI** 

SAE - Informações

Inserir Informação

+ [Criar nova Informação](#)

Lista de Informações por Enviar


Informação	Ações	Data

Lista de Informações Enviadas

Informação	Data
teste de email de reply	07/12/2005
Matrizes Fase II do SAE-PAD: data limite ultrapassada	05/12/2005
Fase II do SAE-PAD: pedido de preenchimento de matrizes	14/11/2005
Informações sobre o CIES-ISCTE - Instituição responsável pelo SAE-PAD 2003-2006	14/11/2005

SAVAD – SAE – Informações – Página de entrada

A funcionalidade “Inserir Informação”, permite criar uma nova informação, que tem uma estrutura tipo Título, Resumo e Corpo da Informação. Quaisquer Informações do CIES – ISCTE para os projectos Aveiro Digital são enviadas através desta funcionalidade.

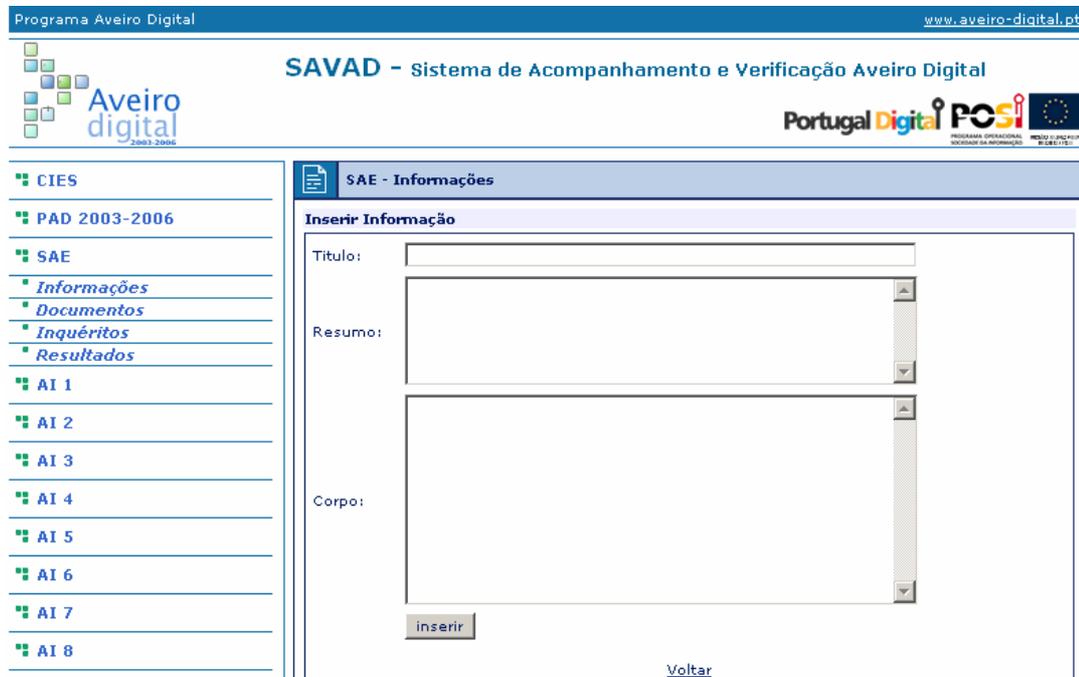


SAVAD – SAE – Informações – Criação de nova Informação

Após Inserir a nova Informação, esta fica disponível na Lista de Informações a Enviar, com informação da data em que foi criada e com 2 acções possíveis: “Ver” – acção que permite visualizar a Informação para verificar se corresponde ao pretendido e “Enviar” – acção que desencadeia o processo de envio da Informação para os Projectos.




SAVAD – SAE – Informações – Lista de Informações por Enviar

Quando se desencadeia a acção Enviar, podem ser seleccionados como receptores todas Áreas de Intervenção, algumas ou apenas só uma das Áreas de Intervenção.

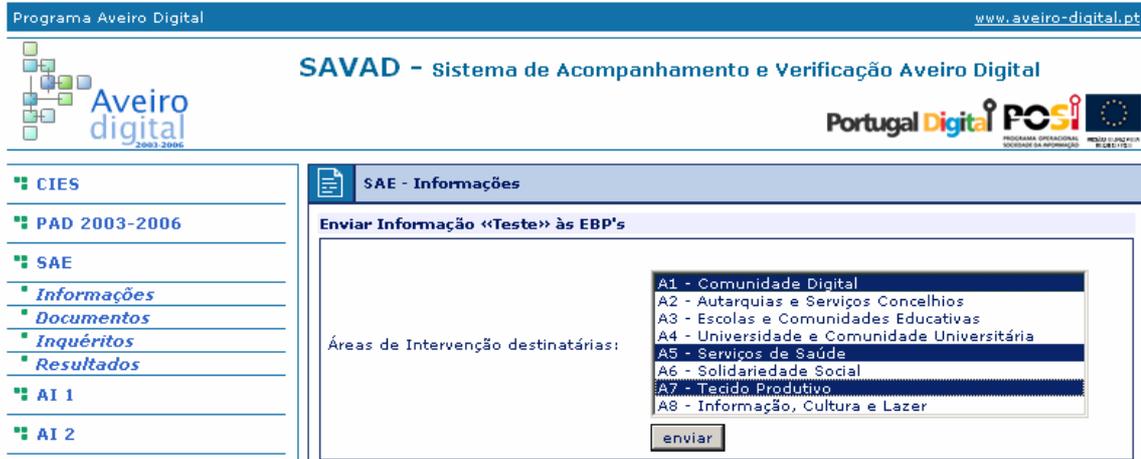

SAVAD – SAE – Informações – Áreas de Intervenção destinatárias

Após selecção das Áreas de Intervenção associadas aos projectos receptores da informação, é possível seleccionar quais os projectos que vão receber a Informação.

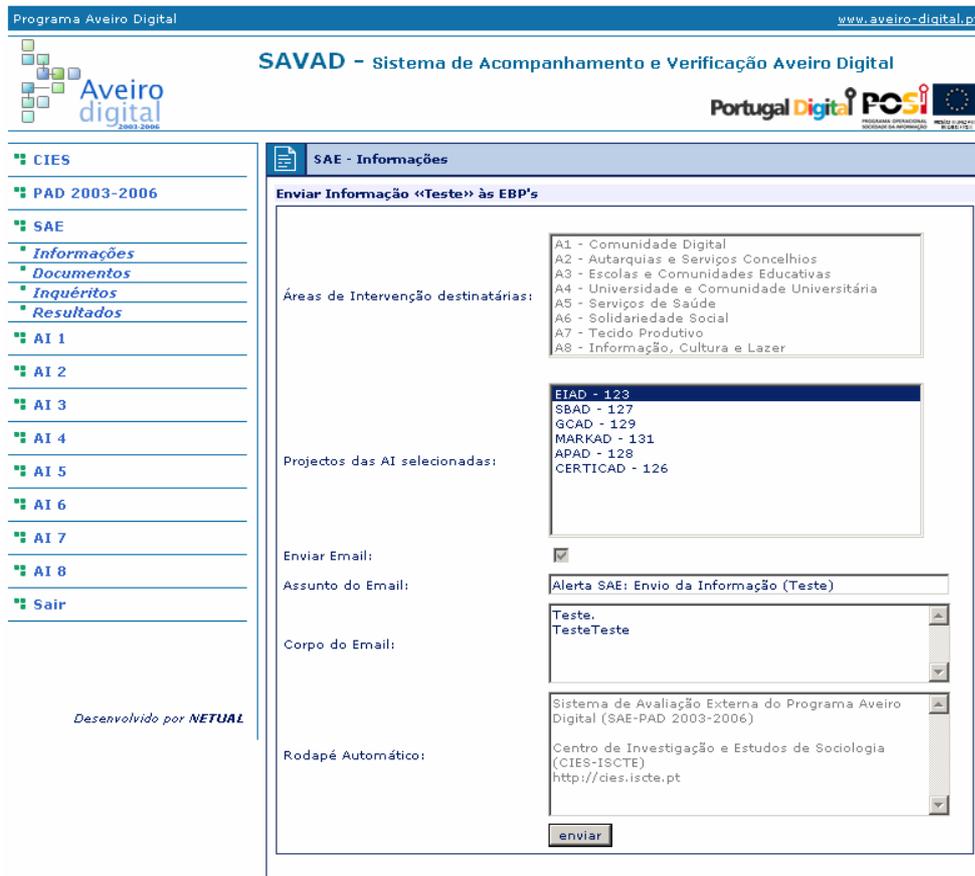

SAVAD – SAE – Informações – Projectos destinatários

Após definição dos Projectos que vão receber a Informação, para além dessa Informação ficar disponível na Área de Avaliação desses Projectos, o Gestor do projecto também recebe um mail com essa Informação, que é gerado automaticamente pelo SAVAD.

Gestão da Avaliação no SAVAD – Documentos

Esta área de trabalho tem como objectivo permitir ao CIES – ISCTE disponibilizar todos os documentos que pretende aos projectos Aveiro Digital, e, automaticamente, gerar um arquivo destes documentos, estando disponíveis as seguintes funcionalidades:

- “Inserir Documentos”: Inserção do ficheiro com o Documento através de um upload intuitivo e simplificado, sendo solicitada unicamente a introdução do nome do ficheiro e a respectiva localização.
- “Lista de Documentos”: Lista os Documentos já enviados e a respectiva data de envio

Quando é inserido um documento, o SAVAD gera uma notificação automática para todos os Gestores dos Projectos a informar que está um novo documento disponível na área da Avaliação dos Projectos.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt

SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

Portugal Digital **POSI**

SAE - Documentos

Inserir Documentos

Título

Ficheiro

Documento enviado com sucesso.

Lista de Documentos

Documento	Ações	Data
Teste	entregar	18/01/2006
Relatório Fase I - Sistema de Avaliação Externa do Programa Aveiro Digital 2003-2006	Enviado	14/11/2005
Fase II - Matrizes 1.1, 1.2 e 2	Enviado	14/11/2005

SAVAD – SAE – Documentos

Gestão da Avaliação no SAVAD – Inquéritos

Esta área de trabalho tem como objectivo permitir ao CIES – ISCTE construir e disponibilizar Inquéritos on-line aos projectos Aveiro Digital e, automaticamente, gerar um arquivo desses Inquéritos.

A página de entrada da área “Inquéritos” disponibiliza a funcionalidade “Inserir Inquérito”, mostrando também a Lista de Inquéritos por enviar e a Lista de Inquéritos Enviados, arquivados por ordem cronológica.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt

SAVAD - Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

Aveiro digital **Portugal Digital** **POSI**

SAE - Inquéritos

Inserir Inquérito

+ Criar novo Inquérito

Lista de Inquéritos por Enviar

Inquérito	Acções	Data

Lista de Inquéritos Enviados

Inquérito	Início	Fim

[CIES](#)
[PAD 2003-2006](#)
[SAE](#)
[Informações](#)
[Documentos](#)
[Inquéritos](#)
[Resultados](#)
[AI 1](#)
[AI 2](#)
[AI 3](#)
[AI 4](#)

SAVAD – SAE – Inquéritos

A funcionalidade “Inserir Inquérito”, permite construir um inquérito, que será disponibilizado on-line aos Projectos Aveiro Digital.

A construção de um Inquérito obedece a 3 passos: Produção do Inquérito, Edição do Inquérito e Envio do Inquérito.

1º Passo – Produção do Inquérito

O Primeiro passo tem como objectivo criar um Inquérito na Área do SAE no SAVAD. É atribuído um Título ao Inquérito e é ainda possível fazer uma breve descrição do Inquérito.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt

SAVAD - Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

Aveiro digital **Portugal Digital** **POSI**

SAE - Inquéritos

Inserir Inquérito

Título:

Descrição (facultativo):

[CIES](#)
[PAD 2003-2006](#)
[SAE](#)
[Informações](#)
[Documentos](#)
[Inquéritos](#)
[Resultados](#)
[AI 1](#)
[AI 2](#)
[AI 3](#)

SAVAD – SAE – Inquéritos – Produção

2º Passo – Edição do Inquérito

O segundo passo para construir o Inquérito é a inserção dos vários Itens que o constituem.

Na funcionalidade “Inserir novo Item”, no campo Texto, insere-se o Texto que se quer incluir no Inquérito (EX 1: Caracterização da Entidade; EX 2: Quantos trabalhadores tem a instituição?). Após a inserção deste texto é necessário associá-lo a um conjunto de características, que definam o formato do texto no Inquérito.

As características do texto são definidas através das seguintes funcionalidades:

1. Tipo de Item que pode assumir as seguintes formas:
 - 1.1. Título: Caso se queira inserir um sub – título no Inquérito (Ex: Caracterização da Entidade);
 - 1.2. Texto sem resposta: Caso seja necessário inserir alguma informação adicional (EX: Se respondeu Não à pergunta anterior, deve passar para a Pergunta nº 10);
 - 1.3. Resposta de texto limitada a 250 Caracteres;
 - 1.4. Resposta de texto limitada a 500 Caracteres;
 - 1.5. SIM/NÃO: As respostas possíveis são Sim ou Não;
 - 1.6. 1–3: As respostas possíveis são 1, 2 ou 3;
 - 1.7. 1–4: As respostas possíveis são 1, 2, 3 ou 4;
 - 1.8. 1–5: As respostas possíveis são 1, 2, 3, 4 ou 5;
 - 1.9. Uma única resposta seleccionada de um conjunto predefinido de hipóteses;
 - 1.10. Múltiplas respostas seleccionada de um conjunto predefinido de hipóteses.
2. Ordem: Define a ordem de entrada do Texto no Inquérito.
3. Obrigatório: Se a Pergunta for classificada como Obrigatória, só permite a entrega do Inquérito se esta Pergunta tiver resposta.

À medida que se forem inserindo Itens, eles são visíveis na página de Inserção de Novos Itens, permitindo visualizar o formato gráfico e de texto que constituem o Inquérito.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt

SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

Portugal Digital **POSI** 

PROGRAMA OPERACIONAL
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
ELECTRÓNICO

- CIES
- PAD 2003-2006
- SAE
 - Informações
 - Documentos
 - Inquéritos
 - Resultados
- AI 1
- AI 2
- AI 3
- AI 4
- AI 5
- AI 6

SAE - Inquéritos

Título do Inquérito: teste alterar Voltar

Inserir Novo Item

Texto:

Tipo de item:

Ordem:

Obrigatório:

Inquérito teste

SAVAD – SAE – Inquéritos – Edição

3º Passo – Envio do Inquérito

O terceiro passo na construção do Inquérito é a sua disponibilização aos projectos. Após concluído o conteúdo do Inquérito, este fica disponível na Lista de Inquéritos por Enviar, com informação da data em que foi criada e com 2 acções possíveis: “Ver” – acção que permite visualizar o Inquérito para verificar se corresponde ao pretendido e “Enviar” – acção que desencadeia o processo de envio do Inquérito para os Projectos. Quando se selecciona a opção enviar, é solicitada uma data limite para a entrega dos Inquéritos.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt

SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

Portugal Digital **POSI** 

PROGRAMA OPERACIONAL
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
ELECTRÓNICO

- CIES
- PAD 2003-2006
- SAE
 - Informações
 - Documentos
 - Inquéritos
 - Resultados
- AI 1
- AI 2
- AI 3

SAE - Inquéritos

Inserir Inquérito

+ Criar novo Inquérito

Lista de Inquéritos por Enviar

Inquérito	Acções	Data
teste	enviar ver	18/01/2006

Lista de Inquéritos Enviados

Inquérito	Início	Fim

SAVAD – SAE – Inquéritos – Envio

Quando se desencadeia a acção Enviar, pode-se seleccionar o envio do Inquérito para Projectos de todas as Áreas de Intervenção, para projectos de algumas Áreas de Intervenção ou para projectos de apenas uma Área de Intervenção

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt



SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital



- CIES
- PAD 2003-2006
- SAE
 - [Informações](#)
 - [Documentos](#)
 - [Inquéritos](#)
 - [Resultados](#)
- AI 1
- AI 2

SAE - Inquéritos

Enviar Inquérito «teste» às EBP's

Áreas de Intervenção destinatárias:

- A1 - Comunidade Digital
- A2 - Autarquias e Serviços Concelhios
- A3 - Escolas e Comunidades Educativas
- A4 - Universidade e Comunidade Universitária
- A5 - Serviços de Saúde
- A6 - Solidariedade Social
- A7 - Tecido Produtivo
- A8 - Informação, Cultura e Lazer

SAVAD – SAE – Inquéritos – Envio às EBP's

Após selecção das Áreas de Intervenção onde estão associados os projectos para quem se quer enviar o Inquérito, é possível seleccionar quais os projectos que vão receber a Inquérito.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt



SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital



- CIES
- PAD 2003-2006
- SAE
 - [Informações](#)
 - [Documentos](#)
 - [Inquéritos](#)
 - [Resultados](#)
- AI 1
- AI 2
- AI 3
- AI 4
- AI 5
- AI 6
- AI 7
- AI 8
- Sair

Desenvolvido por NETUAL

SAE - Inquéritos

Enviar Inquérito «teste» às EBP's

Áreas de Intervenção destinatárias:

- A1 - Comunidade Digital
- A2 - Autarquias e Serviços Concelhios
- A3 - Escolas e Comunidades Educativas
- A4 - Universidade e Comunidade Universitária
- A5 - Serviços de Saúde
- A6 - Solidariedade Social
- A7 - Tecido Produtivo
- A8 - Informação, Cultura e Lazer

Projectos das AI seleccionadas:

- EIAD - 123
- SBAD - 127
- GCAD - 129
- MARKAD - 131
- APAD - 128
- CERTICAD - 126
- SAISS - 45
- Estar - 225
- SAD-SOS - 147
- Incluinet - 171

Dada de Início da Edição:

Dada de Fim da Edição: (dd/mm/yyyy)

Enviar Email:

Assunto do Email:

Corpo do Email:

Vimos por este meio informar que foi disponibilizado o Inquérito teste. Depois de respondido, este inquérito deverá ser enviado ao SAE.

Rodapé Automático:

Sistema de Avaliação Externa do Programa Aveiro Digital (SAE-PAD 2003-2006)
 Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-ISCTE)
 http://cies.iscte.pt

SAVAD – SAE – Inquéritos – Envio às EBP's

Copyright © 2006, Comissão Executiva Aveiro Digital

72 / 181

Após definição dos Projectos que vão receber o Inquérito, o Gestor do projecto recebe um mail gerado automaticamente pelo SAVAD a informar que há um inquérito que deve ser preenchido até à data definida na Área de Avaliação do SAVAD associada ao seu Projecto.

Gestão da Avaliação no SAVAD – Resultados

Esta área de trabalho tem como objectivo permitir ao CIES – ISCTE ver os resultados associados aos Inquéritos que enviou aos Projectos, nomeadamente, a data em que o Inquérito foi enviado às EBPs, a data limite para responder ao Inquérito e o número de Inquéritos já entregues.

Também existe uma funcionalidade que permite exportar para Excel uma Matriz onde nas linhas aparecem os acrónimos dos Projectos, nas colunas as perguntas do Inquérito e nas células as respostas dadas por cada um dos Projectos.

The screenshot displays the SAVAD web application interface. At the top, there is a blue header with 'Programa Aveiro Digital' on the left and 'www.aveiro-digital.pt' on the right. Below the header, the main title 'SAVAD - Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital' is centered. To the left of the title is the 'Aveiro digital' logo, and to the right are logos for 'Portugal Digital', 'POSI', and the European Union. A left-hand navigation menu contains the following items: CIES, PAD 2003-2006, SAE (with sub-items: Informações, Documentos, Inquéritos, Resultados), AI 1, AI 2, AI 3, and AI 4. The main content area is titled 'SAE - Resultados' and contains a section 'Lista de Inquéritos Enviados'. Below this section is a table with the following headers: 'Inquérito', 'Início', 'Fim', 'Acções', and 'Respostas'. The table body is currently empty.

SAVAD – SAE – Resultados

Gestão da Avaliação no SAVAD – Projectos

Na área de Avaliação de cada um dos Projectos, é disponibilizada toda a informação que o CIES – ISCTE enviou para o Projecto, quer no formato de Informações, Inquéritos ou documentos e onde os Projectos respondem aos Inquéritos on-line.



SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

S.I.G.Ria



- GAD
- PAD 2003-2006
- SAE
- AI 1
- AI 2
 - SICAVIM
 - S.I.G.Ria
 - Plano Técnico e Fin.
 - Gestão Técnica
 - Gestão Formação
 - Gestão Certificação
 - Gestão Financeira
 - Avaliação
 - Ambi-Ria
 - Mobi-Ria
 - Secur-Ria
 - AEI
 - SAL- On Line
 - SEVER INFORMA
 - VAGOS-INFORMA
 - Ria-on-line
- AI 3
- AI 4
- AI 5
- AI 6
- AI 7
- AI 8
- Sair

SAE - Informação - S.I.G.Ria

Informação em Destaque

Fase II do SAE-PAD: pedido de preenchimento de matrizes

É com o maior prazer que anunciamos às EBP do PAD 2003-2006 a colocação em funcionamento de uma área no SAVAD para o Sistema de Avaliação Externa (SAE-PAD 2003-2006), a cargo da equipa do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-ISCTE).

Nela está já disponível para consulta o relatório correspondente à Fase I do SAE-PAD 2003-2006.

Encontram-se também disponíveis, na lista de documentos na área do SAE em cada um dos projectos, as matrizes 1.1, 1.2 e 2 para preenchimento.

[+ Ver Mais](#)

Lista de Informações

Lista de Inquéritos

Inquérito	Início	Fim	Entregue

Lista de Documentos

Título	Ficheiro	Data
Relatório Fase I - Sistema de Avaliação Externa do Programa Aveiro Digital 2003-2006	SAE-PAD Relatório Fase I.pdf	14/11/2005
Fase II - Matrizes 1.1, 1.2 e 2	Matrizes 1.1, 1.2 e 2 (fase II do SAE).doc	14/11/2005

SAVAD – Avaliação por Projecto

P 1.4 – Marketing e Promoção para ganhar a massificação

Este Projecto tem como objectivo principal a divulgação e promoção do Programa Aveiro Digital 2003–2006 e dos produtos e serviços implementados pelos vários Projectos deste Programa.

A regular comunicação pública ao longo das diferentes fases de execução do Programa Aveiro Digital e dos seus resultados é uma condição necessária para o estabelecimento de uma plataforma aberta e transparente para reforçar e expandir a rede de confiança social.

Neste âmbito, realizaram-se várias campanhas de marketing e promoção do Programa Aveiro Digital, através da divulgação constante nos órgãos de comunicação social, nomeadamente, press-releases, anúncios, entrevistas às EBPs dos Projectos Aveiro Digital. Organizaram-se iniciativas dirigidas ao público em geral e foi feita a distribuição massiva dos materiais promocionais Aveiro Digital a toda a população da região da AMRia.

As principais actividades realizadas em 2005, no âmbito deste Projecto, foram as seguintes:

Brochuras Aveiro Digital

Foi produzida uma edição de 2.000 exemplares de Brochuras Aveiro Digital que foi apresentada e distribuída no dia 1 de Julho, por ocasião da 1ª Exposição Aveiro Digital.

Esta brochura, apresenta os principais objectivos, metas e orçamentos comprometidos por Área de Intervenção e para cada Projecto Aveiro Digital e foi também amplamente distribuída às Entidades Beneficiárias Aveiro Digital, em iniciativas por estas promovidas e ainda nos Espaços Internet Aveiro Digital.

A produção desta brochura resultou da necessidade de divulgar e promover massivamente os produtos e serviços desenvolvidos nos 71 Projectos Aveiro Digital. Esta brochura é constituída por 71 páginas e constitui o Anexo 20.

Cartazes e Posters AD 2003–2006

Foram produzidos 1000 cartazes com as dimensões 500x700mm e 500 cartazes com as dimensões 1189x841mm, que são utilizados nos eventos promovidos pelo PAD, na identificação dos Espaços Internet Aveiro Digital e afixados nas instalações das Entidades Beneficiárias Aveiro Digital, para divulgar o Programa Aveiro Digital e os produtos e serviços criados. (Anexo 21)

Foram produzidos 85 Posters (grupo de 3 cartazes) de tamanho A0 (1189x841mm), para divulgação e promoção do Programa Aveiro Digital 2003–2006 nas 11 Câmaras Municipais da Região da AMRia e em espaços públicos, nomeadamente, Museus e Bibliotecas. Foram ainda afixados no local de exposição da iniciativa Expoflorestal, promovida pela Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, e ainda na FIACOPA 05 onde esteve representada a AMRia. (Anexo 22)

Todos estes materiais apresentam a imagem do Programa Aveiro Digital 2003–2006, contemplando em local visível e destacado a referência às entidades financiadoras de acordo com a regulamentação comunitária e nacional aplicável.




FIACOPA, Oliveira do Bairro



2ª Reunião de Concertação Aveiro Digital

Tapetes de Rato

Foram produzidos 10.000 tapetes de rato, que foram amplamente distribuído às Entidades Beneficiárias Aveiro digital, nos eventos promovidos pelo PAD, em iniciativas Municipais e das Juntas de Freguesia e ainda no âmbito da dinamização das Certificações em TIC, realizadas nos Espaços Internet Aveiro Digital. (Anexo 23)



Flyers

Foram produzidos 10.000 flyers, com as dimensões 105x148,5mm, em várias cores, com o objectivo de promover massivamente a Certificação em Competências Básicas e

estimular a população em geral à obtenção do Diploma em TIC. Foram distribuídos nos Espaços Internet Aveiro Digital. (Anexo 24)

Tarjas e Pendões

Foram produzidos 250 pendões, com as dimensões 800x3000mm e 12 tarjas para afixação em 4 totens, com as dimensões 6300x1200mm, em várias cores, para promoção da 1ª Exposição Aveiro Digital nos 11 Municípios da AMRia.

Nesta tarefa, contou-se com a colaboração dos Interlocutores Aveiro Digital, que procederam à afixação destes materiais nos locais mais visíveis de cada Município. (Anexo 25)

Neste âmbito, produziu-se ainda de uma tarja de dimensões 21.000x2.500mm, para o pórtico do Parque de Exposições de Aveiro.



Placas Melhor Espaço Internet Aveiro Digital

Foram produzidas 3 placas em aço inox, com as dimensões 350x250x3mm, com a inscrição “Prémio Melhor Espaço Internet Aveiro Digital– 2005” para atribuição dos prémios aos melhores Espaços Internet da AMRia, entregues na Sessão de Apresentação da Operação dos Espaços Internet Aveiro Digital, realizada em 3 de Julho. (Anexo 26)

Bonés e T-shirts AD

Em 2005 e no âmbito das actividades de divulgação do Programa Aveiro Digital 2003–2006, foram produzidos 10.000 bonés e 10.000 t-shirts, em diferentes cores e tamanhos, conforme formato adoptado em 2003.

O formato adoptado para a distribuição destes materiais incidiu fundamentalmente em iniciativas que envolveram crianças, jovens e idosos, promovidas pelos Municípios e Juntas de Freguesia da região da AMRia e ainda nos Espaços Internet Aveiro Digital.



Expoflorestal, Albergaria –a-Velha



Torneio Futebol – Incluinet

Distribuição do Material Promocional Aveiro Digital

Os materiais de divulgação e promoção Aveiro Digital foram massivamente distribuídos pela população da Região da AMRia, com especial incidência nos utilizadores dos Espaços Internet Aveiro Digital e em iniciativas Municipais e das Juntas de Freguesia que envolveram crianças, jovens e idosos. Nesta tarefa, contou-se com a colaboração dos Interlocutores Aveiro Digital que canalizaram os pedidos destes materiais ao GAD para validação das quantidades a distribuir.

De forma a contribuir para a info-inclusão dos participantes nas iniciativas, foi ainda oferecido a cada um dos participantes nas iniciativas, o Manual “Ensina o Teu Computador: Manual só para Miúdos”, contendo um convite à frequência dos EIAD existentes no município.

Foram inúmeros os eventos e iniciativas promovidas durante o ano de 2005 pelos diversos agentes de desenvolvimento da região da AMRia e pelo próprio Programa Aveiro Digital, que utilizaram materiais de promoção Aveiro Digital, tendo sido divulgada de forma massiva a imagem do Programa Aveiro Digital 2003–2006 junto de toda a população.



Expoflorestal, Albergaria –a-Velha



Expoflorestal, Albergaria –a-Velha

Data	Iniciativa	Organização	Materiais Aveiro Digital													
			Bónés	T-shirts	Manual Ensinha o Teu Computador	Tapetes de Rato	Cartazes	Cartazes A0	Tarjas	Conjunto de 3 Posters A0	Programas AD	Brochuras AD	Autocolantes	Guias Pontos Acesso Internet Portugal		
Jan-05	Escolas	Projectos e-Ria e Pormat			2800		90									
Fev-05	Dinamização EIAD Esgueira	Junta Freguesia Esgueira		60	60											
Fev-05	Associações	Projecto ADIRA			400		60									
Fev-05	Dinamização EIAD Municipal Águeda	CM Águeda														80
Fev-05	Dinamização EIAD Municipal Estarreja	CM Estarreja														80
Fev-05	Dinamização EIAD Municipal Ílhavo	CM Ílhavo														80
Mar-05	Expoflorestal	CM Albergaria-a-Velha	7	106	500		15			3						500
Abr-05	Dia Nacional Moinhos / Dia Mundial da Saúde	CM Aveiro / CM Oliveira Azeméis	44	44	40											40
Mai-05	Bugoturismo	Junta Freguesia Esgueira	500	210	300											
Mai-05	Dia do Ambiente	Divisão de Ambiente CM Aveiro	40	60	40											
Mai-05	Rally-Paper	CM e Serviços Municipaliz. Alb-a-Velha	50	50	50											
Mai-05	Dia Mundial da Criança	EIAD Préstimo / ATL	30	30	30											
Jun-05	Certificação em TIC do 3º ano – Escolas de Ílhavo	CM Ílhavo	250		250	250										
Jun-05	AMRia	Amria		29		22										
Jun-05	Dia Mundial da Criança	EIAD Canelas	10	10		10	10		1							
Jun-05	Certificação em TIC EIAD Ovar	EIAD Ovar	250	250	250	250										
Jun-05	Sessão Apresentação Projectos CM Ovar	CM Ovar		400	400	400										
Jun-05	V Festival de Benjamins	Associação Atletismo de Aveiro		25	50											
Jun-05	Certificação em TIC EIAD Municipal Estarreja	EIAD Municipal Estarreja			250	250										
Jun-05	Sessão Apresentação Projectos CM Aveiro	CM Aveiro	200	200	200	200										
Jun-05	I Torneio Futsal Cidade Aveiro	Sport Clube Beira Mar	300	300	300											300

Data	Iniciativa	Organização	Materiais Aveiro Digital												
			Bónés	T-shirts	Manual Ensinha o Teu Computador	Tapetes de Rato	Cartazes	Cartazes A0	Tarjas	Conjunto de 3 Posters A0	Programas AD	Brochuras AD	Autocolantes	Guias Pontos Acesso Internet Portugal	
Jun-05	Acto Público Apresentação do Projecto SIGRIA	AMRia	50	50	50	50									
Jun-05	Acção com Ensino Recorrente	Junta Freguesia Bustos	20	20	20	20									20
Jun-05	Campo Férias Verão 2005 / Festa da Juventude	Associação de Jovens de Eixo	31	31	25										25
Jun-05	Sessão Apresentação Projectos CM Oliveira Bairro	CM Oliveira Bairro	100	100	100	100									100
Jun-05	Certificação em TIC na FIACOBA	EIAD Municipal Oliveira bairro	400	400	400	400									320
Jun-05	Animar para Recordar	Junta Freguesia Vera Cruz	320		320										80
Jun-05	Campo de Férias	RedeEducativa	218	218	218	25									25
Jun-05	Certificação em TIC EIAD Municipal Aveiro	CM Aveiro	500	500	500										320
Jun-05	Actividade de Pesquisa e Escrita em Texto	EIAD Óis da Ribeira	30	30	30										30
Jun-05	Convívio em São Jacinto	Centro Cultural e Desport. da CM Aveiro	500	500	500	500									
Jun-05	Visita do Presidente da Rep à Cidade Aveiro	CM Aveiro	2	2	1	5				1					
Jun-05	Espaços Camarários da AMRia	CM da AMRia								31					
Jun-05	Projecto Felicidade	Divisão de Desporto CM Aveiro	50	50	50										
Jul-05	Reunião Concertação e Exposição AD	PAD 2003-2006	433	157		120			10				606		
Jul-05	Sessão Apresentação da Operação EIAD	EIAD	2350	2350	5853	2800	292	90			1950		2700		
Jul-05	Associações	Projecto ADIRA e SIGRED	189	189	299	299	165								
Jul-05	Promoção AD em Mira	CM Mira				220									
Jul-05	Certificação em TIC EIAD Municipal Ílhavo	CM Ílhavo	250			250									
Jul-05	Campo de Férias / Curte as Férias	Divisão Juventude CM Aveiro	130	130	130	130									

Data	Iniciativa	Organização	Materiais Aveiro Digital												
			Bónés	T-shirts	Manual Ensinha o Teu Computador	Tapetes de Rato	Cartazes	Cartazes A0	Tarjas	Conjunto de 3 Posters A0	Programas AD	Brochuras AD	Autocolantes	Guias Pontos Acesso Internet Portugal	
Jul-05	Torneio de Futebol	Instituições do Consórcio Proj. Includnet	270	270											
Jul-05	FIACOBA 05	Stand da AMRia	800	400	300	100				1		100		70	
Jul-05	Promoção AD no Museu de Aveiro e no IPM	Projecto MUSEAVE	15	15	15	25		1			15				
Jul-05	Dinamização EIAD Municipal Estarreja	CM Estarreja	50	50											
Jul-05	X Meia Milha da Praia da Vagueira	GRECAS	210	210	210	210									
Jul-05	Sessão Apresentação Projectos CM Estarreja	CM Estarreja				50						40			
Jul-05	Reunião Cidades e Regiões Digitais	MCTES				100						50			
Jul-05	Promoção AD nos Centros de infoinclusão	Projecto ISSI			55	55									
Jul-05	Dinamização EIAD Municipal Ovar	CM Ovar	400	400	400	400									
Jul-05	Ovar Lan Party 2005	Assoc. Comercial Ovar / CM Ovar	300		300	300									
Jul-05	Olimpíadas EIAD Silva Escura	EIAD Silva Escura	40	40	40	40									
Jul-05	Promoção AD na Rota da Luz	Projecto Tic & Tu				25									
Ago-05	Campo Férias	Divisão da Acção Social CM Aveiro	15	15	15	15									
Ago-05	Passeio de Idosos a Caldas Rainha	Junta de Freguesia Esgueira	350		350						350				
Set-05	Semana da Praia	Fundação Bernardo Barbosa	106	106	106						20				
Set-05	Concursos os Sabichões	Junta Freg. St. André Vagos / CM Vagos	40		40	40		1			40				
Set-05	Passeio de Cicloturismo	Agrupamento Escolas S. Bernardo	70	70	70	70					70				
Nov-05	3ª Reunião por AI	PAD 2003-2006					262	152			497	684			
Dez-05	Distribuição diversas – EB	EBs e Entidades Diversas	23	75	533	1929	418	28	5	0	0	405	440	69	
Total			9943	8402	17100	9710	1312	282	6	36	2942	1885	3140	2139	

www.aveiro-digital.pt

O site do PAD 2003–2006 foi regularmente actualizado ao longo do ano de 2005, com toda a informação relativa às actividades desenvolvidas. Adicionalmente o site apresenta informação detalhada sobre os 77 Projectos em execução e os documentos relevantes produzidos pelo PAD, tendo sido registada em 2005 uma média de 73 mil acessos mensais.

O site www.aveiro-digital.pt é um instrumento fundamental de comunicação e divulgação do Programa, das iniciativas e dos resultados já realizados, nomeadamente os 91 Espaços Internet Aveiro Digital em operação na Região da AMRia.

São ainda destacadas no site, as notícias relevantes publicadas nos OCS sobre o Programa e os seus 77 Projectos em curso.

Programa Aveiro Digital Sábado, 14 de Janeiro de 2006 www.aveiro-digital.pt

Aveiro digital 2003-2006

Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

POS PROGRAMA OPERACIONAL SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Portugal Digital UNÃO EUROPEIA FEDER / FSE

- [Apresentação](#)
- [Projectos](#)
- [Serviços](#)
- [Documentação](#)
- [Outros Destinos](#)
- [Contactos](#)

DESTAQUES

- Prémios Melhor Espaço Internet - 2º Semestre 2005
- Aveiro digital...mais próximo de si!
- Intervenção do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Aveiro, 1 de Julho de 2005
- Press Release - 2ª Reunião de Concertação e 1ª Exposição Aveiro Digital
- Programa Aveiro Digital: Relatório de Actividades - 2004

AGENDA DA SEMANA

Não existem eventos agendados para esta semana, até ao presente momento. [\[Ver todos os eventos\]](#)

NOTÍCIAS DE IMPRENSA

- Região de Turismo Rota da Luz tem novo Portal (20-12-2005)
- Espaço Internet continua a atrair milhares em Albergaria-a-Velha (06-12-2005)
- Projecto INFORDICO: Museu Marítimo lança arquivo de memórias da pesca do bacalhau (03-11-2005)
- Projecto AEI: Página da Câmara Municipal de Estarreja regista mais de 200 mil visitas e vai ter novidades (02-11-2005)
- Projecto ISSI: Instituições de apoio social lançam rede para fomentar a info-inclusão (21-10-2005)

[\[Notícias Anteriores\]](#)

Espaços Internet Aveiro Digital

Acesso GEIAD >>

Águeda
Albergaria-a-Velha
Aveiro
Estarreja
Ílhavo
Mira
Murtosa
Oliveira do Bairro
Ovar
Sever do Vouga
Vagos

Correio Electrónico

Já tem uma caixa de correio electrónico?

Sim » [Acesso à Caixa](#)
Não » [Criar Caixa](#)

Atalhos de acesso ao menu: ALT + Letra sublinhada

Visitantes: 2690445

Promoção e divulgação na Comunicação Social

Para dar, aos órgãos de comunicação social, conhecimento atempado sobre as iniciativas Aveiro Digital, foram antecipadamente enviados Press Releases, sobre as iniciativas realizadas. (Anexo 27)

Em 2005 foram realizadas diversas campanhas publicitárias e de divulgação do PAD, através dos OCS. Do tratamento desta informação pelos órgãos de comunicação social,

bem como da cobertura das iniciativas que estes fizeram, resultaram várias notícias nos órgãos de comunicação locais, regionais e nacionais. (Anexo 28)

Divulgação da iniciativa “IRS na Internet”

Foi desenvolvida uma campanha publicitária em rádios e jornais, tendo como objectivo divulgar a iniciativa “IRS na Internet” que decorreu nos Espaços Internet Municipais da Região da AMRia. A selecção dos rádios e jornais teve em conta a abrangência territorial de cada um deles, garantindo a cobertura da região da AMRia. Neste âmbito, foram seleccionadas 6 rádios em diferentes Municípios da AMRia, tendo a campanha decorrido entre 29 de Fevereiro e 14 Março de 2005.

No que se refere à imprensa, foram seleccionados 9 jornais de municípios diferentes da região da AMRia. Para a promoção desta iniciativa nos jornais foi colocado anúncio em 1/8 de página, (Anexo 29). No Relatório da Iniciativa IRS na Internet, Anexo 10, encontra-se uma descrição detalhada desta divulgação.

Divulgação da iniciativa “Diploma em CB em TIC”

Foi desenvolvida uma campanha publicitária em rádios e jornais, tendo como objectivo a promoção e divulgação do Diploma em Competências Básicas em TIC e estimular a obtenção deste Diploma nos Espaços Internet Municipais da Região da AMRia. A selecção dos rádios e jornais teve em conta a abrangência territorial de cada um deles, garantindo a cobertura da região da AMRia.

Neste âmbito, foram seleccionadas 5 rádios em diferentes Municípios da AMRia, tendo a campanha decorrido na primeira quinzena de Junho. No que se refere à imprensa, foram seleccionados 4 jornais de Municípios diferentes, tendo a campanha decorrido igualmente na primeira quinzena de Junho com a publicação de um Texto de divulgação do Diploma em CB em TIC, em 1/2 página e um anúncio dos EIAD Municipais, em 1/8 de página. (Anexo 30)

Campanha “Aveiro digital...mais próximo de si!”

Para dar a conhecer o trabalho e os resultados do Programa Aveiro Digital, a CEAD decidiu lançar a Campanha ““Aveiro digital...mais próximo de si!””, onde 50 EBPs dos Projectos Aveiro Digital falaram sobre os novos produtos e serviços criados e sobre a sua aplicação e utilidade.

Esta campanha publicitária, que decorreu entre 28 de Maio e 15 de Agosto de 2005, baseou-se na realização de 50 entrevistas, em formato áudio e texto, na captação de fotografias e pela sua sincronizada publicação e emissão nos jornais e nas rádios. (Anexo 31)

A calendarização desta campanha foi a seguinte:

Rádios-FM	Emissões	Horário	Jornais	Edições
Rádio Antena Vareira 98.7 MHz	11-Jun	11:00	Jornal Praça Pública	15-Jun
	18-Jun	11:00		22-Jun
	25-Jun	11:00		29-Jun
	02-Jul	11:00		06-Jul
	09-Jul	11:00		13-Jul
Rádio Aveiro FM 96.5 MHz	28-Mai	11:30	Diário de Aveiro	30-Mai e 03-Jun
	04-Jun	11:30		06-Jun e 10-Jun
	11-Jun	11:30		13-Jun e 17-Jun
	18-Jun	11:30		20-Jun e 24-Jun
	25-Jun	11:30		27-Jun e 01-Jul
	02-Jul	11:30		04-Jul e 08-Jul
	09-Jul	11:30		11-Jul e 15-Jul
	16-Jul	11:30		18-Jul e 22-Jul
	23-Jul	11:30		25-Jul e 29-Jul
	30-Jul	11:30		01-Ago e 05-Ago
Rádio Terra Nova 105 MHz	18-Jun	12:00	Jornal Correio do Vouga	22-Jun
	25-Jun	12:00		29-Jun
	02-Jul	12:00		06-Jul
	09-Jul	12:00		13-Jul
	16-Jul	12:00		20-Jul
Rádio Soberania 99.3 MHz	04-Jun	12:30	Jornal Beira Vouga	16-Jun
	18-Jun	12:30		01-Jul
	02-Jul	12:30		15-Jul
	16-Jul	12:30		01-Ago
	30-Jul	12:30		16-Ago

A metodologia definida pela CEAD, que serviu de orientação à realização desta campanha, foi baseada nos seguintes documentos: Plano e Calendário; Linhas Gerais de Orientação para a Produção; Textos de Introdução por AI; Textos de Separação e Conclusão; Ficheiros com Logos para Impressão Tipográfica. (Anexo 32)

Divulgação da 2ª Reunião Concertação e 1ª Exposição AD

Foi desenvolvida uma campanha publicitária em rádios e jornais, tendo como objectivo divulgar massivamente a realização da 2ª Reunião de Concertação e 1ª Exposição Aveiro Digital. A selecção dos rádios e jornais teve em conta a abrangência territorial de cada um deles, garantindo-se que a sua combinação, tanto ao nível das rádios como dos jornais, cobrisse a totalidade da região da AMRia.

Neste âmbito, foram seleccionadas 5 rádios em diferentes Municípios da AMRia, tendo a campanha decorrido na segunda quinzena de Junho. No que se refere à imprensa, foram seleccionados 4 jornais de Municípios diferentes da região da AMRia. A promoção da 2ª Reunião Concertação e 1ª Exposição Aveiro Digital nos jornais decorreu na segunda quinzena de Junho.

A divulgação da 1ª Exposição AD, contou ainda com a colocação de banners publicitários, de 27 de Junho a 2 de Julho, em dois jornais on-line desta região.

No Relatório da 2ª Reunião de Concertação e 1ª Exposição Aveiro Digital encontra-se uma descrição detalhada dos materiais e processo desta divulgação.

Publicações

Em 2005, e com o objectivo de divulgar amplamente o Programa Aveiro Digital e a sua execução a nível nacional, realizaram-se várias publicações do Programa e dos Projectos Aveiro Digital:

- Divulgação do Programa Aveiro Digital na revista Qualidade Online – País Positivo, com encarte inserido no Jornal Público na edição nº 4 de 2/Abril/05, designado “Cidade e Regiões Digitais” e aquisição de um rodapé publicitário no formato 18,5x4 cm;
- Divulgação do Programa Aveiro Digital no Suplemento do Jornal Expresso na sua edição de 8 de Dezembro, sobre o XV Congresso da Associação Nacional de Municípios e aquisição de um rodapé publicitário no formato 8,6cmx26cm;

Outras iniciativas de Promoção e Divulgação

Portal Cidades e Regiões Digitais

A actualização da informação sobre o PAD no Portal www.cidadesdigitais.pt, foi executada regularmente pelo GAD durante o ano de 2005. Assim foram publicadas as iniciativas PAD e dos Projectos AD, as notícias dos OCS da Região e os press releases oficiais. (Anexo 33)

Rede de Painéis Piar

Para que os cidadãos tenham conhecimento sobre as iniciativas Aveiro Digital, foram regularmente colocadas on-line no painéis Piar, localizados nos Municípios de Aveiro, Estarreja e Ílhavo, informação sobre cada uma dessas iniciativas, nomeadamente as iniciativas “IRS na Internet”, “O Diploma em TIC”, “1ª Exposição AD”. (Anexo 34)

Iniciativa Delta Cafés

Em 2005 foram retomados os contactos com departamento de Marketing da Delta Cafés, para a divulgação dos serviços Aveiro Digital nos pacotes de açúcar distribuídos na Região da AMRia. Na sequência do interesse manifestado por parte da Delta Cafés, realizou-se uma reunião em 06.12.05 em Campo Maior, nas instalações da Delta Cafés com a Dr.ª Vera Grilo.

Esta reunião resultou na formalização das propostas de lay-out de uma das faces dos pacotes de açúcar e textos associados, para integrarem na Campanha de Promoção Aveiro Digital para o ano de 2006. (Anexo 35)

Produção e Participação em Eventos

1ª Exposição Aveiro Digital

Nos dias 1, 2 e 3 de Julho, realizou-se em Aveiro, a 1ª Exposição Aveiro Digital, que ocorreu em paralelo com a 2ª Reunião de Concertação, oficialmente abertos numa cerimónia pública presidida pelo Sr. Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Sr. Prof. Dr. José Mariano Gago.

A Reunião de Concertação e a Exposição Aveiro Digital assumiram carácter público e aberto, não só a toda a população da Região, mas também às Entidades Promotoras de Projectos de Cidades e Regiões Digitais, tendo sido amplamente divulgadas nos OCS.



No Relatório da 2ª Reunião de Concertação Global e 1ª Exposição Aveiro Digital encontra-se uma descrição detalhada desta iniciativa.

Para a realização desta iniciativa, foi assegurada a cobertura áudio, vídeo e de fotografia da 2ª Reunião de Concertação e 1ª Exposição AD para posterior reutilização como material de divulgação das actividades Aveiro Digital. Assim procedeu-se à captura de imagens vídeo em formato profissional DVCAM digital e à produção de 300 fotografias em formato digital.

Exposição das Cidades e Regiões Digitais – XV Congresso da ANMP

O Programa Aveiro Digital participou na Exposição das Cidades e Regiões Digitais, associada ao XV Congresso da ANMP, realizada nos dias 9 e 10 de Dezembro, no Porto, para demonstrar os Serviços Aveiro Digital mais directamente relacionados com as Autarquias Locais, com a demonstração de 13 Projectos Aveiro Digital. Nesta exposição procedeu-se à distribuição de material promocional Aveiro Digital, nomeadamente Programas Aveiro Digital e Brochuras Aveiro Digital.

Produção e realização de imagens

Sistematicamente foram produzidas e recolhidas imagens de vídeo e fotografias, com o objectivo de documentar todas as actividades realizadas e promovidas pelo Programa Aveiro Digital. Além das iniciativas próprias do Programa contou-se com a colaboração das entidades promotoras de outras iniciativas para a apresentação de fotografias em formato digital que evidenciem a utilização dos materiais promocionais Aveiro Digital.

Apresenta-se de seguida uma selecção de fotos referentes aos diversos eventos:



1º Torneio Cidade de Aveiro – FUTSAL (Beira Mar)



CB TIC EIAD Ílhavo



Dia do Ambiente – CM Aveiro



EIAD Óis da Ribeira



Felizdade – CM Aveiro



Convívio em São Jacinto



Passeio de Cicloturismo-CMA e Agrup. Escolas SBernardo



Expoflorestal, Albergaria-a-Velha



Rally Paper – CM Albergaria-a-Velha



Rally Paper – CM Albergaria-a-Velha

P 1.5 – Aprender e Partilhar Aveiro Digital

No Projecto Aprender e Partilhar Aveiro Digital contemplam-se actividades de partilha e divulgação de âmbito nacional e internacional das metodologias e resultados associados ao Programa Aveiro Digital 2003–2006, enquadradas em iniciativas para a promoção do desenvolvimento da SI. Assim, pretende-se identificar e seleccionar iniciativas, com elevada pertinência no âmbito das cidades e regiões digitais, perspectivando-se a colaboração em iniciativas concretas e o estabelecimento de parcerias, nomeadamente, com entidades nacionais e internacionais envolvidas em processos semelhantes.

As principais actividades realizadas em 2005, no âmbito deste Projecto, foram as seguintes:

Participação em Iniciativas Internacionais

O Programa Aveiro Digital participou no Seminário Transnacional “Qualidade de vida através de Cidades Médias”, realizado em Valência nos dias 27 e 28 de Outubro, organizado pela rede CIUMED através da apresentação “For more social, economic and cultural development of the AMRia Region”. (Anexo 36)

Participações em Programas Televisivos

O Programa Prós e Contras, transmitido pela RTP 1 no dia 25 de Abril, convidou a Comissão Executiva do Programa Aveiro Digital, para participar numa emissão subordinado ao tema “A Sociedade do Conhecimento”, tendo como objectivo a divulgação do Programa Aveiro Digital.

Exposições

O Programa Aveiro Digital esteve presente na Exposição Cidades e Regiões Digitais, organizada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, integrada no XV Congresso da ANMP, com a demonstração de 13 projectos Aveiro Digital com relevância para os municípios portugueses.



Exposição Congresso ANMP – Porto – 9 e 10.12.05



Exposição Congresso ANMP – Porto – 9 e 10.12.05

Participação em Conferências, Fóruns e *Workshops*

A Comissão Executiva Aveiro Digital esteve presente nas Jornadas da Administração Local, organizadas pela revista Interface e realizadas em Tomar no dia 23 de Novembro. A Comissão Executiva também se fez representar no Encontro Regiões Digitais, organizado pela ESRI, realizado em Aveiro no dia 30 de Novembro.

Publicações

Durante o ano de 2005, algumas entidades editoriais convidaram a CEAD a produzir informação sobre o Programa Aveiro Digital 2003–2006 e sobre os Projectos em curso. Os textos produzidos foram integrados num conjunto de publicações nacionais relevantes.

Assim, o Programa Aveiro Digital 2003–2006 é referido na edição nº 2, de Março a Maio, da Revista Autárquica, no Dossier Tecnologias da Informação e Comunicação. (Anexo 37)

A Revista País Positivo, na sua edição nº 4, de Abril, distribuída com o jornal Público do dia 2 de Abril, refere o Programa Aveiro Digital numa matéria denominada “Cidades e Regiões Digitais”. (Anexo 38) A Revista e.Ciência, na sua edição nº 39 de 16 de Junho, refere o Programa Aveiro Digital num Dossier com o tema “Cidades e Regiões Digitais: o desenvolvimento de uma região”. (Anexo 39)

O Jornal de Negócios, na sua edição de 23 de Setembro, distribuiu um Dossier Especial subordinado ao tema Cidades e Regiões Digitais, onde faz referência ao Programa Aveiro Digital. (Anexo 40)

O Jornal Expresso, na sua edição de 8 de Dezembro, distribuiu um Dossier Especial sobre o XV Congresso da Associação Nacional de Municípios, onde faz referência ao Programa Aveiro Digital. (Anexo 41)

Foi também solicitado ao Programa Aveiro Digital um contributo para o livro sobre dinâmicas da Inovação e Conhecimento no Território do jornalista Jorge Nascimento Rodrigues e que foi enviado no dia 11 de Abril. (Anexo 42)

Enquadramento a estudos, mestrados e doutoramentos

Dadas as inúmeras solicitações no sentido de utilizar o Programa Aveiro Digital 2003–2006 como caso estudo para trabalhos de âmbito académico, a CEAD aprovou o seu enquadramento estabelecendo os termos de cooperação para este apoio. (Anexo 43)

Em 2005 foi prestado apoio a Bárbara Neves, no âmbito da sua Dissertação de Mestrado em Sociologia, subordinada ao tema “As Cidades Digitais e o Reforço da Cidadania” do

Instituto Superior de Ciências Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, orientada pelo Prof. Doutor João Bilhim.

Foi também prestado apoio a Dominic Page, estudante do Programa ERASMUS na Universidade de Aveiro, para a realização de uma pesquisa sobre os efeitos nas regiões do Programa Cidades e Regiões Digitais.

Foi prestado apoio a Maria Enói Natividade para a elaboração de um trabalho no âmbito do módulo Acções Intermunicipais da Pós Graduação em Gestão Autárquica da Faculdade de Economia do Porto, subordinado ao tema “Programa Aveiro Digital”, orientado pelo Prof. Dr. António Figueiredo. (Anexo 44)

Foi prestado apoio a Ana Paula Oliveira para a elaboração de um estudo empírico no âmbito da Pós Graduação em Gestão Financeira da Universidade de Coimbra, subordinado ao tema “Balanced Scorecard aplicado à Sociedade do Conhecimento – O caso Aveiro Digital”, orientado pelo Prof. Doutor António Martins. (Anexo 45)

Foi prestado apoio a Bruno Curto para a elaboração do relatório de estágio curricular, realizado no POSI, da licenciatura de Economia do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, subordinado ao tema “Cidades e Regiões Digitais – o exemplo de Aveiro Digital”, orientado pela Prof. Dra. Isabel Salavisa. (Anexo 46)

Foi prestado apoio à empresa Edinfor para a elaboração de um Case Study, denominado “Gestão de Espaços Públicos de Internet Aveiro Digital – A Edinfor ao serviço da comunidade digital”. (Anexo 47)

Protocolos

O Madeira Tecnopolo, SA, entidade responsável pela gestão do Programa Madeira Digital, solicitou ao Programa Aveiro Digital uma demonstração do SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital, para avaliar a sua potencial aplicação para a gestão do Programa Madeira Digital, que foi realizada no dia 17 de Janeiro.

O Madeira Tecnopolo, SA considerou pertinente utilizar a aplicação SAVAD para a gestão do Programa Aveiro Digital, tendo sido estabelecido um protocolo entre a AAD, a AMRia e a Madeira Tecnopolo, SA com vista à partilha de soluções, instrumentos e métodos de gestão técnica e financeira dos Programas Aveiro Digital e Madeira Digital. (Anexo 48)

Participação noutras iniciativas

O Programa Aveiro Digital esteve presente na Sessão de Apresentação Pública do Projecto Évora Distrito Digital, realizada em Évora em 19.04.05.



Apresentação Évora Distrito Digital - Évora - 19.04.05



Apresentação Évora Distrito Digital - Évora - 19.04.05

P 1.6 – Serviço de Certificação em Competências Básicas nas TIC

O Projecto P 1.6 – Serviços de Certificação em Competências Básicas nas TIC tem como objectivo principal a gestão dos Serviços de Certificação em Competências Básicas nas TIC, de acordo com o D.L. 140/2001, respeitando as orientações e modelo de execução aprovado pela CEAD.

De acordo com os compromissos assumidos no Programa Aveiro Digital 2003–2006, contratualizados com o POSI através da Medida 1.1, pretende-se atingir 45.000 certificações em Competências Básicas nas TIC. Estão já comprometidas 25.491 Certificações através dos 71 Projectos Aveiro Digital, actualmente em curso.

As restantes 19.509 CCBTIC serão executadas através das Iniciativas Horizontais baseadas na rede dos 11 EIAD Municipais a operar na Região da AMRia e através das iniciativas próprias das 102 Entidades Credenciadas pela CEAD para a Certificação de Competências Básicas.

Para as candidaturas ao Programa Aveiro Digital 2003–2006 realizadas no âmbito dos dois concursos públicos Aveiro Digital foi mandatária a indicação do número de certificações em competências básicas a realizar em cada um dos Projectos. Assim, os 71 Projectos aprovados no âmbito dos dois Concursos Aveiro Digital contemplam 25.491 certificações em competências básicas nas TIC, mostrando o quadro seguinte o número de certificações comprometido e realizado em 2005 por Área de Intervenção:

Projecto	Compromisso	Registo nos Projectos		Registo no P1.6	
		Nº	%	Nº	%
AI 2	3.784	451	11,9%	503	13,3%
AI 3	6.480	4.978	76,8%	5.299	81,8%
AI 4	10.000	738	7,4%	738	7,4%
AI 5	385	131	34,0%	44	11,4%
AI 6	523	218	41,7%	238	45,5%
AI 7	1.979	292	14,8%	510	25,8%
AI 8	2.340	729	31,2%	739	31,6%
Totais	25.491	7.537	29,6%	8.071	31,7%

A CEAD, tendo em conta a legislação que regula o Processo de Certificação em Competências Básicas nas TIC, aprovou o Modelo de Execução da Medida 1.1 e seleccionou como Entidades Credenciadas para a Certificação das Competências Básicas nas TIC, no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003–2006, um conjunto de Entidades Beneficiárias que reúnem as condições necessárias para prestarem serviços de certificação, de acordo com a legislação aplicável.

O quadro seguinte evidencia as Certificações em Competências Básicas produzidas através dos Espaços Internet Aveiro Digital e através das Entidades Beneficiárias Aveiro Digital credenciadas para este serviço de certificação.

Entidade Beneficiária Credenciada Aveiro Digital	Concelho	Executado
Centro de Formação de Professores de Águeda	Águeda	874
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Fermentelos	Águeda	26
Escola Secundária Marques Castilho	Águeda	143
Instituto Duarte Lemos	Águeda	70
Abimota	Águeda	122
Centro de Formação de Professores de Albergaria-a-Velha	Albergaria-a-Velha	207
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos da Branca	Albergaria-a-Velha	82
Escola Básica Integrada de S. João de Loure	Albergaria-a-Velha	44
EIAD Municipal de Albergaria-a-Velha	Albergaria-a-Velha	472
Agrupamento de Escolas de Eixo	Aveiro	61
AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro	Aveiro	47
AMRia – Associação de Municípios da Ria	Aveiro	247
APPACDM	Aveiro	147
Associação Educ. e Valorização Rec. Humanos Distrito de Aveiro	Aveiro	79
Centro de Formação José Pereira Tavares	Aveiro	1308
EIAD Municipal de Aveiro	Aveiro	438
Universidade de Aveiro	Aveiro	738
Sub-Região de Saúde de Aveiro	Aveiro	44
Netual – Multimédia e Telecomunicações, Lda.	Aveiro	249
EIAD da Freguesia de Esgueira	Aveiro	287
Área Militar de São Jacinto	Aveiro	74
Activos e Recursos, Lda.	Aveiro	7
Centro de Formação de Professores Egas Moniz	Estarreja	98
Escola Básica dos 2º e 3º Padre Donaciano de Abreu Freire	Estarreja	60
Espaço Internet Municipal de Estarreja	Estarreja	91
Centro de Formação de Escolas do Concelho de Ílhavo	Ílhavo	1331
EIAD Municipal de Ílhavo	Ílhavo	217
CerciMira	Mira	13
Escola Básica Integrada da Torreira	Murtosa	94
EIAD Municipal de Murtosa	Murtosa	91
Associação de Solidariedade Social do Silveiro	Oliveira do Bairro	16
Centro de Formação de Professores de Oliveira do Bairro	Oliveira do Bairro	98
Escola Secundária de Oliveira do Bairro	Oliveira do Bairro	92
EIAD Municipal de Oliveira do Bairro	Oliveira do Bairro	571
Centro de Formação de Professores do Concelho de Ovar	Ovar	152
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos António Dias Simões	Ovar	280
Escola Secundária com 3º Ciclo Júlio Dinis	Ovar	40
Escola Secundária com 3º Ciclo José Macedo Fragateiro	Ovar	91
EIAD Municipal de Ovar	Ovar	308
Centro de Formação da Associação de Escolas de Sever de Vouga	Sever do Vouga	481
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Sever de Vouga	Sever do Vouga	119
Espaço Internet Municipal de Sever do Vouga	Sever do Vouga	318
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Dr. João Rocha-Pai	Vagos	142
EIAD Municipal de Vagos	Vagos	18
Total		10.487

A execução deste Projecto no ano de 2005 é objecto de descrição detalhada no Relatório de Progresso Material e Financeiro – 2005 da Medida 1.1.

ÁREA DE INTERVENÇÃO 2: AUTARQUIAS E SERVIÇOS CONCELHIOS

Introdução

Nesta Área de Intervenção estão em curso 10 Projectos, envolvendo as 11 Câmaras Municipais da Região da AMRia e a Associação de Municípios da Ria. Participam na execução 73 Pessoas, com um volume de trabalho de 765,52 HM. Ao nível da execução material, foram já verificados 161 Resultados documentais. Destacam-se os serviços desenvolvidos para a modernização administrativa, o planeamento e ordenamento do território, a gestão do cadastro, o ambiente, a mobilidade e a segurança. O orçamento desta Área de Intervenção é de 5.799.358€ tendo sido executado 3.266.150€, correspondente a uma taxa de execução financeira de 56,3%.

P 2.1. Cadastros Predial Rústico e Urbano Digital

SICAVIM, Refª PAD 017

Este Projecto, sofreu alguns atrasos mas está já em recuperação, tendo procedido ao carregamento, actualização e disponibilização das bases de dados cadastrais fornecidas pelo Instituto Geográfico Português nas 3 Câmaras Municipais do Consórcio, estando parte da informação já on-line. Foi feito um teste piloto numa das freguesias do Concelho de Mira para a verificação dos dados cadastrais, tendo a população oportunidade de se pronunciar e certificar a informação cadastral. Foi também feito o levantamento dos procedimentos para a gestão cadastral realizados entre as Conservatórias, as Câmaras Municipais e as Finanças dos três concelhos envolvidos. A execução financeira atingiu um total de 260.081€, que corresponde a uma taxa de execução de 52,6%.

P 2.2. SIG / Região da Ria de Aveiro

SIGRia, Refª PAD 001

Todo o equipamento e software adquirido já instalado e em operação. Foi definida a estrutura de base de dados, o modelo de dados e respectivos parâmetros para posterior integração e normalização da informação georeferenciada nos 11 Municípios e na AMRia. As 11 Câmaras Municipais têm carregado diversa informação georeferenciada nos SIGs Municipais, com destaque para os Planos Municipais de Ordenamento do Território, destacando-se a oferta on-line desde 23.06.05 de um conjunto de serviços SIG em todas as Câmaras Municipais da AMRia. A execução financeira atingiu um total de 1.883.436€, que corresponde a 69,8% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira, com um reforço

orçamental de 196.104€, para permitir a expansão das aplicações de gestão e o reforço da promoção e divulgação do Projecto.

P 2.3. Sistemas de Gestão Ambiental

Ambi-Ria, Refª PAD 140

Apesar de algum atraso inicial, já foi adjudicado algum do equipamento previsto e iniciado o processo de especificação e desenvolvimento das aplicações Ambi-Ria. Os trabalhos de elaboração dos Planos da Água dos 11 Municípios e da AMRia foram já adjudicados, encontrando-se em desenvolvimento. A execução financeira atingiu um total de 145.132€, que corresponde a 35,2% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com uma redução orçamental de 48.179,35€, devido à correcção do investimento em software e serviços de manutenção.

P 2.4. Sistemas Integrados de Mobilidade

Mobi-Ria, Refª PAD 138

Este Projecto regista atrasos significativos na sua implementação, embora tenham já sido especificados os equipamentos e sistemas a adquirir e a respectiva localização no sistema viário dos 4 Municípios envolvidos. A execução financeira atingiu um total de 18.131€, que corresponde a 4,5% do orçamento previsto para o Projecto.

P 2.5. Serviços de Segurança e Protecção Civil

Secur-Ria, Refª PAD 101

Apesar de algum atraso inicial, já foi adjudicado algum do equipamento previsto e iniciado o processo de especificação e desenvolvimento das aplicações Ambi-Ria. Os trabalhos de elaboração das Cartas de Segurança dos 11 Municípios e da AMRia foram já adjudicados, encontrando-se em desenvolvimento. A execução financeira atingiu um total de 105.255€, que corresponde a 24,5% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com uma redução orçamental de 31.894,63€, devido à correcção do investimento em software e serviços de manutenção.

P 2.6. Administração Local para o Cidadão

AEI, Refª PAD 020

Foi feita a instalação dos equipamentos adquiridos, das Intranets e dos webservices, bem como a integração das aplicações de back-office e front-office. Ficaram também disponíveis on-line todos os formulários, tendo sido iniciado o trabalho ao nível da

gestão documental. A execução financeira atingiu um total de 470.158€, que corresponde a 50,5% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com um reforço orçamental de 180.000€, para permitir a expansão das licenças de base de dados e acréscimo de software de digitalização para gestão documental.

Sal-On-Line, Refª PAD 016

Procedeu-se á instalação e operação dos equipamentos adquiridos, das Intranets e dos webservices. Foi feita a integração das aplicações de back-office e de front-office. Ficaram também disponíveis on-line todos os formulários, tendo sido iniciado o trabalho ao nível da gestão documental. A execução financeira atingiu um total de 470.158€, que corresponde a 50,5% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com um reforço orçamental de 305.611€, para permitir a expansão das licenças de base de dados e acréscimo de software de digitalização para gestão documental.

SeverInforma, Refª PAD 023

Neste Projecto há a registar a instalação e operação dos equipamentos adquiridos, a instalação e configuração da intranet e dos webservices, bem como a integração das aplicações das aplicações de back-office e front-office. Ficaram também disponíveis on-line todos os formulários, tendo-se iniciado o trabalho ao nível da gestão documental. A execução financeira atingiu um total de 93.254€, que corresponde a 50,4% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com um reforço orçamental de 60.000€, para permitir a expansão das licenças de base de dados e o acréscimo de software de digitalização para gestão documental.

VagosInforma, Refª PAD 018

Os equipamentos adquiridos estão instalados e em operação, a intranet foi instalada e configurada e estão em desenvolvimento os webservices, bem como a integração das aplicações das aplicações de back-office e front-office. Ficaram também disponíveis on-line todos os formulários, tendo-se iniciado o trabalho ao nível da gestão documental. A execução financeira atingiu um total de 123.876€, que corresponde a 66,9% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com um reforço orçamental de 60.040€, para permitir a expansão das licenças de base de dados e o acréscimo de software de digitalização para gestão documental.

P 2.7. Portal de Serviços da Administração Local

Ria-On-line, Refª PAD 141

Este Projecto foi objecto de uma alteração ao PTF para permitir a reutilização da plataforma já existente na AMRia integrando os serviços de interesse e utilidade para a região. Foram já adquiridos alguns equipamentos, e estão a ser especificadas as funcionalidades e serviços a contemplar. A execução financeira atingiu um total de 14.062€, que corresponde a 70,3% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com uma redução orçamental de 30.000€, devido à correcção do investimento em software e serviços de manutenção.

ÁREA DE INTERVENÇÃO 3: ESCOLAS E COMUNIDADES EDUCATIVAS

Introdução

Nesta Área de Intervenção estão em curso 5 Projectos, envolvendo 74 Entidades Beneficiárias. Participam na execução 31 Pessoas com um volume de trabalho de 290 HM. Já estão verificados 137 Resultados Documentais. Como factor a realçar destaca-se a participação da comunidade educativa: alunos, pais, encarregados de educação, professores e funcionários. O orçamento global desta Área de Intervenção é de 1.986.950€ tendo sido executado 1.157.656€, correspondente a uma taxa de execução financeira de 58%.

P 3.1. Serviços de Gestão e Administração da Rede Escolar

e-RIA, Refª PAD 060

As aplicações de back-office e de front-office estão em operação na maioria das escolas que participam no projecto. O desenvolvimento da Secretaria Virtual está em curso, com metas temporais definidas. Mantém-se, ainda, o processo de negociação com as empresas fornecedoras de aplicações de back-office, para garantir a total interoperabilidade das respectivas arquitecturas de bases de dados, que se prevê completo em Março de 2006. A execução financeira atingiu os 595.627€, o que corresponde a 70% do orçamento previsto para o Projecto.

P 3.2. Curricula Digital

PorMat:, Refª PAD 067

Está definido o fornecedor que irá desenvolver todos os módulos, tendo já sido iniciados os trabalhos de desenvolvimento da aplicação PORMAT. Paralelamente, estão prontas cerca de 700 aulas de Português e de Matemática, bem como o grafismo que se pretende utilizar na aplicação. A apresentação da primeira versão do está prevista para Março de 2006. A execução financeira atingiu os 143.253€, o que corresponde a 48% do orçamento do Projecto.

P 3.3. Serviços de Formação à Distância de Professores

Professor, Refª PAD 145

Já estão instalados os novos servidores, bem como disponibilizados os serviços básicos de http, correio electrónico e FTP, permitindo que os serviços de formação à distância dos professores através dos serviços Prof2000 tenham maior fiabilidade e disponibilidade. A execução financeira atingiu os 61.569€, o que corresponde a 49% do orçamento do Projecto.

P 3.4. Expansão e Consolidação das Comunidades Educativas

e-CMEI, Refª PAD 022

O equipamento está instalado em todos os Jardins-de-infância e em todas as Escolas do 1º Ciclo do Concelho de Ílhavo. Paralelamente, as aplicações de back-office e front-office estão em fase de desenvolvimento, prevendo-se que estejam operacionais durante o 1º trimestre de 2006. A execução financeira atingiu os 86.786€, o que corresponde a 66% do orçamento do Projecto.

Ria.EDU, Refª PAD 006

A aplicação já esta operacional e em utilização pelos professores, alunos e encarregados de educação, com funcionalidades específicas para cada um destes perfis. O projecto já está numa fase de expansão dos seus utilizadores. A execução financeira atingiu os 305.814€, o que corresponde a 38% do orçamento do Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira, com um reforço orçamental de 397.000€ para responder à necessidade de expansão de tecnologias de apoio pedagógico nas escolas, nomeadamente smart-boards.

ÁREA DE INTERVENÇÃO 4: UNIVERSIDADE E COMUNIDADE

UNIVERSITÁRIA

Introdução

Nesta Área de Intervenção estão em curso 6 Projectos, envolvendo 1 Entidade Beneficiária. Participam na execução 57 Pessoas com um volume de trabalho de 182 HM. Já estão verificados 130 Resultados Documentais. Como factores a realçar destacam-se a abrangência e complexidade dos Projectos em curso e a qualidade dos resultados apresentados. O orçamento global desta Área de Intervenção é de 1.974.479€, tendo sido executado 1.244.630€, correspondente a uma taxa de execução financeira de 63%.

P 4.1. Sistemas para a Gestão de Aquisição de Bens e Serviços

e–ABS, Refª PAD 008

Este projecto está com algum atraso relativamente ao Plano Técnico e Financeiro, tendo sido encontradas algumas dificuldades ao nível dos procedimentos internos e na transposição da legislação aplicável aos processos de aquisições por via electrónica. A execução financeira atingiu os 52.079€, o que corresponde a 52% do orçamento do Projecto.

P 4.2. Teletrabalho

SITUA, Refª PAD 009

O sistema de Gestão Documental encontra-se em fase de testes e consequentes ajustes ao software, seguindo-se a expansão do sistema nos diferentes serviços. O Centro de Recursos de e–Learning já se encontra em operação, prevendo-se também a interdependência do sistema de qualidade com a Gestão Documental. Está em curso a validação da arquitectura da Monitorização e Gestão Remota de Sistemas e Serviços Informáticos, seguindo-se a implementação de correcções. O back–office e a Secretaria Virtual do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos já se encontram instalados e em fase de testes. Os Indicadores de Gestão estão em fase de manuseamento pelos utilizadores finais e de integração de novos serviços. No Sistema Integrado de Infra–estruturas da UA já foi concluída a rasterização de 32 edifícios, estando o sistema de consulta e gestão em fase de testes. Falta completar a restante informação física e finalizar o sistema de gestão e redefinição do seu layout. A execução financeira atingiu os 658.420€, o que corresponde a 64% do orçamento do Projecto.

P 4.3. Contact–Ciência

ContactUA, Refª PAD 010

O Registo Central de Utilizadores, peça fundamental deste sistema, encontra-se em fase de testes, estando já em produção o layout que agregará todos os serviços disponibilizados. Os serviços já disponibilizados, ou em fase de testes, pelo projecto, são o Currícula Electrónico, o Serviço Noticioso, o Serviço de Correio Electrónico e Agenda, e o e-ABC (Arquivo Bibliográfico para produção Científica). A execução financeira atingiu os 146.474€, o que corresponde a 73% do orçamento do Projecto.

P 4.4. Biblioteca Digital da UA

SInBAD, Refª PAD 012

O projecto já implementou os serviços da Biblioteca Digital (Teses, Cartazes e Publicações Científicas), o Arquivo Digital (Fotográfico e Audiovisual) e o de Jazz estão em fase de testes. O serviço de Digitalização encontra-se em fase de contratação e o layout do sistema está a aguardar a versão final do portal geral. A execução financeira atingiu os 200.284€, o que corresponde a 48% do orçamento do Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira, com um reforço orçamental de 97.025€ para o desenvolvimento de um novo módulo de suporte à catalogação e visualização de peças – Museu Digital, e para garantir a digitalização das colecções de cerâmica, vidro e ferro doada por Madeira Luís.

P 4.5. ArteDigital

Natural, Refª PAD 108

Os produtos a serem desenvolvidos pelo projecto, são a Holografia, Padrões Moiré com o Dep. de Comunicação e Arte, as Perspectivas com o Dep. de Biologia, os Fractais com o Dep. de Matemática e as Estruturas de Informação com o Dep. de Física. O equipamento previsto já foi adquirido e instalado, estando já a ser utilizado para a produção dos materiais que estarão disponíveis a partir de Março. A execução financeira atingiu os 88.316€, o que corresponde a 44% do orçamento do Projecto.

P 4.6. Produção Multimédia para a Formação Profissional e Educação

RAldcal, Refª PAD 014

Este projecto conta já com alguns dos seus produtos e serviços concluídos, caso do Didaktos OnLine e do CD referente aos Anelídeos. Durante o segundo semestre de 2006 serão promovidos os serviços e produtos pedagógicos, com a distribuição gratuita de 2000 CD-ROMs, junto da população alvo. A execução financeira atingiu os 108.668€, o que corresponde a 49% do orçamento do Projecto. De realçar que este projecto foi

objecto de reprogramação financeira, com um reforço orçamental de 49.225€, para garantir a difusão alargada dos seus resultados junto do público escolar.

ÁREA DE INTERVENÇÃO 5: SERVIÇOS DE SAÚDE

Introdução

Nesta Área de Intervenção estão em curso 2 Projectos, envolvendo 17 Entidades Beneficiárias. Participam na execução 19 Pessoas com um volume de trabalho de 132 HM. Já estão verificados 50 Resultados Documentais. Como factores a realçar destacam-se a participação de todos os Hospitais e Centros de Saúde da região nos projectos e a instalação dos Data Centers no Hospital Infante D. Pedro e no Hospital Distrital de Águeda. O orçamento global desta Área de Intervenção é de 1.632.663€ tendo sido executado 963.066€, correspondente a uma taxa de execução financeira de 59%.

P 5.3 Serviços de Diagnóstico Remoto

RDSR, Refª PAD 039

A 1ª fase de instalação das plataformas de telediagnóstico está concluída, mas o projecto continua a ter obstáculos técnicos que não têm permitido a realização de teleconsultas, nomeadamente pelas dificuldades do IGIF na configuração das redes e rotas necessárias para a operação das plataformas. A execução financeira atingiu os 436.187€, o que corresponde a 48% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com um reforço orçamental de 63.000€, para permitir a expansão das funcionalidades e dos sistemas de telediagnóstico.

P 5.4 Saúde Online

RTS, Refª PAD 071:

O Projecto RTS tem recuperado os atrasos iniciais, estando já instalados os Data Centers do Hospital Infante D. Pedro e do Hospital Distrital de Águeda. Os Relatórios: Análise e de Processos e Fluxos de Informação, Planeamento Estratégico de Sistemas de Informação e Especificação Detalhada de Procedimentos estão finalizados e os protótipos da RTS estão já em desenvolvimento. A execução financeira atingiu os 552.122€, o que corresponde a 63% do orçamento previsto para o Projecto.

ÁREA DE INTERVENÇÃO 6: SOLIDARIEDADE SOCIAL

Introdução

Nesta Área de Intervenção estão em curso 6 Projectos com 29 Entidades Beneficiárias. Participam na execução 78 Pessoas com um volume de trabalho de 202 HM. Já estão verificados 131 Resultados Documentais. Como factores a realçar destacam-se os benefícios directos para as IPSS que advém da racionalização dos processos internos. Para os utentes e para a população em geral destaca-se a quantidade e diversidade dos serviços criados pelas Instituições envolvidas nestes Projectos. O orçamento global desta Área de Intervenção é de 1.087.599€, tendo sido executado 759.535€, correspondente a uma taxa de execução financeira de 70%.

P 6.1. Serviços de Gestão e Administração da Rede Social

SAISS, Refª PAD 015

O Projecto está com um ligeiro atraso nas tarefas de instalação das plataformas, mas no início de Janeiro o Processo Electrónico do Utente estará instalado e todas as aplicações estarão operacionais antes de 14 de Março. A execução financeira atingiu os 410.768,26€, o que corresponde a 57% do orçamento previsto para o Projecto.

P 6.2. Conteúdos Pedagógicos

Estar, Refª PAD 128

Este projecto apresenta uma execução técnica de acordo com o plano e as salas multimédia estão a funcionar, sendo intenção dar-lhes mais dinamismo. Os conteúdos pedagógicos já estão disponíveis on-line e prontos a serem utilizados pelas instituições. A execução financeira atingiu os 65.573,4€, o que corresponde a 82% do orçamento previsto para o Projecto.

P 6.4. Viver em Segurança

SAD_SOS, Refª PAD 102

Neste projecto os equipamentos estão adquiridos e a base de dados que servirá de apoio ao atendimento telefónico, está construída e a ser carregada com informação, falta no entanto proceder à sua integração com a central telefónica. A execução financeira atingiu os 32.546,63€, o que corresponde a 76% do orçamento previsto para o Projecto.

P 6.5. Inclusão Social na SI

Incluinet, Refª PAD 132

Todos os centros estão instalados e operacionais e o portal das instituições está disponível, a intenção futura é potenciar o portal e dinamizar os centros. A divulgação e promoção para sensibilizar, principalmente o público info-excluído, para o uso das TIC tem vindo a ser realizada. A execução financeira atingiu os 89.899,69€, o que corresponde a 81% do orçamento previsto para o Projecto.

ISSI, Refª PAD 133

O projecto está a decorrer dentro do normal, os centros de info-inclusão estão todos instalados e iniciaram-se em Novembro as actividades de dinamização dos mesmos. O portal, que será mais uma ferramenta na dinamização dos centros já está disponível. A execução financeira atingiu os 96.790,28€, o que corresponde a 67% do orçamento previsto para o Projecto.

P 6.8. Balcão Único de Solidariedade Social

AMRiaSocial, Refª PAD 113

A plataforma está operacional, no entanto falta integrar os 2 últimos módulos que ainda estão em desenvolvimento. Apesar da aposta já feita na promoção do serviço é necessária mais divulgação. A execução financeira atingiu os 91.389,6€, o que corresponde a 79% do orçamento previsto para o Projecto.

ÁREA DE INTERVENÇÃO 7: TECIDO PRODUTIVO

Introdução

Nesta Área de Intervenção estão em curso 31 Projectos, envolvendo 32 Entidades Beneficiárias. Na execução participam 128 Pessoas com um volume de trabalho de 1297 HM. Já estão verificados 494 Resultados Documentais. Como factor a realçar destaca-se a dinâmica demonstrada para a modernização do Tecido Produtivo da Região da AMRia. O orçamento global desta Área de Intervenção é de 2.876.634€, tendo sido executado 1.943.813€, correspondente a uma taxa de execução financeira de 68%.

P 7.1. Informar e Mobilizar para Inovar

Geo-MKT, Refª PAD 029

O Projecto Geo-MKT é a componente de divulgação e promoção dos serviços desenvolvidos pelo projecto GeoInvest. Como consequência das dificuldades de execução do projecto GeoInvest, o projecto Geo-MKT também foi desfasado temporalmente, tendo sido objecto de reprogramação técnica e financeira. A execução financeira atingiu os 36.401€, o que corresponde a 26% do orçamento previsto o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com uma redução orçamental de 31.274€, devido a uma correcção nos orçamentos dos Seminários que irão ser realizados.

P 7.3. Serviços de Turismo

TIC & TU, Refª PAD 112

Foi já adquirida a totalidade do equipamento e implementada e a plataforma de serviços e back-office associado foi colocada on-line. A Central de Reservas on-line está em fase de desenvolvimento e foi iniciada a especificação e desenvolvimento da Intranet de serviços para a Rota da Luz e Postos de Turismo associados. A execução financeira atingiu um total de 108.510€, que corresponde a 66,6% do orçamento previsto para o Projecto.

P 7.4. Zonas Industriais de Nova Geração

GeoInvest, Refª PAD 027

Após a conclusão do Estudo sobre os parâmetros de Localização das ZING's, foi iniciado o desenvolvimento da aplicação de localização das ZING's. No 2º semestre de 2005, devido à complexidade na formalização de direitos e procedimentos, o projecto GeoInvest teve um ritmo de execução muito baixo, tendo sido objecto de

reprogramação técnica e financeira. A execução financeira atingiu os 128.437€, o que corresponde a 44% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com uma redução orçamental de 33.092€, devido a uma correcção no investimento no desenvolvimento das aplicações que estão a ser implementadas.

P 7.5. Modernizar a Indústria, o Comércio e os Serviços

RED-AVEIRO, Refª PAD 072

O projecto teve problemas com o fornecedor seleccionado para o desenvolvimento das plataformas, ultrapassada essa fase algumas funcionalidades estão disponíveis e terão uma versão definitiva para testes em Janeiro de 2006. No entanto, este projecto, apresenta ainda atrasos significativos na execução técnica e financeira. A execução financeira atingiu os 38.639,33€, o que corresponde a 19% do orçamento previsto para o Projecto.

e-NL, Refª PAD 069

A plataforma está instalada e em operação. A formação está prevista para o início de 2006, como etapa final do projecto. A execução financeira atingiu os 41.220,47€, o que corresponde a 92% do orçamento previsto para o Projecto.

ESTAG, Refª PAD 033

A plataforma de serviços encontra-se em operação, num projecto praticamente concluído. A formação está prevista para o início de 2006. A execução financeira atingiu os 29.195,27€, o que corresponde a 87% do orçamento previsto para o Projecto.

FIG-NET, Refª PAD 031

Este Projecto está praticamente concluído e a plataforma de serviços encontra-se em operação; Alguma dificuldade na implementação da aplicação de gestão da produção, por se tratar de produtos inovadores e por isso susceptíveis de duplicação. A execução financeira atingiu os 29.585,68€, o que corresponde a 89% do orçamento previsto para o Projecto.

Inovortal, Refª PAD 032

O projecto adquiriu todo o equipamento que foi entretanto instalado e está em operação. As plataformas, o centro de dados e o show room estão em pleno funcionamento. A execução financeira atingiu os 86.452,74€, o que corresponde a 86% do orçamento previsto para o Projecto.

MARC, Refª PAD 074

A maioria do equipamento foi adquirido e está em operação. A tarefa de recolha on-line está concluída e instalada em 2 postos e brevemente estará operacional nos restantes 4 postos. O módulo de gestão documental está também operacional. A execução financeira atingiu os 73.345,94€, o que corresponde a 50% do orçamento previsto para o Projecto.

ONDA, Refª PAD 021

O projecto tem a plataforma de serviços operacional, inclusive a comercialização e pagamentos electrónicos seguros que foi concluída em Dezembro de 2005, faltando praticamente só a formação para terminar o projecto. A execução financeira atingiu os 84.665,63€, o que corresponde a 84% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com uma redução orçamental de 59.300€, devido principalmente a uma reavaliação dos recursos humanos necessários e a uma correcção do investimento em serviços de manutenção.

TUP, Refª PAD 044

O back-office comercial já interage com os sistemas de gestão comercial, gestão da produção e gestão financeira e está em fase de testes para disponibilização aos clientes. A aplicação de gestão de armazéns está a ser especificada e estará em operação no 1º trimestre de 2006. A execução financeira atingiu os 147.833€, o que corresponde a 69% do orçamento previsto para o Projecto.

HMC, Refª PAD 042

O Sistema de Workflow dos processos está em fase de conclusão, o sistema de Gestão Documental e a aplicação de Auditorias em HACCP estão em fase de desenvolvimento, prevendo-se que estejam disponíveis durante o 1º trimestre de 2006. A execução financeira atingiu os 58.747€, o que corresponde a 65% do orçamento previsto para o Projecto.

SANI, Refª PAD 047

O projecto sofreu um atraso na execução planeada para 2005, pois a Sanindusa reestruturou os lay outs das suas unidades de produção, tendo a gestão do projecto decidido só instalar os equipamentos e as aplicações após a conclusão desse processo. Neste momento, o Sistema de Gestão e Controlo de Produção está instalado na unidade de Acrílicos e está a ser instalado na segunda unidade de produção Vitreous. No início de 2006 irão iniciar a implementação na unidade Fireclay. A execução financeira atingiu os 108.360€, o que corresponde a 41% do orçamento previsto para o Projecto.

SMIA, Refª PAD 052

As aplicações desenvolvidas através do projecto SMIA estão em operação plena pelos técnicos da EBP. A execução financeira atingiu os 83.539€, o que corresponde a 82% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com um reforço orçamental de 11.147€, para permitir a aquisição de novos equipamentos, up-grade dos equipamentos terminais e para permitir a reestruturação da infra-estrutura de rede.

SIPA, Refª PAD 026

O Sistema de Gestão Financeira já está em operação desde Janeiro, com todas as suas funcionalidades operacionais. O sistema colaborativo de Recursos Humanos e o sistema de Gestão Documental estão a ser instalados, prevendo-se que estejam operacionais no início de 2006. O Portal do Porto de Aveiro já está on-line, faltando apenas a funcionalidade de consulta de conta correntes para clientes e fornecedores. A execução financeira atingiu os 252.602€, o que corresponde a 79% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com uma redução orçamental de 13.569€, devido a uma correcção no investimento no desenvolvimento das aplicações.

ABS XXI, Refª PAD 036

A 2ª Versão da Plataforma de Serviços já está instalada e em operação, estando prevista a operação da versão final para o início de 2006. A intranet, com gestão do site já está instalada e em operação. A execução financeira atingiu os 40.539€, o que corresponde a 81% do orçamento previsto para o Projecto.

Digivacas, Refª PAD 064

O Servidor e os PDA's estão adquiridos e a aplicação está instalada e em testes em ambiente real para ser optimizada. A execução financeira atingiu os 74.471€, o que corresponde a 54% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com um reforço orçamental de 35.558€, para permitir a expansão dos serviços a todos os técnicos contrastadores da EABL através da aquisição de equipamentos terminais e para expandir a formação nas aplicações desenvolvidas aos produtores de leite da região.

Abdigital, Refª PAD 106

Foi adquirido algum do equipamento previsto e a plataforma integrada de serviços da Abimota está em fase final de desenvolvimento. As aplicações de gestão da formação profissional e do Curricula já se encontram em operação. A execução financeira atingiu um total de 59.508€, que corresponde a 46,9% do orçamento previsto para o Projecto.

Atlética, Refª PAD 139

A aplicação on-line de inscrição dos atletas está em fase de especificação e desenvolvimento e a integração com o equipamento de cronometragem para as provas de atletismo já foi adquirido. Têm surgido problemas nesta integração, motivando atrasos na execução do Projecto. A execução financeira atingiu um total de 31.539€, que corresponde a 56,1% do orçamento previsto para o Projecto.

Braxen, Refª PAD 115

A 2ª Versão da Plataforma de Serviços já está instalada e em operação, estando prevista a operação da versão final para o início de 2006. A execução financeira atingiu os 33.884€, o que corresponde a 75% do orçamento previsto para o Projecto.

CADERNO DIGITAL, Refª PAD 147

Estão já em exploração regular os equipamentos adquiridos e a plataforma web de produção e gestão de notícias, bem como a plataforma de gestão on-line de assinaturas. A plataforma para a gestão on-line de classificados está numa fase de testes. A execução financeira atingiu um total de 63.454€, que corresponde a 100% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com um reforço orçamental de 13.430€ para permitir a expansão das funcionalidades das aplicações e o reforço do equipamento

Com.Web, Refª PAD 137

A intranet de Serviços está instalada e em operação e a plataforma de serviços para os clientes está em fase de conclusão. A execução financeira atingiu os 28.833€, o que corresponde a 65% do orçamento previsto para o Projecto.

DigiPot, Refª PAD 119

A 2ª Versão da Plataforma de Serviços já está instalada e em operação, estando prevista a operação da versão final para o início de 2006. A execução financeira atingiu os 39.955€, o que corresponde a 81% do orçamento previsto para o Projecto.

e-SI, Refª PAD 123

Estão já em exploração regular os equipamentos adquiridos e aplicações desenvolvidas para suporte aos processos de produção e gestão da HFA, estando a ser testada em condições reais a aplicação de follow-up das encomendas, por clientes portugueses e estrangeiros desta empresa. A execução financeira atingiu um total de 60.000€, que corresponde a 100% do orçamento previsto para o Projecto.

Extraplas, Refª PAD 110

Estão já em exploração regular os equipamentos adquiridos. A Extranet de serviços de apoio aos processos de encomenda, criação e produção dos moldes, está em fase de testes. A execução financeira atingiu um total de 49.216€, que corresponde a 82,5% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com um reforço orçamental de 13.610€ para permitir a expansão dos sistemas e o reforço do equipamento.

GALILEU-DIAG, Refª PAD 148

A aplicação de diagnóstico e gestão da formação via web está em fase de desenvolvimento e de validação em ambiente real, prevendo-se que esteja em plena operação no início de 2006. A execução financeira atingiu os 33.906€, o que corresponde a 68% do orçamento previsto para o Projecto.

Imagem XXI, Refª PAD 118

Uma versão não definitiva da Plataforma de Serviços e a intranet com Gestão do Site estão em operação. O Módulo de Stock Digital Multi Média está ainda em desenvolvimento. A execução financeira atingiu os 36.918€, o que corresponde a 59% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com um reforço orçamental de 14.000€, para permitir a aquisição de um computador para operar com o módulo de Stock digital Multi Média para otimizar a Plataforma de Serviços.

JFD, Refª PAD 117

Este projecto adquiriu todo o equipamento e procedeu à sua instalação durante o ano de 2005. O back-office encontra-se instalado com todos os módulos operacionais. A execução financeira atingiu os 39.975,8€, o que corresponde a 80% do orçamento previsto para o Projecto.

Semiar, Refª PAD 130

Este Projecto apresentou desvios significativos na execução técnica e financeira, devido ao atraso no desenvolvimento do sistema integrado de gestão por parte do fornecedor, o que obrigou a fazer uma reprogramação temporal e financeira do projecto. O equipamento está todo adquirido e instalado. A execução financeira atingiu os 23.671,95€, o que corresponde a 51,80% do orçamento previsto para o Projecto.

uebe.SI, Refª PAD 103

O equipamento está todo adquirido e instalado; A plataforma interna e a de tele-trabalho estão perfeitamente operacionais e em uso. A extranet encontra-se em testes.

A execução financeira atingiu os 36.065,66€, o que corresponde a 88% do orçamento previsto para o Projecto.

VLM–online, Refª PAD 104

O back–office está instalado e em operação com os serviços de Gestão Documental e Auditorias. A extranet com serviços para os clientes está em desenvolvimento e será disponibilizada no início de 2006. A execução financeira atingiu os 24.645€, o que corresponde a 71% do orçamento previsto para o Projecto.

web–IVE, Refª PAD 129

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso Aveiro Digital, mas apresentou a sua desistência por não considerar reunidas todas as condições necessárias para a sua boa implementação. A desistência da execução foi fundamentada nos obstáculos técnicos para a integração de serviços com a Direcção Geral de Viação, que tutela os Sistemas de Informação nesta área.

ÁREA DE INTERVENÇÃO 8: INFORMAÇÃO, CULTURA E LAZER

Introdução

Nesta Área de Intervenção foram aprovados 11 Projectos, envolvendo 74 Entidades Beneficiárias. Participam na execução 83 pessoas com um volume de trabalho de 1254 HM. Já estão verificados 186 Resultados Documentais. Como factores a realçar destacam-se por um lado a qualidade, quantidade e diversidade de conteúdos que estão a ser criados, e por outro o impacto geográfico e alargado associado ao elevado número de Entidades Beneficiárias. O orçamento global desta Área de Intervenção é de 2.668.162€, tendo sido executado 1.583.671€, correspondente a uma taxa de execução financeira de 59%.

P 8.1. Museus e Arquivos

bibria, Refª PAD 066

A plataforma está em fase de testes, com carregamento das mais de 250 000 imagens já digitalizadas. A versão final estará disponível no início de 2006, dando continuidade às digitalizações, agora a cores, e com diferentes origens. A execução financeira atingiu os 230.158€, o que corresponde a 70% do orçamento do Projecto.

INFORDICO, Refª PAD 024

Já foi digitalizado mais de 50% do espólio do Museu Marítimo de Ílhavo, o que corresponde a aproximadamente 61 000 documentos e está praticamente concluída o processo de registo fotográfico digital do espólio “não digitalizável”. A execução financeira atingiu os 289.185€, o que corresponde a 64% do orçamento do Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira, com um reforço orçamental de 55.116€, para garantir a expansão da digitalização do espólio do Museu, nomeadamente as colecções de Fotografia.

MEMDigital, Refª PAD 055

Este Projecto está decorrer com atraso, tendo sido efectuada uma reprogramação temporal e financeira ao PTF. A 1ª fase de digitalização do acervo está concluída e os equipamentos informáticos já se encontram em funcionamento no centro de pesquisa documental. A plataforma dinâmica de serviços já foi adjudicada e encontra-se em fase de implementação. A execução financeira atingiu os 84.725,78€, o que corresponde a 52,74% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com uma redução orçamental de 35.361€. Esta redução ficou a dever-se fundamentalmente ao facto da EBP ter adquirido o software de gestão, por um valor substancialmente mais baixo ao previsto no orçamento, e ainda, devido à

substituição da visita guiada através de quiosques multimédia por uma visita sonora que utiliza leitores mp3 portáteis com auscultadores, sendo esta solução bastante mais económica.

P@Z, Refª PAD 050

Este projecto já tem todo o equipamento instalado e o software está estabilizado, continuando a inserção de conteúdos, a digitação e digitalização dos documentos do Juizado de Paz da Murtosa. A execução financeira atingiu os 46.342€, o que corresponde a 55% do orçamento do Projecto.

MUSEAVE, Refª PAD 107

O projecto está a recuperar algum atraso inicial, tendo já sido adquiridos e estando em operação, a quase totalidade dos equipamentos. Os jogos e produtos multimédia foram já especificados, com base no trabalho de investigação histórica realizado e estão em fase de desenvolvimento. A execução financeira atingiu um total de 34.477€, que corresponde a 42,0% do orçamento previsto para o Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira com um reforço orçamental de 21.999,90€, para permitir a expansão dos materiais pedagógicos e a divulgação do Projecto.

P 8.2. Redes de Serviços Regionais

SIGRED, Refª PAD 114

Todo o equipamento foi adquirido e procedeu-se à sua instalação mas o projecto está com um ligeiro atraso na tarefa de instalação da plataforma, o que impede a inserção de recintos e equipamentos desportivos por parte das EB. A execução financeira atingiu os 73.686,08€, o que corresponde a 61,47% do orçamento previsto para o Projecto.

P 8.3. Academia Artes Digitais

AAD-TA, Refª PAD 038

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 1º Concurso, tendo como objectivo final a Instalação da Academia de Artes Digitais. O projecto não tem ainda qualquer evidência de execução material e financeira, tendo sofrido várias reprogramações devido às dificuldades de operacionalização. O seu PTF foi objecto de reprogramação, podendo ser consultado no SAVAD.

P 8.4. Movimento Associativo Digital

PIAR, Refª PAD 003

O Projecto está em fase avançada faltando instalar 4 painéis. O back-office está a ser optimizado para permitir a optimização dos processos de controlo e edição. Foram instaladas UPS's e placas wi-fi para melhorar a fiabilidade e a manutenção dos painéis. A execução financeira atingiu os 558.192€, o que corresponde a 73% do orçamento do Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira, com um reforço orçamental de 65.918€ para garantir a sua expansão aos Municípios de Albergaria-a-Velha e Vagos.

Adira, Refª PAD 142

Os módulos da aplicação já estão desenvolvidos e operacionais, faltando a sua agregação num sistema multi-entidade. A versão final, com o portal, estará disponível no início de 2006. O equipamento está todo adquirido e instalado. A execução financeira atingiu os 213.632€, o que corresponde a 54% do orçamento do Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira, com um reforço orçamental de 71.000€, para permitir a resposta a mais de 20 solicitações de adesão de Associações Culturais, Desportivas e Recreativas.

IPJDIGITAL, Refª PAD 120

Este Projecto regista atrasos significativos na sua implementação, mas o equipamento já foi especificado e o desenvolvimento e webdesign da plataforma de serviços já foram adjudicados. A execução financeira atingiu um total de 27.619€, que corresponde a 39,5% do orçamento previsto para o Projecto.

POMADA, Refª PAD 136

O equipamento foi adquirido e instalado. Os serviços estarão operacionais até Março de 2006. A execução financeira atingiu os 28.581€, o que corresponde a 59% do orçamento do Projecto. De realçar que este projecto foi objecto de reprogramação financeira, com um reforço orçamental de 13.398€ para permitir a interligação do back-office com o sistema de Gestão Financeira, e a expansão das funcionalidades ao Sector Informativo e Formativo.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

GESTÃO FINANCEIRA

As actividades associadas à gestão financeira do Programa Aveiro Digital 2003–2006, estão integradas no Projecto P1.3. Gestão e Coordenação Aveiro Digital. No entanto dada a sua especial relevância são detalhadamente descritas neste capítulo do Relatório Anual.

No âmbito da gestão financeira foi assegurado o planeamento, acompanhamento e controlo dos processos de execução financeira, nomeadamente dos processos de execução financeira dos 77 Projectos do Programa Aveiro Digital 2003–2006. Foram ainda assegurados o controlo e execução de actividades administrativas e de gestão dos recursos humanos do GAD. A Gestão Financeira foi realizada por duas pessoas, uma com formação em Auditoria Contabilística e outra com formação em Gestão.

Actividades de Gestão Financeira

As actividades relevantes associadas à Gestão Financeira foram as seguintes:

- Especificação e validação de funcionalidades adicionais da Gestão Financeira do Sistema SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital;
- Acompanhamento da execução do orçamento aprovado, tendo em conta os critérios e prioridades estabelecidas pela CEAD, bem como as normas financeiras aplicáveis;
- Análise e avaliação regular da execução financeira para apreciação da CEAD; (Anexo 11)
- Elaboração de planos de despesas e de pagamentos associados para apreciação e deliberação da CEAD e sua posterior execução; (Anexo 11)
- Elaboração de relatórios de apresentação de despesas à entidade financiadora (POSI), de acordo com as normas e os regulamentos estabelecidos;
- Registo e verificação da movimentação das contas bancárias do PAD 2003–2006;
- Reembolsos às Entidades Beneficiárias Principais dos adiantamentos e das participações financeiras das Despesas apresentadas, tendo em conta os critérios e prioridades estabelecidas pela CEAD. (Anexo 11)

As actividades relacionadas com a gestão dos recursos humanos foram as seguintes:

- Elaboração da documentação para o processamento e pagamento dos vencimentos e das prestações de serviços e respectiva liquidação;
- Elaboração das declarações fiscais/legais inerentes aos recursos humanos, nomeadamente, Declarações de Retenção na Fonte – IRS, Quadro de

Pessoal/Outubro, Declarações de Rendimento e Imposto Retido e ainda as Declarações de Remunerações para a Segurança Social.

As actividades de natureza administrativas e associadas à gestão de processos compreenderam:

- Parametrização do sistema de contabilidade adoptado – Software Primavera, compreendendo os módulos de Contabilidade Geral e Analítica, Gestão de Terceiros, Gestão de Tesouraria e Gestão de Imobilizado;
- Encerramento das Contas do exercício de 2004 e elaboração de toda a documentação associada;
- Elaboração do Relatório da Execução Financeira de 2004 do PAD 2003–2006;
- Execução da Contabilidade do exercício de 2005 da Associação Aveiro Digital;
- Acompanhamento da movimentação das contas bancárias do Programa Aveiro Digital 2003–2006 e verificação recorrendo à reconciliação bancária;
- Elaboração dos processos de aquisição de bens e serviços integrados nos Projectos da Área de Intervenção 1 e preparação dos contratos de prestação de serviços, para apreciação e deliberação pela CEAD; (Anexo 11)
- Registo e encaminhamento de todos os Processos de Justificação de Aquisição de Equipamento para o Comité Técnico do POSI;
- Coordenação das actividades de expediente geral do Gabinete Aveiro Digital;
- Análise, encaminhamento e verificação de processos administrativos e controlo do economato.

Metodologia de Apresentação de Despesas

A CEAD manteve a metodologia aprovada para as Apresentações de Despesas, baseada num processo de *workflow*, que serviu de orientação ao desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital – o SAVAD, onde está incorporada toda a legislação aplicável, de forma a simplificar a complexidade destes processos e onde todos os Projectos têm uma área própria de Gestão Financeira. O processo de elaboração e apresentação de despesas à entidade financiadora (POSI) consistiu no seguinte:

- Identificação, selecção e recolha de todos os documentos de despesa dos Projectos da Área de Intervenção 1 e registo dos mesmos no SAVAD;
- Registo no SAVAD das despesas dos Projectos pelas respectivas EBPs;
- Entrega ao GAD, após verificação pelas Entidades Beneficiárias Principais, das despesas registadas no SAVAD através da análise dos dados e enquadramento nas rubricas orçamentais do respectivo Projecto;

- Pré-verificação pelo GAD das despesas registadas, com análise dos dados e enquadramento no respectivo Plano Técnico e Financeiro;
- Recepção no GAD dos dossiers físicos entregues pelas EBPs;
- Verificação pelo GAD da conformidade dos registos das despesas no SAVAD com os documentos contabilísticos originais e verificação pelos respectivos Gestores GAD de Projecto da conformidade das despesas apresentadas face à execução do Plano Técnico;
- Anulação dos documentos contabilísticos originais, com a aposição do carimbo de financiamento POSI e FEDER, respectiva taxa de imputação e rubrica do técnico financeiro GAD;
- Numeração sequencial de todos os documentos que integram o dossier financeiro de cada Projecto, contendo o número do Pedido de Pagamento do Projecto e o Número da Ref^a PAD;
- Verificação dos registos nos formulários POSI;
- Entrega no GAD de duas cópias do dossier financeiro pela respectiva EBP;
- Envio ao POSI dos ficheiros electrónicos das Listas de Despesas para primeira validação e dos Pedidos de Pagamento em formato papel, acompanhados de cópias de todos os documentos de despesas e respectivos justificativos.

A elaboração dos relatórios de apresentação de despesas à entidade financiadora (POSI) dando cumprimento às obrigações assumidas pelo Programa Aveiro Digital 2003–2006 no Termo de Aceitação assinado para a Medida 2.3, foram tarefas realizadas nos meses de Abril, Julho, Outubro e Dezembro de 2005, tendo sido apresentadas durante o ano 2005, despesas no valor total de 7.656.634,52€.

SAVAD: Gestão Financeira

O SAVAD, que materializa e sistematiza todo o processo de Apresentação de Despesas, é uma ferramenta fundamental na qualidade e eficiência da gestão financeira, tendo garantido ao longo deste ano, o rigor, a segurança, a rapidez e a eficácia na Apresentação de Despesas e dos Pedidos de Pagamento à entidade financiadora (POSI), para além de garantir informação sempre actual, gerada em tempo útil, quer para análise e controlo da CEAD, quer para todas as Entidades Beneficiárias Principais.

A informação de execução financeira no SAVAD, apresentada de forma agregada no PAD, por Área de Intervenção e por Projecto, permite a todas as entidades utilizadoras:

- Maximizar a utilidade da informação produzida;
- Fornecer informação rigorosa, clara e objectiva;
- Garantir a integridade da informação e documentação produzida;
- Fornecer todos os outputs necessários ao processo de execução financeira;

- Optimizar a área financeira do GAD e de todas as entidades executoras;
- Dar suporte ao processo de gestão de informação até à conclusão dos Projectos.

A área global de execução financeira “PAD 2003–2006” evidencia de forma sintetizada a informação de execução financeira global do PAD 2003–2006, permitindo ainda extrair o histórico dos Pedidos de Pagamento e as listas de Despesas, apresentadas, verificadas, quitadas e aceites por Projecto, por AI e dos totais do Programa.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt

SAVAD - Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

Portugal Digital **POSI** PROGRAMA OPERACIONAL SISTEMA DE INOVAÇÃO

- GAD
- PAD 2003-2006
 - Gestão Técnica
 - Gestão Financeira
- SAE
- AI 1
- AI 2
- AI 3
- AI 4
- AI 5
- AI 6
- AI 7
- AI 8
- Sair

Desenvolvido por **NETUAL**

PROGRAMA AVEIRO DIGITAL

Lista de Despesas

Pedido FEDER: --- Área: --- Projecto: --- Ver Ver

Medida 2.4: --- Anexo 1 Anexo 2

Medida 1.1: --- Projecto: CERTICAD Anexo 1 Anexo 2

Pedidos de Pagamento ao POSI - FEDER, Medida 2.3 (activo desde..) **Quadro Resumo**

1º pedido	2º pedido	3º pedido	4º pedido	5º pedido	6º pedido	7º pedi
1-1-2003	1-1-2004	1-4-2004	15-9-2004	15-11-2004	15-3-2005	15-6-2

Pedidos de Pagamento ao POSI - FSE, Medida 2.4 (activo desde..) **Quadro Resumo**

1º pedido	2º pedido	3º pedido	4º pedido	5º pedido	6º pedido
15-11-2004	15-3-2005	15-6-2005	15-9-2005	15-11-2005	

1º GI **2º GI** **3º GI**

15-11-2004	15-3-2005	
------------	-----------	--

Pedidos de Pagamento ao POSI - FSE, Medida 1.1 (activo desde..)

1º pedido	2º pedido	3º pedido	4º pedido	5º pedido
15-3-2005	27-7-2005	22-10-2005	22-12-2005	

1º GI **2º GI** **3º GI**

2-1-2006	15-11-2006	
----------	------------	--

Quadro de Execução Orçamental Anual **Apresentações Actuais**

Área: Todas Estado das Despesas: Verificadas Ver

Rúbrica de Investimento	Orçamento	Orçamento Executado		
		2003	2004	2005
Despesas de Capital / Imobilizadas Corpóreas				
Equipamento	6406071,40	60015,19	2630140,06	1689837,4
Outras despesas de investimento	419391,03	719,96	93717,78	183622,64
Sub-Total	6825462,43	60735,15	2723857,84	1873460,04
Despesas Correntes / Imobilizadas Incorpóreas				
Recursos Humanos	5114560,68	183346,42	1098741,73	1727963,53
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	4905176,93	31113,03	1309783,48	1924219,17
Aquisição de Serviços e manutenção	4382778,59	151542,21	770125,51	1259789,34
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	1807586,57		5224,65	234263,73
Outras despesas correntes	452376,93	6244,07	26849,99	67638,44
Sub-Total	16662479,70	372245,74	3210725,36	5213874,21
Investimento Total	23487942,13	432980,89	5934583,20	7087334,25

SAVAD - Execução Financeira global do Programa Aveiro Digital 2003–2006

Por Área de Intervenção é exibido o balanço da Execução Técnica e Financeira para todos os Projectos nela integrados, evidenciando o orçamento aprovado, o orçamento

executado em valor e percentagem e ainda o orçamento por executar. Cada Entidade Beneficiária Principal tem uma área de Gestão Financeira específica por Projecto, que lhe permite o registo e introdução das despesas executadas, o acompanhamento e controlo dos orçamentos comprometidos, executados e por executar, o acompanhamento e controlo de todo o processo de execução financeira de acordo com o Plano Técnico e Financeiro respectivo.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt

SAVAD - Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

Estar Portugal Digital **POSI** PROGAMA OPERACIONAL SISTEMA DE INICIATIVAS

GESTÃO FINANCEIRA - Estar

Apresentação de Despesas
Orientações de Apoio (15-Fev-05, pdf 177Kb)

Apresentação de despesas	Nº despesas	Estado	Data de fecho do processo	valor de despesa	valor de quitação
<input type="radio"/> 1	18	Verificada	31/03/2005	40190,32	40190,32
<input type="radio"/> 2	21	Verificada	16/06/2005	21712,88	18305,68
<input type="radio"/> 3	18	Verificada	15/09/2005	1898,36	1892,07
<input type="radio"/> 4	10	Verificada	15/11/2005	1771,84	1725,86
<input checked="" type="radio"/> 5	6	Activa		551,08	546,50

- Introdução e Correção de despesas
 - Corrigir Regime de IVA
- Verificação e entrega de despesas
- Lista e estado de despesas
- Documentos consolidados
 - Lista de despesas por rubrica de investimento
 - Formulário de Pedido de Pagamento
 - Formulário da Formação
- Exportação para Excel
 - Exportação de despesas (todas as rubricas)
 - Exportação de despesas de Recursos Humanos
- Quadro comparativo do Orçamento
- Pré-verificação de despesas
- Verificação de despesas
- Aceitação de despesas

Transferências

Descrição	Valor	Data
Adiantamento	1572.92	14-1-2005
1ª	11844.02	16-5-2005
2ª	13792.41	20-9-2005
3ª	5100.13	16-1-2006
4ª		

Validade de Declarações

Declaração	Data de Validade
Segurança Social	7-3-2006
DGCI	7-3-2006

Desenvolvido por NETUAL

SAVAD - Gestão Financeira por Projecto

A esta área de trabalho, adicionou-se em 2005, um quadro com informação das transferências do adiantamento e das participações financeiras efectuadas a cada EBP e ainda a data de validade das Declarações comprovativas de situação regularizada em matéria de impostos, contribuições e Segurança Social.

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2005

No dia 22 de Dezembro, data da 9ª Apresentação de Despesas e última de 2005, estavam executados 13.162.975,16€, correspondendo a 61,28% do Orçamento Total para a Medida 2.3 – FEDER.

Este valor corresponde a três anos de execução dos Projectos da Área de Intervenção 1, geridos directamente pela CEAD, a dois anos de execução dos 40 Projectos aprovados no 1º Concurso Aveiro Digital e a um ano de execução dos 31 Projectos aprovados no 2º Concurso Aveiro Digital.

Com a execução material dos 77 Projectos, o Programa Aveiro Digital 2003–2006 atinge a sua dimensão plena, prevendo-se que a execução financeira de 2006 atinja 8.316.880,39€.

O quadro seguinte mostra a execução financeira já realizada, por ano e por Rubrica Orçamental:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Equipamento	6.402.746,40€	60.015,20€	2.630.140,06€	1.689.837,40€	4.379.992,65€	68,41
Outras despesas de investimento	419.391,03€	719,96€	93.717,78€	183.622,64€	278.060,38€	66,30%
Sub-Total	6.822.137,43€	60.735,16€	2.723.857,84€	1.873.460,04€	4.658.053,03€	68,28%
Recursos Humanos	4.829.858,68€	183.346,42€	1.098.741,73€	1.675.528,74€	2.957.616,89€	61,24%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	4.921.601,93€	31.113,03€	1.309.783,48€	1.924.219,17€	3.265.115,69€	66,34%
Aquisição de Serviços e manutenção	4.454.220,59€	151.542,21€	770.125,51€	1.259.789,34€	2.181.457,05€	48,98%
Outras despesas correntes	452.036,93€	6.244,07€	26.849,99€	67.638,44€	100.732,50€	22,28%
Sub-Total	14.657.718,13€	372.245,73€	3.205.500,71€	4.927.175,69€	8.504.922,13€	58,02%
Investimento Total	21.479.855,56€	432.980,88€	5.929.358,55€	6.800.635,73€	13.162.975,16€	61,28%

Execução Financeira por Área de Intervenção

Apresenta-se, de seguida, uma visão por Área de Intervenção, detalhando-se desta forma, a execução financeira do Programa Aveiro Digital 2003–2006.

Área de Intervenção 1 – Comunidade Digital

A execução financeira da Área de Intervenção 1, gerida directamente pela CEAD, é de 61,42% do Orçamento, destacando-se a implementação dos Espaços Internet Aveiro Digital, cuja rede abrange 11 Espaços municipais e 79 Espaços nas Juntas de Freguesia. O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 1:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Equipamento	445.504,00€	19.984,15€	354.824,62€	18.954,64€	393.763,41€	88,39%
Outras despesas de investimento	10.000,00€	–€	11.030,52€	70.289,56€	81.320,08€	813,20%
Sub-Total	455.504,00€	19.984,15€	365.855,14€	89.244,20€	475.083,49€	104,30%
Recursos Humanos	1.505.058,76€	171.841,32€	278.837,38€	406.079,54€	856.758,24€	50,25%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	87.195,00€	–€	35.378,70€	58.405,30€	93.784,00€	107,56%
Aquisição de Serviços e manutenção	1.215.376,22€	104.597,85€	328.307,07€	353.567,18€	786.472,10€	64,71%
Outras despesas correntes	190.877,14€	5.826,04€	10.882,60€	15.646,84€	32.355,48€	16,95%
Sub-Total	2.998.507,12€	282.265,21€	653.405,75€	833.698,86€	1.769.369,82€	55,32%
Investimento Total	3.454.011,12€	302.249,36€	1.019.260,89€	922.943,06€	2.244.453,31€	61,42%

Área de Intervenção 2 – Autarquias e Serviços Concelhios

A execução financeira desta área, onde estão inseridos os Projectos que envolvem as 11 Câmaras Municipais da Região da Ria, é de 56,32% do orçamento, destacando-se a execução das rubricas de equipamento e de serviços de desenvolvimento de software. O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 2:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Equipamento	1.810.146,58€	–€	861.906,73€	260.047,94€	1.121.954,67€	61,98%
Outras despesas de investimento	69.028,00€	–€	37.470,01€	8.023,01€	45.493,02€	65,91%
Sub-Total	1.879.174,58€	–€	899.376,74€	268.070,95€	1.167.447,69€	62,13%
Recursos Humanos	985.354,69€	571,10€	162.007,91€	386.204,88€	548.783,89€	55,69%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	1.974.486,00€	–€	704.886,67€	430.559,95€	1.135.446,62€	57,51%
Aquisição de Serviços e manutenção	928.058,40€	10.142,37€	158.285,48€	246.043,97€	414.471,82€	44,66%
Outras despesas correntes	32.284,30€	–€	–€	–€	–€	0,00%
Sub-Total	3.920.183,39€	10.713,47€	1.025.180,06€	1.062.808,80€	2.098.702,33€	53,54%
Investimento Total	5.799.357,97€	10.713,47€	1.924.556,80€	1.330.879,75€	3.266.150,02€	56,32%

Área de Intervenção 3 – Escolas e Comunidades Educativas

As escolas e as comunidades educativas já executaram 58,26% do seu orçamento, destacando-se o investimento em equipamento e em desenvolvimento de software.

O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 3:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Equipamento	703.844,00€	7.366,20€	241.004,96€	175.860,96€	424.232,12€	60,27%
Outras despesas de investimento	34.198,00€	719,96€	396,96€	18.070,43€	19.187,35€	56,11%
Sub-Total	738.042,00€	8.086,16€	241.401,92€	193.931,39€	443.419,47€	60,08%
Recursos Humanos	497.344,00€	-€	180.034,75€	158.277,34€	338.312,09€	68,02%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	416.914,00€	5.156,76€	66.380,35€	153.500,77€	225.037,88€	53,98%
Aquisição de Serviços e manutenção	265.357,00€	148,75€	29.188,28€	81.877,67€	111.214,70€	41,91%
Outras despesas correntes	69.293,00€	-€	9.243,85€	30.427,82€	39.671,67€	57,19%
Sub-Total	1.248.908,00€	5.305,51€	284.847,23€	424.083,60€	714.236,34€	57,19%
Investimento Total	1.986.950,00€	13.391,67€	526.249,15€	618.014,99€	1.157.655,81€	58,26%

Área de Intervenção 4 – Universidade e Comunidade Universitária

Os Projectos dirigidos pela Universidade de Aveiro mostram um forte investimento em equipamento e em desenvolvimento de software, tendo já executado 63,04% do seu orçamento total.

O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 4:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Equipamento	488.629,80€	-€	201.614,39€	168.485,14€	370.099,53€	75,74%
Outras despesas de investimento	99.772,00€	-€	-€	58.703,16€	58.703,16€	58,84%
Sub-Total	588.401,80€	-€	201.614,39€	227.188,30€	428.802,69€	72,88%
Recursos Humanos	425.855,23€	-€	139.824,11€	153.222,28€	293.046,39€	68,81%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	492.836,00€	-€	96.406,36€	334.400,21€	430.806,57€	87,41%
Aquisição de Serviços e manutenção	457.153,00€	-€	12.724,00€	75.578,81€	88.302,81€	19,32%
Outras despesas correntes	10.233,00€	-€	183,96€	3.487,79€	3.671,75€	35,88%
Sub-Total	1.386.077,23€	-€	249.138,43€	566.689,09€	815.827,52€	58,86%
Investimento Total	1.974.479,03€	-€	450.752,82€	793.877,39€	1.244.630,21€	63,04%

Área de Intervenção 5 – Serviços de Saúde

Os Projectos ligados às instituições de saúde, que abrangem todos os hospitais e centros de saúde da Região da AMRia, executaram 58,99% do seu orçamento, com destaque para o forte investimento em equipamento.

O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 5:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Equipamento	850.604,80€	-€	325.917,09€	217.561,33€	543.478,42€	63,89%
Outras despesas de investimento	54.227,00€	-€	28.560,00€	5.137,65€	33.697,65€	62,14%
Sub-Total	904.831,80€	-€	354.477,09€	222.698,98€	577.176,07€	63,79%
Recursos Humanos	309.171,00€	-€	87.272,08€	104.810,98€	192.083,06€	62,13%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	213.750,00€	-€	31.954,00€	63.327,06€	93.566,41€	43,77%
Aquisição de Serviços e manutenção	193.277,00€	-€	31.954,00€	63.327,06€	63.327,06€	49,30%
Outras despesas correntes	11.633,00€	-€	119.492,37€	266.397,99€	385.890,36€	53,02%
Sub-Total	727.831,00€	-€	119.492,37€	266.397,99€	385.890,36€	53,02%
Investimento Total	1.632.662,80€	-€	473.969,46€	489.096,97€	963.066,43€	58,99%

Área de Intervenção 6 – Solidariedade Social

Nesta Área de Intervenção, a execução financeira é de 69,84%, destacando-se o investimento em equipamento e em desenvolvimento de software.

O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 6:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Equipamento	341.940,00€	-€	26.793,40€	282.367,94€	309.161,34€	90,41%
Outras despesas de investimento	31.700,00€	-€	4.357,99€	4.371,29€	8.729,28€	27,54%
Sub-Total	373.640,00€	-€	31.151,39€	286.739,23€	317.890,62€	85,08%
Recursos Humanos	277.160,00€	-€	51.391,21€	82.109,05€	133.500,26€	48,17%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	273.852,00€	-€	54.371,10€	174.627,68€	228.998,78€	83,62%
Aquisição de Serviços e manutenção	140.550,00€	-€	20.319,21€	52.173,78€	72.492,99€	51,58%
Outras despesas correntes	22.397,00€	-€	127.378,19€	314.266,68€	441.644,87€	61,86%
Sub-Total	713.959,00€	-€	127.378,19€	314.266,68€	441.644,87€	61,86%
Investimento Total	1.087.599,00€	-€	158.529,58€	601.005,91€	759.535,49€	69,84%

Área de Intervenção 7 – Tecido Produtivo

As empresas da região já executaram 67,57% do seu orçamento, destacando-se o investimento em equipamento e em desenvolvimento de software.

O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 7:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Equipamento	784.106,22€	32.664,85€	169.676,02€	329.080,32€	531.421,18€	67,77%
Outras despesas de investimento	70.650,03€	-€	10.627,30€	18.025,29€	28.652,60€	40,56%
Sub-Total	854.756,25€	32.664,85€	180.303,32€	347.105,61€	560.073,78€	65,52%
Recursos Humanos	497.365,08€	10.437,68€	110.519,87€	237.360,29€	358.317,84€	72,04%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	955.076,43€	25.956,27€	233.542,49€	429.323,79€	688.822,55€	72,12%
Aquisição de Serviços e manutenção	513.549,72€	36.653,24€	105.375,29€	186.793,89€	328.822,42€	64,03%
Outras despesas correntes	55.886,43€	-€	2.342,17€	5.433,75€	7.775,91€	13,91%
Sub-Total	2.021.877,66€	73.047,19€	451.779,82€	858.911,72€	1.383.738,72€	68,44%
Investimento Total	2.876.633,91€	105.712,04€	632.083,14€	1.206.017,33€	1.943.812,50€	67,57%

Área de Intervenção 8 – Informação, Cultura e Lazer

Os Projectos associados a esta Área de Intervenção já executaram 59,35% do orçamento, destacando-se o investimento em equipamento e desenvolvimento de software.

O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 8:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Equipamento	977.971,00€	-€	448.402,85€	237.479,13€	685.881,98€	70,13%
Outras despesas de investimento	49.816,00€	-€	1.275,00€	1.002,25€	2.277,25€	4,57%
Sub-Total	1.027.787,00€	-€	449.677,85€	238.481,38€	688.159,23€	66,96%
Recursos Humanos	332.549,92€	496,32€	88.854,43€	147.464,38€	236.815,13€	71,21%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	507.492,50€	-€	118.817,82€	249.835,07€	368.652,89€	72,64%
Aquisição de Serviços e manutenção	740.899,25€	-€	83.972,17€	200.426,97€	284.399,14€	38,39%
Outras despesas correntes	59.433,06€	418,03€	2.634,46€	2.592,54€	5.645,03€	9,50%
Sub-Total	1.640.374,73€	914,35€	294.278,88€	600.318,96€	895.512,19€	54,59%
Investimento Total	2.668.161,73€	914,35€	743.956,73€	838.800,34€	1.583.671,42€	59,35%

FLUXO FINANCEIRO POSI – PROGRAMA AVEIRO DIGITAL

Durante o ano de 2005, realizou-se a sexta, sétima, oitava e nona Apresentações de Despesas Aveiro Digital 2003–2006 ao POSI, no valor total de 7.656.634,52€, o que acrescido dos 5.506.340,67€ referentes às apresentações de despesas Aveiro Digital, realizadas em 2003 e 2004, totaliza um valor acumulado de despesas apresentadas de 13.162.975,19€:

- 6ª Apresentação de Despesas – Realizada em 18 de Abril, num montante de despesas apresentadas de 1.741.357,27€;
- 7ª Apresentação de Despesas – Realizada em 1 de Agosto, num montante de despesas apresentadas de 2.744.025,96€;
- 8ª Apresentação de Despesas – Realizada em 24 de Outubro, num montante de despesas apresentadas de 1.781.660,43€;
- 9ª Apresentação de Despesas – Realizada em 22 de Dezembro, num montante de despesas apresentadas de 1.389.590,86€.

O Quadro seguinte mostra o fluxo de caixa semestral entre o POSI e o Programa Aveiro Digital:

Período	Despesa Apresentada Acumulada	Comparticipação Financeira deduzida das Retenções	Valor Recebido Acumulado	Saldo do Semestre
1º Semestre 2003	-€	-€	-€	-€
2º Semestre 2003	173.726,72€	122.865,92€	78.047,59€	44.818,33€
1º Semestre 2004	1.523.442,33€	1.059.675,11€	237.174,15€	822.500,96€
2º Semestre 2004	5.506.340,67€	3.824.120,99€	2.151.071,32€	1.673.049,67€
1º Semestre 2005	7.247.697,94€	5.032.760,41€	3.610.957,87€	1.421.802,54€
2º Semestre 2005	13.162.975,19€	9.138.429,81€	5.544.176,01€	3.594.253,80€

PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2006

Tendo em conta o desenvolvimento dos 77 Projectos Aveiro Digital 2003–2006, prevê-se a seguinte calendarização da execução do Orçamento da Medida 2.3 – FEDER do Programa Aveiro Digital 2003–2006:

Rubrica Orçamental	2003	2004	2005	2006	Total
Equipamento	60.015,20€	2.630.140,06€	1.689.837,40€	2.022.753,74€	6.402.746,40€
Outras despesas de investimento	719,96€	93.717,78€	183.622,64€	141.330,65€	419.391,03€
Sub-Total	60.735,16€€	2.723.857,84€	1.873.460,04€	2.164.084,39€	6.822.137,43€
Recursos Humanos	183.346,42€	1.098.741,74€	1.675.528,74€	1.872.241,78€	4.829.858,68€
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	31.113,03€	1.309.783,49€	1.924.219,18€	1.656.486,23€	4.921.601,93
Aquisição de Serviços e manutenção	151.542,21€	770.125,50€	1.259.789,33€	2.272.763,55€	4.454.220,59€
Outras despesas correntes	6.244,07€	26.850,00€	67.638,45€	351.304,41€	452.036,93€
Sub-Total	372.245,73€	3.205.500,73€	4.927.175,70€	6.152.795,97€	14.657.718,13€
Total	432.980,89€	5.929.358,57€	6.800.635,74€	8.316.880,36€	21.479.855,56€

ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÕES

Considerando a dimensão geográfica do Programa Aveiro Digital 2003–2006 e o modelo de gestão partilhado, entre a Associação Aveiro Digital e a Associação de Municípios da Ria, o ano 2005 continuou a confirmar que a conjugação de vontades, o alinhamento de objectivos e a complementaridade de competências destas duas entidades, foram factores decisivos para a qualificação da Gestão do Programa Aveiro Digital e da sua Execução.

Tendo atingido a sua plena dimensão, em fins de 2004, com todo o orçamento comprometido em 77 Projectos envolvendo 303 Entidades Beneficiárias, o Programa Aveiro Digital 2003–2006, durante o ano de 2005, conseguiu o maior nível de execução técnica e financeira, tendo apresentado, em Dezembro de 2005, uma despesa acumulada de 13,2M€, equivalente a 61% do seu orçamento total.

A 2ª Reunião de Concertação e a 1ª Exposição Aveiro Digital, realizadas em Julho de 2005, foram marcos da grande vitalidade do Programa Aveiro Digital, da qualidade dos produtos e serviços em desenvolvimento e da fortíssima e alargada dinâmica social que o sustenta.

A Comissão Executiva Aveiro Digital considera que os produtos e serviços, resultantes dos 77 Projectos em curso, vão contribuir directamente para qualificar as pessoas e os serviços na Região e que os métodos de gestão e de trabalho onde participam directamente 560 pessoas, com um volume de trabalho de 4.195 HM, vão indirectamente contribuir para qualificar as organizações envolvidas.

No entanto a capacidade de manter a execução do Programa Aveiro Digital 2003–2006 com elevados níveis de rigor e qualidade operacional depende fortemente da resposta atempada aos compromissos financeiros assumidos pela CEAD e pelo POSI com as Entidades Beneficiárias responsáveis pela execução dos Projectos, que claramente se tem vindo a degradar no último semestre de 2005.

A Comissão Executiva Aveiro Digital considera que no ano 2005 se atingiram os objectivos maiores planeados e que estão assim criadas as condições fundamentais para responder com êxito aos compromissos assumidos com o POSI até Dezembro de 2006.



Capítulo 3

Programa Aveiro Digital 2003–2006

POSI 402/2.4/C/CEN

Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação

Relatório de Progresso Material e Financeiro – 2005

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Relatório de Progresso Material e Financeiro – 2005 da Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação é da responsabilidade da Comissão Executiva Aveiro Digital e tem como objectivo descrever e documentar as actividades desenvolvidas entre 1 Janeiro e 31 Dezembro de 2005, no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003–2006.

Dada a natureza dos Projectos enquadrados no Programa Aveiro Digital, a Formação é uma necessidade associada ao treino dos agentes que vão operar os sistemas e serviços desenvolvidos em cada Projecto.

Com um modelo de execução associado aos Serviços e Aplicações, desenvolvidas no âmbito dos 77 Projectos Aveiro Digital, a CEAD considera que estão consolidadas todas as condições para atingir a execução plena desta Medida.

Este documento contempla o enquadramento da Formação no Programa Aveiro Digital 2003–2006 e a descrição do seu Modelo de Execução. Em seguida descreve-se o Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital – SAVAD, com particular detalhe na área de Gestão da Formação.

Finalmente é analisada a Execução Material e Financeira da Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação e apresentam-se as conclusões e as perspectivas de execução desta Medida.


ENQUADRAMENTO DA FORMAÇÃO NO PROGRAMA AVEIRO DIGITAL

O Programa Aveiro Digital 2003–2006 assume-se como um motor do desenvolvimento social, económico e cultural, perspectivando a modernização dos serviços e a qualificação das pessoas na região da Associação de Municípios da Ria.

A gestão deste Programa é da responsabilidade conjunta da AAD – Associação Aveiro Digital e da AMRIA – Associação de Municípios da Ria e a sua execução é, fundamentalmente, baseada na contratualização dos Projectos seleccionados através de Concursos Públicos e apresentados pelas entidades adequadas e beneficiárias em cada Área de Intervenção.

O modelo de execução reflecte métodos e formatos já consolidados, assumindo uma natureza claramente matricial:

- A direcção operacional dos Projectos enquadrados na Área “Comunidade Digital” é da responsabilidade directa da Comissão Executiva do Programa, pois estes Projectos constituem os investimentos estruturantes de alinhamento e alavanca de todo o Programa.
- A direcção operacional dos Projectos enquadrados nas restantes Áreas de Intervenção é da responsabilidade dos agentes respectivos, que através de Concurso Público, se comprometem pela sua execução perante a Comissão Executiva do Programa Aveiro Digital.

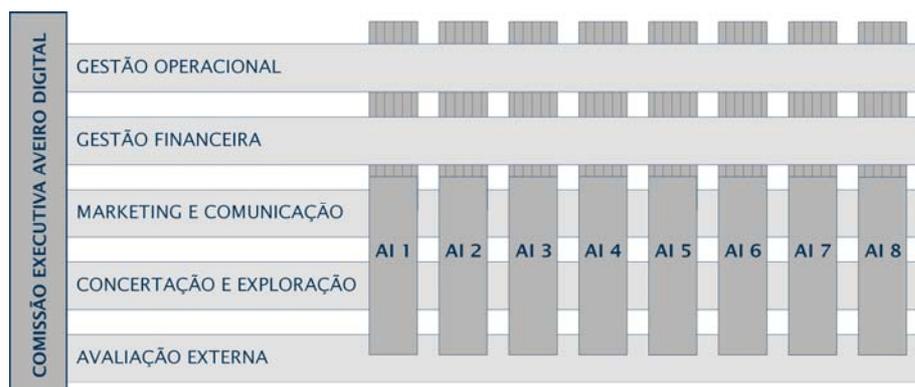

Através dos dois Concursos Públicos foram seleccionados 71 Projectos, abrangendo todas as Áreas de Intervenção do Programa Aveiro Digital 2003–2006.

O Programa Aveiro Digital 2003–2006 é financiado pelo POSI através de 3 Medidas distintas:

- o Medida 1.1 – Competências Básicas
- o Medida 2.3 – Projectos Integrados: das Cidades Digitais ao Portugal Digital
- o Medida 2.4 – Acções integradas de formação

A visão integrada da execução das 3 Medidas obrigou a um esforço de harmonização de procedimentos, com o objectivo de minimizar a complexidade da execução e gestão de três Medidas distintas no âmbito de cada Projecto Aveiro Digital.

Aveiro Digital 2003 - 2006 www.aveiro-digital.pt

SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

piar **Portugal Digital POSI**

- GAD
- PAD 2003-2006
- AI 1
- AI 2
- AI 3
- AI 4
- AI 5
- AI 6
- AI 7
- AI 8
- bibria
- INFORDICO
- MEMDigital
- P@Z
- SIGRED
- AAD - TA
- Adira
- IPDIGITAL
- piar
 - Plano Técnico e Fin.
 - Identificação
 - Entidades Beneficiárias
 - Descrição Sumária
 - Descrição Detalhada
 - Tarefas e Resultados
 - A-Gestão
 - B-Concertação
 - C-Avaliação
 - D-Formação
 - 1-Identificação de requisitos e formatação de informação
 - 2-Desenvolvimento
 - 3-Integração e teste de "laboratório"
 - 4-Aquisição, instalação e teste em campo
 - 5-Validação e operação
 - Cronograma
 - Lista de Recursos
 - Orçamento
 - Documentos Adicionais
 - Relatório de Impressão
 - Gestão Técnica
 - Gestão Formação
 - Gestão Certificação
 - Gestão Financeira

TAREFA NºD - Formação - piar

Tarefa: Formação

Data de Início: 1 Data de Fim: 36 Duração (meses): 36

Dependências: 2 5 Total RH(hm): 6

Responsável: rtn

Participantes: p1 p2 p3 p4 p5 ---

Objectivos:

- 1 Qualificação em TIC e Certificação em Competências Básicas
População: responsáveis por associações culturais, recreativas, desportivas...
Justificação: para poderem usufruir das potencialidades do projecto PIAR
- 2 Qualificação nos Serviços e Aplicações do Projecto
População: responsáveis por associações culturais, recreativas, desportivas...
Justificação: para poderem contribuir com a informação da actividade da sua organização

Descrição:

- 1 Histórico de Formação (210 caracteres)
formação básica na utilização das ferramentas de edição de texto
Formação básica no acesso à internet e na utilização de e-mail
- 2 Programas de Formação (1150 caracteres)
-formação em gestão e operação de redes locais
-formação básica na utilização das TICs
-formação avançada na utilização das ferramentas de "office" (edição de texto, folhas de cálculo, bases de dados simples, apresentação com apoio informático, construção de páginas web, ferramentas de comunicação via web-"netmeeting", chat...)
-formação na utilização da plataforma do projecto PIAR
- 3 Entidades Certificadas para o fornecimento de Formação (210 caracteres)
PT Inovação/GIAGI/Companhia Própria/Ideia Verde/CNS/...

Lista de Resultados e Calendário:

Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	Início	Fim	Duração	Local	Nº de acções	Total de Formandos
utilização da plataforma	7	36	30h/5dias	ilhavo	18	180
utilização da plataforma	7	36	30h/5dias	aveiro	18	180
utilização da plataforma	7	36	30h/5dias	estarreja	18	180

Formação Competências Básicas em TIC D.L. 140/2001 (Práticas Simuladas)	Início	Fim	Duração	Local	Nº de acções	Total de Formandos
competências básicas	6	36	15h/3dias	ilhavo	9	90
competências básicas	6	36	15h/3dias	aveiro	9	90
competências básicas	6	36	15h/3dias	estarreja	9	90

Certificação em Competências Básicas	Início	Fim	Local	Nº de Certificações
utilização de ferramentas	6	24	ilhavo	100
utilização de ferramentas	6	24	aveiro	150

Orçamento da Tarefa

Rúbrica de Investimento	Ano 1 €	Ano 2 €	Ano 3 €	Total €	%
Despesas de Capital / Imobilizadas Corpóreas					
Equipamento	0	0	0	0	0
Outras despesas de investimento	0	0	0	0	0
Sub-Total					

Plano Técnico e Financeiro: Tarefa D – Formação

A harmonização da execução das 3 Medidas foi conseguida através da concepção de um modelo para o Plano Técnico e Financeiro como referência base das Candidaturas e que após a selecção e aprovação dos Projectos se assumiu como compromisso de execução de cada Projecto onde constam todos os resultados técnicos e respectivos orçamentos que as Entidades Beneficiárias contratualizaram com a CEAD.

A estrutura do Plano Técnico e Financeiro contempla quatro tarefas mandatórias: Gestão, Concertação, Avaliação e Formação. A Tarefa D – Formação tem um formato especificamente orientado para os requisitos do FSE na identificação da Formação a executar.

Dada a natureza dos Projectos enquadrados no Programa Aveiro Digital, a Formação é uma necessidade associada ao treino dos agentes que vão operar os sistemas e serviços desenvolvidos em cada Projecto.

A Formação faz assim parte do sistema de qualificação das organizações que se modernizam com os investimentos comprometidos nos Projectos Aveiro Digital.

Assim, contemplam-se duas tipologias de Formação: em Serviços e Aplicações desenvolvidas no âmbito dos Projectos e a Formação em Tecnologias da informação e Comunicação.

Esta segunda tipologia só é justificada quando agregada e como suporte à primeira, que representa a qualificação fundamental.

O peso do orçamento da Tarefa D – Formação foi estabelecido à partida dentro de um intervalo aberto entre os 9,5% e os 10,5% do orçamento global do Projecto, sendo a tipologia de despesa também limitada à aquisição de serviços externos de Formação, devendo as Entidades Formadoras estar Certificadas para o efeito.

O Papel da CEAD neste processo é de acompanhar e verificar a execução qualificada dos planos de formação comprometidos pelos Projectos.

SAVAD: GESTÃO DA FORMAÇÃO

Integrada no Sistema SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital, foi criada uma área de Gestão da Formação que implementa os procedimentos de gestão, informação e controlo do FSE e contempla as seguintes funcionalidades:

- o Gestão da Formação: Menu inicial

Nesta página encontram-se todos os relatórios relativos às diversas Acções de Formação já realizadas, podendo-se imprimir esses relatórios.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt

SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital
S.I.G.Ria

Portugal Digital **POSI** 

GAD

PAD 2003-2006

SAE

AI 1

AI 2

SICAVIM

S.I.G.Ria

- Plano Técnico e Fin.
- Gestão Técnica
- Gestão Formação
 - Entidades Formadoras
 - Cursos
 - Formandos
 - Relatório de Formação
- Gestão Certificação
- Gestão Financeira
- Avaliação

Ambi-Ria

Mobi-Ria

Secur-Ria

AEI

SAL - On Line

SEVER INFORMA

VAGOS-INFORMA

Ria-on-line

AI 3

AI 4

AI 5

AI 6

AI 7

AI 8

Sair

GESTÃO FORMAÇÃO - S.I.G.Ria

Lista de Relatórios de Formação

Designação	Acção	Entidade	Estado	Dossier	Verificação	Imprimir
C17A1-2272-B	2272-Implementing and Supporting Microsoft Win.XP Professional Turma B, Acção nº 1	CESAE - Centro de Serviços e Apoio às Empresas	Verificado		12/12/2005	
C16A1-2272-A	2272-Implementing and Supporting Microsoft Win.Xp Professional Turma A, Acção nº 1	CESAE - Centro de Serviços e Apoio às Empresas	Verificado		12/12/2005	
C15A1-2824-B	2824 - Implem. Microsoft Internet Security and Accel server 2004 TURMA B, Acção nº 1	CESAE - Centro de Serviços e Apoio às Empresas	Verificado		12/12/2005	
C14A1-2824-A	2824 - Implem. Microsoft Internet Security and Accel server 2004 TURMA A, Acção nº 1	CESAE - Centro de Serviços e Apoio às Empresas	Verificado		12/12/2005	
C12A1-2073-B	2073-PROGRAMMING A MICROSOFT SQL SERVER 2000 DATABASE TURMA B, Acção nº 1	CESAE - Centro de Serviços e Apoio às Empresas	Verificado		26/09/2005	
C10A1-2072-B	2072-ADMINISTERING A MICROSOFT SQL SERVER 2000 DATABASE TURMA B, Acção nº 1	CESAE - Centro de Serviços e Apoio às Empresas	Verificado		26/09/2005	
C11A1-2073-A	2073-PROGRAMMING A MICROSOFT SQL SERVER 2000 DATABASE TURMA A, Acção nº 1	CESAE - Centro de Serviços e Apoio às Empresas	Verificado		26/09/2005	
C9A1-2072-A	2072-ADMINISTERING A MICROSOFT SQL SERVER 2000 DATABASE TURMA A, Acção nº 1	CESAE - Centro de Serviços e Apoio às Empresas	Verificado		26/09/2005	
C1A2-Mst V8 - 2004 Edition 2	MicroStation V8 - 2004 Edition, Acção nº 2	Bentley Systems Ibérica	Verificado		14/07/2005	
C1A1-Relatorio Formacao Mst V8 - 2004 Edition 1	MicroStation V8 - 2004 Edition, Acção nº 1	Bentley Systems Ibérica	Verificado		14/07/2005	

Desenvolvido por NETUAL

Gestão da Formação: Menu inicial

- o Gestão da Formação: Entidades Formadoras

A identificação das entidades formadoras contratadas para prestarem serviços de formação é inserida nesta área de trabalho pela Entidade Beneficiária Principal.

A EBP pode atribuir um login e uma *password* a cada Entidade Formadora, para que esta seja responsável pela introdução da informação e dos documentos exigidos pela regulamentação do financiamento FSE.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt



SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

Ria.EDU



- GAD
- PAD 2003-2006
- SAE
- AI 1
- AI 2
- AI 3
- e-RIA
- PorMat
- Professor
- e-CMEI
- Ria.EDU
 - Plano Técnico e Fin.
 - Gestão Técnica
 - Gestão Formação
 - Entidades Formadoras
 - Cursos
 - Formandos
 - Relatório de Formação
 - Gestão Certificação
 - Gestão Financeira
 - Avaliação
- AI 4
- AI 5
- AI 6
- AI 7
- AI 8
- Sair

GESTÃO FORMAÇÃO - Ria.EDU

ENTIDADES FORMADORAS

Inserir nova Entidade Formadora

Nome: NIF:

Morada:

Telefone: Contacto:

Associada a esta Entidade Formadora, será criada automaticamente uma conta no SAVAD, para a gestão da respectiva formação neste projecto.

Login: Password:

Listagem de Entidades Formadoras

Entidade	Telefone	Contacto	Login	Password	Apagar
Centro de Formação A. Escolas Albergaria-A-Velha	234527797	José Manuel Silva	RIA.EDUEF4	cfavelha	■
Centro de Formação A. Escolas Oliveira do Bairro	234738688	Rosa Chambel	cfpolibairro@mail.telepac.pt	cfaeob03	■
Centro de Formação AE Sever do Vouga	234556166	Emídio Ferro	RIA.EDUEF7	cfaesv	■
Centro de Formação de Professores de Águeda	234604761	Hermínia Viegas	cfpa@mail.telepac.pt	viegas	■
Centro de Formação de Professores de OVAR	256581008	José Couceiro	cfovar@mail.aceav.pt	dircfovar	■
Centro de Formação Escolas do Concelho de Ílhavo	234365419	Manuel Pina	RIA.EDUEF2	cfeci02	■
Centro de Formação InterMunicipal Egas Moniz	234845011	Lurdes	RIA.EDUEF8	cfiem	■
Centro de Formação José Pereira Tavares	234340224	Fernando Delgado	RIA.EDUEF1	cfaecca	■

Desenvolvido por NETUAL

Gestão da Formação: Entidades Formadoras

o Gestão da Formação: Cursos

A informação relativa aos Cursos e respectivas Acções de Formação é inserida nesta área de trabalho. Todos os Cursos têm de ser associadas a uma Entidade Formadora, previamente definida.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt

SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

Incluinet Portugal Digital POSI

- GAD
- PAD 2003-2006
- SAE
- AI 1
- AI 2
- AI 3
- AI 4
- AI 5
- AI 6
- SAISS
- Estar
- SAD-SDS
- Incluinet
 - Plano Técnico e Fin.
 - Gestão Técnica**
 - Gestão Formação
 - Entidades Formadoras
 - Cursos
 - Formandos
 - Relatório de Formação
 - Gestão Certificação
 - Gestão Financeira
 - Avaliação
- ISSI
- AMRIASocial
- AI 7
- AI 8
- Sair

GESTÃO FORMAÇÃO - Incluinet

CURSOS

Inserir novo Curso

Tipo:

Entidade Formadora:

Curso:

Inserir nova Acção

Curso: Local:

Início: Fim: Nº de Horas:

Formador:

Listagem de Cursos

Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)

Curso	Entidade Formadora	Apagar
C4 - As TIC nos Audiovisuais, sua utilização	SOFTAG - Informática e Escritórios, S.A.	-
C4A1 - Acção nº1 de 06/09/2005 a 19/09/2005		
C5 - As Novas Ferramentas de Comunicação	SOFTAG - Informática e Escritórios, S.A.	-
C5A1 - Acção nº1 de 21/09/2005 a 04/10/2005		
C6 - Construção de Páginas Web	SOFTAG - Informática e Escritórios, S.A.	-
C6A1 - Acção nº1 de 10/10/2005 a 20/10/2005		

Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)

Curso	Entidade Formadora	Apagar
C1 - Introdução ao Windows	SOFTAG - Informática e Escritórios, S.A.	-
C1A1 - Acção nº1 de 27/04/2005 a 12/05/2005		
C2 - Word	SOFTAG - Informática e Escritórios, S.A.	-
C2A1 - Acção nº1 de 18/05/2005 a 30/05/2005		
C3 - Internet e Correio Electrónico	SOFTAG - Informática e Escritórios, S.A.	-
C3A1 - Acção nº1 de 06/06/2005 a 16/06/2005		

Desenvolvido por NETUAL

Gestão da Formação: Cursos

- o Gestão da Formação: Formandos

A informação obrigatória pela regulamentação FSE relativamente à identificação e caracterização dos Formandos associados a cada Acção de Formação é inserida nesta área de trabalho.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt

SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

ISSI Portugal Digital POSI

- GAD
- PAD 2003-2006
- SAE
- AI 1
- AI 2
- AI 3
- AI 4
- AI 5
- AI 6
- SAISS
- Estar
- SAD-SOS
- Inclinet
- ISSI
 - Plano Técnico e Fin.
 - Gestão Técnica
 - Gestão Formação
 - Entidades Formadoras
 - Cursos
 - Formandos
 - Relatório de Formação
 - Gestão Certificação
 - Gestão Financeira
 - Avaliação
- AMRIASocial
- AI 7
- AI 8
- Sair

Desenvolvido por NETUAL

GESTÃO FORMAÇÃO - ISSI

FORMANDOS

Área de Formação

Inserir Formando

Acções:
 Resultado:

Nome: Apelido: BI:
 Sexo: Grupo Etário:
 Morada:
 Código Postal: Localidade:
 Situação face ao Emprego:
 Habilitações Literárias:

Listagem de formandos em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)
Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)
2-Formação em Aplicações Multimédia
 Acção nº 1, 30 horas de 04/04/2005 a 09/05/2005 por Carlos Rodrigues
 Sofia Querido Aprovada
 Sandra Parada Aprovada
 Alice Subida Aprovada
 Elizabeth Lameiro Aprovada
 Ana Luísa Portela Aprovada
 Yenny Jesus Aprovada
 Sandra Correia Aprovada
 Clara Duarte Aprovada
 Patrícia Lara A. Santos Paiva Aprovada

Gestão da Formação: Formandos

- o Gestão da Formação: Relatórios de Formação

O Dossier Técnico e Pedagógico produzido por cada Acção de Formação, de acordo com a Portaria 799-B/2000, de 20/09, é inserido nesta área de trabalho.

Aveiro Digital 2003 - 2006
www.aveiro-digital.pt



Aveiro digital
2003-2006

SAVAD - Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

ContactUA



Portugal Digital POSI
PROGRAMA OPERACIONAL
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
REGIÃO ALENTEJANA

- GAD
- PAD 2003-2006
- AI 1
- AI 2
- AI 3
- AI 4
- e-ABS
- SITUA
 - ContactUA
 - Plano Técnico e Fin.
 - Gestão Técnica
 - Gestão Formação
 - Entidades Formadoras
 - Cursos
 - Formandos
 - Relatório de Formação
 - Gestão Certificação
 - Gestão Financeira
 - SinBAD
 - NARTURAL
 - RAdIcal
- AI 5
- AI 6
- AI 7
- AI 8
- Sair

GESTÃO FORMAÇÃO - ContactUA

Entregar Relatório

Curso/Acção:

Entidade Formadora: _____

Total de Formandos: _____

Designação do Relatório: _____

Lista de Relatórios de Formação

Designação	Acção	Entidade	Estado	Apagar	Dossier	Verificação	Imprimir
Dossier Técnico Pedagógico	Moc2012&Moc2014-Planning, Implementing, and Managing a Microsoft SharePoi, Acção nº 1	ACE - Plus, Soluções Informáticas, S.A.	Em Curso	-			

Desenvolvido por **NETUAL**

Gestão da Formação: Relatório de Formação

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MATERIAL

Introdução

Os compromissos de Formação assumidos pelos 71 Projectos em curso envolvem directamente 16.626 formandos: 7.518 em Serviços e Aplicações desenvolvidos no âmbito dos Projectos e 9.108 em Competências Básicas. O Volume de Formação comprometido é de 362.160 horas, das quais 225.540 são em Formação em Serviços e Aplicações e 136.620 em TIC. O orçamento global para Formação é de 1.807.586€.

Até final de 2005, tinham já sido ministradas 144 acções de formação, qualificando 2.089 pessoas, através de 20.222 horas de formação em Serviços e Aplicações e 16.845 horas de formação em TIC.

De seguida, evidencia-se o compromisso de Formação por Área de Intervenção e Projecto e a execução já realizada.

ÁREA DE INTERVENÇÃO 2: AUTARQUIAS E SERVIÇOS CONCELHIOS

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 2 vai qualificar directamente 4.637 pessoas, através de 63.210 horas de formação em Serviços e Aplicações e 37.950 horas em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 516.500€. Até final de 2005, tinham já sido ministradas 37 acções de formação, qualificando 476 pessoas, através de 8.785 horas de formação em Serviços e Aplicações.

P 2.1. Cadastros Predial Rústico e Urbano Digital

SICAVIM, Ref. PAD 017

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

SICAVIM, Ref. PAD 017	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	45.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Aquisição e processamento de informação cadastral SIG	1	9	-	-
Estruturação e manutenção de BD cadastrais	1	9	-	-
Utilização, actualização e manutenção do sistema	2	18	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Módulo 4 – Competências básicas em TIC	12	192	-	-
Total	16	228	-	-

P 2.2. SIG / Região da Ria de Aveiro

SIGRIA, Ref. PAD 001

Através deste projecto foram já realizadas 20 acções de Formação, onde participaram 217 formandos num total de 6.055 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

S.I.G.RIA, Ref. PAD 001	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	226.500€	Orçamento	58.533€
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Formação em Gestão de Sistemas Operativos	2	6	4	44
Formação em Gestão de Redes Microsoft	2	6	4	46
Formação em Segurança de Redes de Dados	2	6	2	22
Formação em Aquisição e Edição de Dados em SIG	1	12	0	0
Formação em Geodesia e Sistemas de Coordenadas	1	12	0	0
Formação em Estruturação de Bases de Dados	1	12	0	0
Formação em Manutenção de Cartografia Digital	1	12	0	0
Formação em Análise Espacial em SIG	1	12	0	0
Formação específica no software adquirido	10	105	10	105
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação em TIC	15	100	0	0
Total	36	283	20	217

P 2.3. Sistemas de Gestão Ambiental

Ambi-Ria, Ref. PAD 140

Através deste projecto foi já realizada 1 acção de Formação, onde participaram 12 formandos num total de 420 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Ambi-Ria, Ref. PAD 140	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	37.500€	Orçamento	6.580€
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Aplicação Ambi-Ria	4	48	1	12
Total	4	48	1	12

P 2.4. Sistemas Integrados de Mobilidade

Mobi-Ria, Ref. PAD 138

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	40.000€	Orçamento	0 €
Mobi-Ria, Ref. PAD 138				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Aplicação Mobi-Ria fase 1	2	24	-	-
Aplicação Mobi-Ria fase 2	2	24	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação em CBTIC	2	24	-	-
Formação em CBTIC	2	24	-	-
Total	8	96	-	-

P 2.5. Serviços de Segurança e Protecção Civil

Secur-Ria, Ref. PAD 101

Através deste projecto foi já realizada 1 acção de Formação, onde participaram 12 formandos num total de 420 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	39.000€	Orçamento	6.580€
Secur-Ria, Ref. PAD 101				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Aplicação Secur-Ria	4	48	1	12
Total	4	48	1	12

P 2.6. Administração Local para o Cidadão

AEI, Ref. PAD 020

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	37.500€	Orçamento	0 €
AEI, Ref. PAD 020				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Operação Back e Front offices	12	380	-	-
Operação Interacção transacção	12	380	-	-
Operação e Manutenção Técnica	12	6	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas TIC	30	870	-	-
Total	66	1636	-	-

Sal-On-Line, Ref. PAD 016

Através deste projecto foram já realizadas 15 acções de Formação, onde participaram 235 formandos num total de 1.890 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	60.000€	Orçamento	26.642 €
SAL- On Line, Ref. PAD 016				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Operação Back e Front offices	25	400	15	235
Operação Interacção transacção	25	400	0	0
Operação e Manutenção Técnica	6	14	0	0
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas TIC	50	1000	0	0
Total	106	1814	15	235

SeverInforma, Ref. PAD 023

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	18.500€	Orçamento	0 €
SEVER INFORMA, Ref. PAD 023				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Operação Back e Front offices	4	30	-	-
Operação Interacção transacção	4	30	-	-
Operação e Manutenção Técnica	4	2	-	-
Formação Competências Básicas em TIC	0	0		
Formação Competências Básicas TIC	10	120	-	-
Total	22	182	-	-

VagosInforma, Ref. PAD 018

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	12.500€	Orçamento	0 €
VAGOS-INFORMA, Ref. PAD 018				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Operação Back e Front offices	4	50	-	-
Operação Interacção transacção	4	50	-	-
Operação e Manutenção Técnica	4	2	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas TIC	10	200	-	-
Total	22	302	-	-

P 2.7. Portal de Serviços da Administração Local

Ria-On-line, Ref. PAD 141

Este projecto solicitou uma alteração ao Plano Técnico e Financeiro, onde abdicou da Formação, pois todos os elementos da Entidade Beneficiária Principal irão adquirir as competências necessárias para utilizar a aplicação desenvolvida através deste projecto através de outro projecto, o SIG RIA, Ref. PAD 001.

ÁREA DE INTERVENÇÃO 3: ESCOLAS E COMUNIDADES EDUCATIVAS

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 3 vai qualificar directamente 4.529 pessoas, através de 57.390 horas de formação em Serviços e Aplicações e 39.240 horas em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 209.000€. Até final de 2005, tinham já sido ministradas 60 acções de formação, qualificando 1.082 pessoas, através de 4.935 horas de formação em Serviços e Aplicações e 11.745 horas de formação em TIC.

P 3.1. Serviços de Gestão e Administração da Rede Escolar

e-RIA, Ref. PAD 060

Através deste projecto foram já realizadas 2 acções de Formação, onde participaram 30 formandos num total de 900 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

e-RIA, Ref. PAD 060	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	84.000€	Orçamento	4.300 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Gestão e manutenção de redes	1	104	2	30
Aplicações de Back-Offices	4	156	-	-
Aplicações de Front-Offices	1	104	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas	6	104	-	-
Formação Competências Básicas	10	200	-	-
Formação Competências Básicas	40	800	-	-
Total	62	1468	2	30

P 3.2. Curricula Digital

PorMat:, Ref. PAD 067

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

PorMat, Ref. PAD 067	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	30.500€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Software PorMat	1	15	-	-
Software PorMat	1	15	-	-
Total	2	30	-	-

P 3.3. Serviços de Formação à Distância de Professores

Professor, Ref. PAD 145

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Professor, Ref. PAD 145	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	12.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Formação de e-formadores	3	36	-	-
Formação de e-formadores	3	36	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas	6	72	-	-
Formação Competências Básicas	15	240	-	-
Total	27	384	-	-

P 3.4. Expansão e Consolidação das Comunidades Educativas

e-CMEI, Ref. PAD 022

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

e-CMEI, Ref. PAD 022	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	12.500€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Utilização da plataforma	11	50	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas	12	250	-	-
Total	23	300	-	-

Ria.EDU, Ref. PAD 006

Através deste projecto foram já realizadas 58 acções de Formação, onde participaram 1.052 formandos num total de 4.035 horas de formação em Serviços e Aplicações e 11.745 horas de formação em TIC. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Ria.EDU, Ref. PAD 006	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	70.000€	Orçamento	30.600 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Caderneta & Dossier	30	530	10	157
Produção Materiais WEB	24	317	-	-
Funcionalidades do Dossier Pedagógico	32	466	6	112
Windows SharePoint Services	2	24	-	-
Instalação e Manutenção de Sistemas Informáticos	1	15	-	-
Implementação e Gestão de Servidores Windows em Ambiente Lan e Web	2	30	-	-
Microsoft Windows 2003 Server e Microsoft Isa Server	1	15	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Windows; Word	3	50	2	37
Internet; e-mail	48	900	40	746
Total	143	2347	58	1052

ÁREA DE INTERVENÇÃO 4: UNIVERSIDADE E COMUNIDADE

UNIVERSITÁRIA

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 4 vai qualificar directamente 320 pessoas, através de 5.280 horas de formação em Serviços e Aplicações e 2.160 horas de formação em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 198.308€. Até final de 2005, tinham já sido ministradas 4 acções de formação, qualificando 36 pessoas, através de 1.400 horas de formação em Serviços e Aplicações.

P 4.1. Sistemas para a Gestão de Aquisição de Bens e Serviços

e-ABS, Ref. PAD 008

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	9.316€	Orçamento	0 €
e-ABS, Ref. PAD 008				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
e-ABS	2	32	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Office	1	16	-	-
Total	3	48	-	-

P 4.2. Teletrabalho

SITUA, Ref. PAD 009

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	102.500€	Orçamento	0 €
SITUA, Ref. PAD 009				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Aplicações várias	20	16	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Office	14	16	-	-
Total	34	32	-	-

P 4.3. Contact-Ciência

ContactUA, Ref. PAD 010

Através deste projecto foi já realizada 1 acção de Formação, onde participaram 4 formandos num total de 120 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

ContactUA, Ref. PAD 010	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	20.000 €	Orçamento	3.423 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Qualificação em Serviços e Aplicações do projecto	1	16	1	4
Qualificação em Serviços e Aplicações do projecto	1	16	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Office	4	64	-	-
Total	6	96	1	4

P 4.4. Biblioteca Digital da UA

SInBAD, Ref. PAD 012

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

SInBAD, Ref. PAD 012	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	30.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Aplicações várias	4	16	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Office	7	16	-	-
Total	11	32	-	-

P 4.5. ArteDigital

Natural, Ref. PAD 108

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

NARTURAL, Ref. PAD 108	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	20.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Fotografia Digital	1	16	-	-
Vídeo Digital	1	16	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Módulo de formação	2	16	-	-
Total	4	48	-	-

P 4.6. Produção Multimédia para a Formação Profissional e Educação

RAdlcal, Ref. PAD 014

Através deste projecto foram já realizadas 3 acções de Formação, onde participaram 32 formandos num total de 1.280 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Radical, Ref. PAD 014	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	16.492€	Orçamento	6.926 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Uso e gestão do Radlcal	1	16	1	16
Uso do Didaktos	1	16	-	-
Gestão Avançada do Radlcal	2	16	2	16
Formação Competências Básicas em TIC				
Módulo de formação	2	16	-	-
Total	6	64	3	32

ÁREA DE INTERVENÇÃO 5: SERVIÇOS DE SAÚDE

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 5 vai qualificar directamente 780 pessoas, através de 13.800 horas de formação em Serviços e Aplicações e 4.800 horas de formação em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 162.500€. Até final de 2005, tinham já sido ministradas 10 acções de formação, qualificando 185 pessoas, através de 510 horas de formação em Serviços e Aplicações e 2.520 horas de formação em TIC.

P 5.3. Serviços de Diagnóstico Remoto

RDSR, Ref. PAD 039

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

RDSR, Ref. PAD 039	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	80.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Prática utilização e métodos telediagnóstico	30	30	-	-
Prática utilização e métodos telediagnóstico	30	30	-	-
Melhoria das técnicas de telediagnóstico	60	60	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Qualificação competências TIC	10	50	-	-
Qualificação competências TIC	10	50	-	-
Total	140	220	-	-

P 5.4. Saúde Online

RTS, Ref. PAD 071:

Através deste projecto foram já realizadas 10 acções de Formação, onde participaram 185 formandos num total de 510 horas de formação em Serviços e Aplicações e 2.520 horas de formação em TIC. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

RTS, Ref. PAD 071	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	82.500€	Orçamento	25.243 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Utilização do Portal da Saúde	11	220	-	-
Utilização da Intranet (PCE)	5	100	-	-
Formação em BHP	1	20	1	17
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação em Competências Básicas	9	180	9	168
Formação em Competências Básicas	2	40	-	-
Total	28	560	10	185

ÁREA DE INTERVENÇÃO 6: SOLIDARIEDADE SOCIAL

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 6 vai qualificar directamente 487 pessoas, através de 7.380 horas de formação em Serviços e Aplicações e 3.615 horas em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 122.350€. Até final de 2005, tinham já sido ministradas 14 acções de formação, qualificando 142 pessoas, através de 1.872 horas de formação em Serviços e Aplicações e 1.260 horas em TIC.

P 6.1. Serviços de Gestão e Administração da Rede Social

SAISS, Ref. PAD 015

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

SAISS, Ref. PAD 015	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	75.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
STC	4	80	-	-
SIDEI	1	20	-	-
SSAD	1	15	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Qualificação em TIC - utentes	1	6	-	-
Qualificação em TIC - utentes	1	6	-	-
Total	8	127	-	-

P 6.2. Conteúdos Pedagógicos

Estar, Ref. PAD 128

Através deste projecto foram já realizadas 4 acções de Formação, onde participaram 47 formandos num total de 510 horas de formação em Serviços e Aplicações e 450 horas de formação em TIC. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Estar, Ref. PAD 128	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	8.000€	Orçamento	8.000 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Uso de meios Audiovisuais e Técnico Pedagógicos	1	14	1	17
Formação Competências Básicas em TIC				
Introdução ao windows	1	10	1	10
Internet e correio electrónico	1	10	1	10
Word	1	10	1	10
Total	4	44	4	47

P 6.4. Viver em Segurança

SAD_SOS, Ref. PAD 102

Através deste projecto foi já realizada 1 acção de Formação, onde participaram 4 formandos num total de 252 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

SAD-SOS, Ref. PAD 102	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	4.000€	Orçamento	2.999 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Windows XP	1	12	-	-
Office XP	1	12	-	-
Formação em Call Center	1	6	1	4
Formação Competências Básicas em TIC				
Competências Básicas	10	100	0	0
Total	13	130	1	4

P 6.5. Inclusão Social na SI

Incluinet, Ref. PAD 132

Através deste projecto foram já realizadas 6 acções de Formação, onde participaram 64 formandos num total de 840 horas de formação em Serviços e Aplicações e 540 horas de formação em TIC. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Incluinet, Ref. PAD 132	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	10.100€	Orçamento	10.100 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
As TIC nos audiovisuais – sua utilização	1	12	1	10
As novas ferramentas de comunicação	1	12	1	9
Construção de Páginas WEB	1	12	1	9
Formação Competências Básicas em TIC				
Introdução ao Windows	1	12	1	12
Word	1	12	1	12
Internet e Correio Electrónico	1	12	1	12
Total	6	72	6	64

ISSI, Ref. PAD 133

Através deste projecto foram já realizadas 3 acções de Formação, onde participaram 27 formandos num total de 270 horas de formação em Serviços e Aplicações e 270 horas de formação em TIC. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

ISSI, Ref. PAD 133	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	14.250€	Orçamento	6.333 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Técnicos Instituições	1	9	1	9
Idosos	1	9	-	-
Info-excluídos geral	2	9	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Técnicos Instituições	1	9	1	9
Idosos	1	18	1	9
Info-excluídos geral	2	36	-	-
Total	8	90	3	27

P 6.8. Balcão Único de Solidariedade Social**AMRiaSocial, Ref. PAD 113**

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

AMRIASocial, Ref. PAD 113	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	11.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Gestor de conteúdos	3	24	-	-
Total	3	24	-	-

ÁREA DE INTERVENÇÃO 7: TECIDO PRODUTIVO

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 7 vai qualificar directamente 2.833 pessoas, através de 37.530 horas de formação em Serviços e Aplicações e 23.730 horas em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 332.328€. Até final de 2005, tinham já sido ministradas 16 acções de formação, qualificando 142 pessoas, através de 2.420 horas de formação em Serviços e Aplicações e 1.155 horas em TIC.

P 7.1. Informar e Mobilizar para Inovar

Geo-MKT, Ref. PAD 029

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Geo-MKT, Ref. PAD 029	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	14.983€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Tecnologia e Gestão de ZING	2	50	-	-
Parâmetros localização de ZING	2	50	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Competências Básicas em TIC	4	100	-	-
Total	8	200	-	-

P 7.3. Serviços de Turismo

TIC & TU, Ref. PAD 112

Através deste projecto foram já realizadas 2 acções de Formação, onde participaram 10 formandos num total de 210 horas de formação em Serviços e Aplicações e 90 horas de formação em TIC. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

TIC & TU, Ref. PAD 112	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	16.281€	Orçamento	7.036 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Tratamento da informação	2	11	1	7
Utilização de back-office	2	27	0	0
Gestão e disponibilização de serviços	1	20	0	0
Formação Competências Básicas em TIC				
Introdução às TIC	1	3	1	3
Total	6	61	2	10

P 7.4. Zonas Industriais de Nova Geração

GeoInvest, Ref. PAD 027

Através deste projecto foi já realizada 1 acção de Formação, onde participaram 13 formandos num total de 195 horas de formação em TIC. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	30.780€	Orçamento	1.500 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Formação no Sistema GeoInvest	2	14	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Competências Básicas em TIC	1	14	1	13
Total	3	28	1	13

P 7.5. Modernizar a Indústria, o Comércio e os Serviços

Abdigital, Ref. PAD 106

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	12.267€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Serviços de FrontOffice e BackOffice	1	15	-	-
Serviços e aplicações desenvolvidas	1	15	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas	2	30	-	-
Total	4	60	-	-

ABS XXI, Ref. PAD 036

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	5.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Sistemas Informática/Gestão	1	15	-	-
Plataforma de serviços	2	30	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas	4	60	-	-
Total	7	105	-	-

Atletica, Ref. PAD 139

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	5.200€	Orçamento	0 €
ATLETICA, Ref. PAD 139				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Funcionamento da aplicação	2	10	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Competências Básicas	3	60	-	-
Total	5	70	-	-

Braxen, Ref. PAD 115

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	4.410€	Orçamento	0 €
Braxen, Ref. PAD 115				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Sistemas Informática/Gestão	1	15	-	-
Plataforma de serviços	2	30	-	-
Formação Competências Básicas em TIC	0	0		
Formação Competências Básicas	2	30	-	-
Total	5	75	-	-

CADERNO DIGITAL, Ref. PAD 147

Através deste projecto foi já realizada 1 acção de Formação, onde participaram 7 formandos num total de 630 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	5.000€	Orçamento	5.000 €
CADERNO DIGITAL, Ref. PAD 147				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Aplicações On-Line	1	7		
Zona de Teletrabalho	1	7	1	7
Gestor de Conteúdos	1	7		
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação em Competências Básicas	1	7	0	0
Formação em Competências Básicas	1	7	0	0
Formação em Competências Básicas	1	7	0	0
Total	6	42	1	7

Com.Web, Ref. PAD 137

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Com.Web, Ref. PAD 137	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	4.500€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Intranet / Extranet	1	10	-	-
Plataforma de teletrabalho	1	5	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Autoaprendizagem com elearning	2	5	-	-
Total	4	20	-	-

DigiPot, Ref. PAD 119

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

DigiPot, Ref. PAD 119	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	4.830€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Sistemas Informática/Gestão	1	15	-	-
Plataforma de serviços	2	30	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas	3	45	-	-
Total	6	90	-	-

Digivacas, Ref. PAD 064

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Digivacas, Ref. PAD 064	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	15.750€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Formação Contrastadores	4	32	-	-
Formação Pessoal Administrativo	1	5	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação aos Criadores	15	315	-	-
Total	20	352	-	-

e-NL, Ref. PAD 069

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

e-NL, Ref. PAD 069	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	4.100€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Gestão documental	1	15	-	-
Gestão e Produção	1	15	-	-
Qualidade nos serviços	1	15	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação em Competências Básicas	3	45	-	-
Total	6	90	-	-

e-SI, Ref. PAD 123

Através deste projecto foi já realizada 1 acção de Formação, onde participaram 12 formandos num total de 360 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

e-SI, Ref. PAD 123	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	6.000€	Orçamento	5.989 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Formação em serviços	1	20	1	12
Total	1	20	1	12

ESTAG, Ref. PAD 033

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Estag, Ref. PAD 033	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	3.408€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Sistemas Informática/Gestão	1	15	-	-
Plataforma de serviços	1	10	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas	2	30	-	-
Total	4	55	-	-

Extraplas, Ref. PAD 110

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	4.500€	Orçamento	0 €
Extraplas, Ref. PAD 110				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Extranet	1	30	-	-
Sistema de Controlo de Produção	1	30	-	-
Sistema de Controlo de Tarefas	1	30	-	-
Total	3	90	-	-

FIG-NET, Ref. PAD 031

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	3.550€	Orçamento	0 €
FIG-NET, Ref. PAD 031				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Sistemas Informática/Gestão	1	15	-	-
Plataforma de serviços	1	10	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas	2	30	-	-
Total	4	55	-	-

GALILEU-DIAG, Ref. PAD 148

Através deste projecto foram já realizadas 2 acções de Formação, onde participaram 10 formandos num total de 360 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	4.600€	Orçamento	4.313 €
GALILEU – DIAG, Ref. PAD 148				
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Utilização da aplicação	1	4	1	6
Serviço de Excelência	1	4	1	4
Instalação da aplicação	1	4	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Colaboradores	1	4	-	-
Total	4	16	2	10

HMC, Ref. PAD 042

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

HMC, Ref. PAD 042	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	9.500€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Novas ferramentas	1	13	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Internet, busca e email	1	13	-	-
Total	2	26	-	-

Imagem XXI, Ref. PAD 118

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Imagem XXI, Ref. PAD 118	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	4.704€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Sistemas Informática/Gestão	1	15	-	-
Plataforma de serviços	1	15	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas	2	30	-	-
Total	4	60	-	-

Inovortal, Ref. PAD 032

Através deste projecto foram já realizadas 2 acções de Formação, onde participaram 20 formandos num total de 300 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Inovortal, Ref. PAD 032	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	9.500€	Orçamento	4.750 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Formação em serviços do Centro	1	20	2	20
Formação em e-Commerce	1	20	0	0
Formação Competências Básicas em TIC				
Auto aprendizagem usando e-learning		200	0	0
Total	2	240	2	20

JFD, Ref. PAD 117

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

JFD, Ref. PAD 117	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	4.914€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Sistemas Informática/Gestão	1	15	-	-
Plataforma de serviços	2	30	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas	3	45	-	-
Total	6	90	-	-

MARC, Ref. PAD 074

Através deste projecto foram já realizadas 4 acções de Formação, onde participaram 58 formandos num total de 870 horas de formação em TIC. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

MARC, Ref. PAD 117	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	14.050€	Orçamento	5.800 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Aplicações de Gestão Documental	3	30	-	-
Aplicações de Planeamento em T	3	30	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Competências Básicas	8	88	4	58
Total	14	148	4	58

ONDA, Ref. PAD 021

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

ONDA, Ref. PAD 021	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	8.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Gestão Clientes	2	2	-	-
Gestão Interna	1	2	-	-
Processo Produtivo	1	2	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Internet	1	2	-	-
E-Mail	1	2	-	-
Sistemas Operativos	1	3	-	-
Total	7	13	-	-

RED-AVEIRO, Ref. PAD 072

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	19.278€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
e-working	8	74	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Internet nas empresas	8	74	-	-
Total	16	148	-	-

SANI, Ref. PAD 047

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	50.975€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Formação específica do sistema	15	150	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Windows, Internet, busca, e-mail	10	100	-	-
Total	25	250	-	-

SemiAR, Ref. PAD 130

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	4.500€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Aplicação integrada	2	26	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Competências Básicas	2	40	-	-
Total	4	66	-	-

SIPA, Ref. PAD 026

Através deste projecto foram já realizadas 2 acções de Formação, onde participaram 2 formandos num total de 60 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

SIPA, Ref. PAD 026	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	26.348€	Orçamento	1.765 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Sistema Informático – Gestão Financeira	2	31	-	-
Workflow de compras	2	63	-	-
Oracle Database	2	2	2	2
Formação Competências Básicas em TIC	0	0		
Competências Básicas em TIC	8	80	-	-
Total	14	165	2	2

SMIA, Ref. PAD 052

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

SMIA, Ref. PAD 052	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	8.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
SQL; Visual Basic.NET	2	2	-	-
Excel com VBA; Flash	2	2	-	-
Hacking Aplicado	1	1	-	-
Total	5	5	-	-

TUP, Ref. PAD 044

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

TUP, Ref. PAD 044	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	19.750€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
E-business	1	5	-	-
Execução de Encomendas e Symix	1	8	-	-
Centralgest	1	11	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Windows, Word, Internet	5	100	-	-
Total	8	124	-	-

uebe.SI, Ref. PAD 103

Através deste projecto foi já realizada 1 acção de Formação, onde participaram 10 formandos num total de 500 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Uebe.SI, Ref. PAD 103	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	4.150€	Orçamento	4.150 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Formação intranet/extranet	2	10	-	-
Plataforma de teletrabalho	2	10	1	10
Gestão de projectos	1	5	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Auto aprendizagem e-learning	1	3	-	-
Total	6	28	1	10

VLM-online, Ref. PAD 104

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

VLM-Online, Ref. PAD 104	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	3.500€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Formação em Intranet	1	10	-	-
Formação em Extranet	1	10	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Auto aprendizagem usando e-learning	1	10	-	-
Total	3	30	-	-

web-IVE, Ref. PAD 129

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso Aveiro Digital, mas apresentou a sua desistência por não considerar reunidas todas as condições necessárias para a sua boa implementação.

ÁREA DE INTERVENÇÃO 8: INFORMAÇÃO, CULTURA E LAZER

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 8 vai qualificar directamente 3.040 pessoas, através de 40.950 horas de formação em Serviços e Aplicações e 25.125 horas de Formação em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 266.600€. Até final de 2005, tinham já sido ministradas 3 acções de formação, qualificando 26 pessoas, através de 290 horas de formação em Serviços e Aplicações e 165 horas de formação em TIC.

P 8.1. Museus e Arquivos

bibria, Ref. PAD 066

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

bibria, Ref. PAD 066	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	32.300€	Orçamento	0 €
Formação Competências Básicas em TIC	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Windows, Word e Internet	1	14	-	-
Windows, Word e Internet	1	14	-	-
Software Biblioteca Digital	3	14	-	-
Total	5	42	-	-

INFORDICO, Ref. PAD 024

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

INFORDICO, Ref. PAD 024	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	39.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Operação BackOffice	25	100	-	-
Operação Front-Offices	10	200	-	-
Operação e manutenção Técnica	2	24	-	-
Formação Competências Básicas em TIC	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Formação Competências Básicas TIC	50	1000	-	-
Total	126	2024	-	-

MEMDigital, Ref. PAD 055

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

MEMDigital, Ref. PAD 055	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	16.100€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Ferramentas de Pesquisa e Arquivo Documental	1	6	-	-
Ferramentas multimédia de Apoio Visitante	1	6	-	-
Operação e Manutenção Técnica	1	4	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação Competências Básicas TIC	10	100	-	-
Total	13	116	-	-

MUSEAVE, Ref. PAD 107

Através deste projecto foram já realizadas 2 acções de Formação, onde participaram 16 formandos num total de 150 horas de formação em Serviços e Aplicações e 165 horas de formação em TIC. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

MUSEAVE, Ref. PAD 107	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	6.000€	Orçamento	2.156 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
BackOffice	1	6	0	0
Tratamento de imagem	1	6	1	5
Formação Competências Básicas em TIC				
Recursos Humanos -MUSEA	1	12	1	11
Total	3	24	2	16

P@Z, Ref. PAD 050

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

P@Z, Ref. PAD 050	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	8.500€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Princípios de Informática	1	20	-	-
Princípios de Internet	1	20	-	-
Princípios de e-mail	1	20	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Word, Excel	1	20	-	-
Internet Explorer	1	20	-	-
Outlook	1	20	-	-
Total	6	120	-	-

P 8.2. Redes de Serviços Regionais

SIGRED, Ref. PAD 114

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

SIGRED, Ref. PAD 114	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	12.200€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Considerações Básicas Internet	3	45	-	-
Aplicações MS Office	4	45	-	-
Tratamento Digital de Informação	1	15	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação em competências Básicas	3	45	-	-
Formação em competências Básicas	4	45	-	-
Formação em competências Básicas	4	45	-	-
Total	19	240	-	-

P 8.3. Academia Artes Digitais

AAD-TA, Ref. PAD 038

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

AAD – TA, Ref. PAD 038	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	45.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
BackOffice	3	12	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Recursos Humanos – TA	24	8	-	-
Total	27	20		

P 8.4. Movimento Associativo Digital

Adira, Ref. PAD 142

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

Adira, Ref. PAD 114	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	32.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Internet	2	32	-	-
Tratamento de Imagem	2	32	-	-
Gestão Web de Serviços	2	32	-	-
Formação Competências Básicas em TIC				
Formação em competências Básicas	1	16	-	-
Formação em competências Básicas	1	16	-	-
Formação em competências Básicas	1	16	-	-
Total	9	144	-	-

IPJDIGITAL, Ref. PAD 120

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

IPJDIGITAL, Ref. PAD 120	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	7.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Administração e Gestão				
BackOffice do Portal	10	100	-	-
Total	10	100	-	-

PIAR, Ref. PAD 003

Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

piar, Ref. PAD 003	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	65.000€	Orçamento	0 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Utilização da plataforma	18	180	-	-
Utilização da plataforma	18	180	-	-
Utilização da plataforma	18	180	-	-
Formação Competências Básicas em TIC	0	0		
Competências Básicas	9	90	-	-
Competências Básicas	9	90	-	-
Competências Básicas	9	90	-	-
Total	81	810	-	-

POMADA, Ref. PAD 136

Através deste projecto foi já realizada 1 acção de Formação, onde participaram 10 formandos num total de 140 horas de formação em Serviços e Aplicações. Os compromissos para a Formação, bem como a formação já executada estão resumidos no quadro seguinte:

POMADA, Ref. PAD 136	Compromisso PTF		Executado	
	Orçamento	3.500€	Orçamento	770 €
Formação em Serviços e Aplicações	Nº Acções	Nº Formandos	Nº Acções	Nº Formandos
Gestão de Projectos - Desenvolvimento	2	2	1	10
Inserção conteúdos off/on-line	4	96	0	0
Formação Pedagógica	1	2	0	0
Total	7	100	1	10

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

GESTÃO FINANCEIRA

A Medida 2.4 é executada exclusivamente pelos 71 Projectos seleccionados no âmbito dos dois concursos Aveiro Digital 2003–2006, estando o seu orçamento completamente comprometido, sendo da responsabilidade do GAD acompanhar e verificar o processo de Apresentação de Despesas e preparar os dossiers para enviar para o POSI.

A Gestão Financeira assegurou o acompanhamento e controlo dos processos de execução financeira dos 71 Projectos seleccionados.

A Gestão Financeira foi realizada por dois técnicos, um com formação em Gestão e outro com formação em Auditoria Contabilística.

As actividades de gestão financeira associadas a esta medida podem ser sintetizadas nos seguintes pontos:

- Acompanhamento da execução do orçamento aprovado, tendo em conta os critérios e prioridades estabelecidas pela CEAD, bem como as normas financeiras aplicáveis;
- Análise e avaliação regular da execução financeira para apreciação da CEAD;
- Elaboração de relatórios de apresentação de despesas à entidade financiadora (POSI), de acordo com as normas e os regulamentos estabelecidos;
- Registo e verificação da movimentação das contas bancárias do Programa Aveiro Digital 2003–2006.
- Especificação dos requisitos da Gestão Financeira do Sistema SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital;

METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO DE DESPESAS

A CEAD definiu uma metodologia para as Apresentações de Despesas baseada num processo de *workflow*, complementada com o desenvolvimento de uma ferramenta de apoio – o SAVAD, onde está incorporada toda a legislação aplicável, de forma a simplificar a complexidade destes processos e onde todos os Projectos têm uma área própria de Gestão Financeira.

A metodologia aplicada na elaboração de apresentação de despesas à entidade financiadora (POSI) consistiu no seguinte:

- Registo no SAVAD das despesas dos Projectos pelas respectivas Entidades Beneficiárias Principais;
- Entrega ao GAD após verificação, pelas Entidades Beneficiárias Principais, das despesas registadas no SAVAD através da análise dos dados e enquadramento nas rubricas orçamentais do respectivo Projecto;
- Pré-verificação pelo GAD das despesas registadas, com análise dos dados e enquadramento no respectivo Plano Técnico e Financeiro;
- Recepção no GAD dos dossiers físicos entregues pelas Entidades Beneficiárias Principais;
- Verificação pelo GAD da conformidade dos registos das despesas no SAVAD com os documentos contabilísticos originais entregues e verificação pelos respectivos Contactos GAD de Projecto da conformidade das despesas apresentadas face à execução do Plano Técnico;
- Anulação dos documentos contabilísticos originais, com a aposição do carimbo de financiamento POSI e FSE, respectiva taxa de imputação e rubrica do técnico financeiro GAD;
- Numeração sequencial de todos os documentos que integram o dossier financeiro de cada Projecto, contendo o número do Pedido de Pagamento do Projecto e o Número da Ref. PAD;
- Verificação dos registos nos formulários POSI;
- Entrega no Gabinete Aveiro Digital de duas cópias do dossier financeiro pela respectiva Entidade Beneficiária Principal;
- Envio ao POSI dos ficheiros electrónicos das Listas de Despesas para primeira validação e dos Pedidos de Pagamento em formato papel, acompanhados de cópias de todos os documentos de despesas e respectivos justificativos;

SAVAD: GESTÃO FINANCEIRA

O SAVAD materializa e sistematiza todo o processo de Apresentação de Despesas, servindo como plataforma comunicacional entre as Entidades Beneficiárias Principais e o Gabinete Aveiro Digital e fornece todos os outputs necessários a este processo – ver Relatório de Execução Financeira e Material de 2005 da Medida 2.3.

Para fornecer os dados necessários aos Formulários da Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação, houve a necessidade de adaptar o formato de introdução de despesas para a Rubrica Orçamental – Aquisição de Formação a Entidades Certificadas, associando cada despesa a um Curso e Acção de Formação já inseridos.

Aveiro Digital 2003 - 2006 www.aveiro-digital.pt



SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

ContactUA



4ª APRESENTAÇÃO DE DESPESAS - ContactUA Voltar

Selecção da Entidade: UA
 Rubrica: Aquisição de Formação a entidades acredi

Regime de IVA:
Pro Rata

Nome do Fornecedor: n.def. NIF do Fornecedor: n.def. Informação preenchida automaticamente

Documento de Despesa

Numero do Documento	Tipo de Documento	Data	Nº Lançamento na Contabilidade	Cursos Associados
0001	Factura	25/01/2005	00660	Moc2012&Moc2014- Planning, Implemen
Valor s/IVA	Valor IVA	Valor da Factura	Imputação (%)	Código POC
1000	190	1190	100	62238

Documento de Quitação

Numero do Documento	Tipo de Documento	Data do Documento
	-- --	25/01/2005
Valor s/IVA	Valor IVA	Valor do Recibo
1000	190	1190

Documentos de Despesa já registados

Tipo	Numero	Data	Valor s/IVA	IVA	Valor Factura	Total Quitação	Nº Docs Quitação	Imputação	Cod POC
F	0001	25-1-2005	1000	190	1190	0	0	100	62238

Desenvolvido por NETUAL

Introdução e Correção de Despesas da Rubrica Aquisição de Formação a Entidades Certificadas

Nesta área de trabalho de SAVAD, são disponibilizados os formulários FSE, normalizados com o formato POSI, onde consta toda a informação sobre as despesas, acções de formação e formandos, necessários para a Apresentação de Despesas da Medida 2.4.

Programa Aveiro Digital www.aveiro-digital.pt



SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital



- GAD
- PAD 2003-2006
- *Gestão Técnica*
- *Gestão Financeira*
- SAE
- AI 1
- AI 2
- AI 3
- AI 4
- AI 5
- AI 6
- AI 7
- AI 8
- Sair

Desenvolvido por NETUAL

PROGRAMA AVEIRO DIGITAL

Lista de Despesas

Pedido FEDER: [---] Área: [---] Projecto: [---] Ver Ver

Medida 2.4: [---] Anexo 1 Anexo 2

Medida 1.1: [---] Projecto: CERTICAD Anexo 1 Anexo 2

Pedidos de Pagamento ao POSI - FEDER, Medida 2.3 (activo desde..) **Quadro Resumo**

<u>1º pedido</u>	<u>2º pedido</u>	<u>3º pedido</u>	<u>4º pedido</u>	<u>5º pedido</u>	<u>6º pedido</u>	<u>7º pedi</u>
1-1-2003	1-1-2004	1-4-2004	15-9-2004	15-11-2004	15-3-2005	15-6-2

Pedidos de Pagamento ao POSI - FSE, Medida 2.4 (activo desde..) **Quadro Resumo**

<u>1º pedido</u>	<u>2º pedido</u>	<u>3º pedido</u>	<u>4º pedido</u>	<u>5º pedido</u>	<u>6º pedido</u>
15-11-2004	15-3-2005	15-6-2005	15-9-2005	15-11-2005	
<u>1º GI</u>	<u>2º GI</u>	<u>3º GI</u>			
15-11-2004	15-3-2005				

Pedidos de Pagamento ao POSI - FSE, Medida 1.1 (activo desde..)

<u>1º pedido</u>	<u>2º pedido</u>	<u>3º pedido</u>	<u>4º pedido</u>	<u>5º pedido</u>
15-3-2005	27-7-2005	22-10-2005	22-12-2005	
<u>1º GI</u>	<u>2º GI</u>	<u>3º GI</u>		
2-1-2006	15-11-2006			

Quadro de Execução Orçamental Anual **Apresentações Actuais**

Área: [Todas] Estado das Despesas: [Verificadas] Ver

Rúbrica de Investimento	Orçamento	Orçamento Executado		
		2003	2004	2005
Despesas de Capital / Imobilizadas Corpóreas				
Equipamento	6388015,40	60015,19	2630140,06	1689099,45
Outras despesas de investimento	416731,16	719,96	93717,78	183622,64
Sub-Total	6804746,56	60735,15	2723857,84	1872722,09
Despesas Correntes / Imobilizadas Incorpóreas				
Recursos Humanos	5050740,68	183346,42	1098741,73	1727963,53
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	4878830,43	31113,03	1309783,48	1924473,66
Aquisição de Serviços e manutenção	4417397,19	151542,21	770125,51	1260027,34
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	1805586,57		5224,65	234263,73
Outras despesas correntes	452591,13	6244,07	26849,99	67638,44
Sub-Total	16605146	372245,74	3210725,36	5214366,70
Investimento Total	23409892,56	432980,89	5934583,20	7087088,79

Formulários de Pedidos de Pagamentos

Copyright © 2006, Comissão Executiva Aveiro Digital

175 / 181

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2005

No dia 22 de Dezembro, data da 5ª Apresentação de Despesas da Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação estavam executados 239.488,38€, o que corresponde a 13,25% do orçamento total para a Medida 2.4 – FSE.

Este valor corresponde a dois anos de execução dos 40 Projectos aprovados no 1º Concurso Aveiro Digital e a um ano de execução dos 31 Projectos aprovados no 2º Concurso Aveiro Digital.

Com a etapa final do desenvolvimento das aplicações e um modelo de execução complementar e integrado nos investimentos em Serviços e Aplicações desenvolvidas pelos 71 Projectos Aveiro Digital, a formação, que está embebida nos projectos, vai sofrer uma aceleração na sua execução, prevendo-se que durante o ano de 2006 a execução financeira atinja os 1.568.098,37 €.

O quadro seguinte mostra a execução financeira já realizada:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	1.807.586,75€	- €	5.224,65€	234.263,73€	239.488,38€	13,25 %

EXECUÇÃO FINANCEIRA POR ÁREA DE INTERVENÇÃO

Área de Intervenção 2 – Autarquias e Serviços Concelhios

A execução financeira da Formação desta área, onde estão inseridos os Projectos que envolvem as 11 Câmaras Municipais da Região da Ria, é de 19,04%, destacando-se a formação nas aplicações desenvolvidas pelos projectos, em Gestão e Manutenção de Redes e em Gestão de Base de Dados. O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 2:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	516.500,00€	- €	- €	98.335,23€	98.335,23€	19,04 %

Área de Intervenção 3 – Escolas e Comunidades Educativas

A execução financeira da Formação desta área, onde estão inseridos as escolas e as comunidades educativas é de 16,70%, destacando-se a formação nas aplicações desenvolvidas pelos projectos, em Gestão e Manutenção de Redes e em Competências Básicas. O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 3:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	209.000,00€	- €	- €	34.900,00€	34.900,00€	16,70 %

Área de Intervenção 4 – Universidade e Comunidade Universitária

A execução financeira da Formação desta área, onde está inserida a Universidade de Aveiro e a Comunidade Universitária, é de 16,70%, destacando-se a formação nas aplicações desenvolvidas pelos projectos. O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 4:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	198.308,00€	- €	3423,45€	6925,69€	10.349,14€	5,22 %

Área de Intervenção 5 – Serviços de Saúde

A execução financeira da Formação desta área, onde estão inseridos todos os hospitais e Centros de Saúde da região da AMRia, é de 15,53%, destacando-se a Formação em Best Hospital Practices e a formação em Competências Básicas. O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 5:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	162.500,00€	- €	1.801,20€	23.441,72€	25.242,92€	15,53 %

Área de Intervenção 6 – Solidariedade Social

A execução financeira da Formação desta área, onde estão inseridas Instituições ligadas à Solidariedade Social, é de 22,42%, destacando-se a formação nas aplicações desenvolvidas pelos projectos e a formação em Competências Básicas. O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 6:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	122.350,00€	- €	- €	27.432,37€	27.432,37€	22,42 %

Área de Intervenção 7 – Tecido Produtivo

A execução financeira da Formação desta área, onde estão inseridas várias empresas da região da AMRia, é de 12,13%, destacando-se a formação nas aplicações desenvolvidas pelos projectos e a formação em Competências Básicas. O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 7:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	332.338,00€	- €	- €	40.302,52€	40.302,52€	12,13 %

Área de Intervenção 8 – Informação, Cultura e Lazer

A execução financeira da Formação desta área, onde estão inseridas várias entidades de natureza cultural, recreativa e desportiva, é de 1,10%, destacando-se a formação nas aplicações desenvolvidas pelos projectos. O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 8:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado				% execução
		2003	2004	2005	Total	
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	266.600,00€	- €	- €	2.926,20€	2.926,20€	1,10 %

FLUXO FINANCEIRO POSI – PROGRAMA AVEIRO DIGITAL

Durante o ano de 2005, realizou-se a segunda, terceira, quarta e quinta Apresentações de Despesas Aveiro Digital 2003–2006 ao POSI, no valor total de 236.064,93€, o que acrescido dos 3.423,45€ referentes às apresentações de despesas Aveiro Digital, realizadas em 2004, dá o valor total de despesas apresentadas até ao momento de 239.488,38€:

- 2ª Apresentação de Despesas – Realizada em 18 de Abril, num montante de despesas apresentadas de 18.750,00 €;
- 3ª Apresentação de Despesas – Realizada em 1 de Agosto, num montante de despesas apresentadas de 87.803,59 €;
- 4ª Apresentação de Despesas – Realizada em 24 de Outubro, num montante de despesas apresentadas de 37.835,66 €;
- 5ª Apresentação de Despesas – Realizada em 22 de Dezembro, num montante de despesas apresentadas de 91.675,68 €.

O Quadro seguinte mostra o fluxo de caixa semestral entre o POSI e o Programa Aveiro Digital:

Período	Despesa Apresentada Acumulada	Comparticipação Financeira	Valor Recebido Acumulado	Saldo do Semestre
1º Semestre 2004	- €	- €	- €	- €
2º Semestre 2004	3423,45 €	2567,59 €	- €	2567,59 €
1º Semestre 2005	22.173,45 €	16.630,09 €	26.048,00€	9.417,91 €
2º Semestre 2005	239.488,38 €	179.616,29 €	102.476,47 €	77.139,82 €

PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2006

Tendo em conta o desenvolvimento dos 71 Projectos Aveiro Digital 2003–2006, prevê-se a seguinte calendarização da execução do Orçamento da Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação do Programa Aveiro Digital 2003–2006:

Rubricas Orçamental	2003	2004	2005	2006	Total
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	- €	5.224,65 €	234.263,73 €	1.568.098,37 €	1.807.586,75 €

ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÕES

O processo de Formação em Serviços e Aplicações e Formação em Competências Básicas está embebido no modelo matricial de execução do Programa Aveiro Digital.

Dada a natureza dos Projectos enquadrados no Programa Aveiro Digital, a Formação é uma necessidade associada ao treino dos agentes que vão operar os sistemas e serviços desenvolvidos em cada Projecto. A Formação faz assim parte do sistema de qualificação das organizações que se modernizam com os investimentos comprometidos nos Projectos Aveiro Digital.

Os compromissos de Formação assumidos pelos 71 Projectos, que envolvem directamente 16.626 formandos, vão qualificar o segmento de população associado. Abrangem, assim, na AI2: 4.637 técnicos e funcionários da administração pública local e regional, na AI3: 4.529 professores, funcionários, alunos e encarregados de educação, na AI4: 320 docentes, alunos e funcionários da Universidade de Aveiro, na AI5: 780 profissionais de saúde, na AI6: 487 técnicos e utentes das Instituições de Solidariedade Social, na AI7: 2.833 gestores, técnicos e operários das empresas, na AI8: 3.040 agentes culturais e das associações desportivas e recreativas.

É esta ligação directa aos Projectos que justifica uma execução temporalmente desfasada da sua data de início.

No último trimestre de 2005, 24 Projectos Aveiro Digital já tinham iniciado a execução da Formação, estando previsto que os restantes 47 Projectos atinjam essa fase no primeiro semestre de 2006.

Até final de 2005, tinham já sido ministradas 144 acções de formação, qualificando 2.089 pessoas, através de 20.222 horas de formação em Serviços e Aplicações e 16.845 horas de formação em TIC.

Considerando que a Formação está dependente da operação dos Serviços e Aplicações desenvolvidas pelos Projectos Aveiro Digital prevista na sua grande maioria durante o primeiro semestre de 2006, a CEAD considera que estão consolidadas todas as condições para atingir a execução plena desta Medida dentro do prazo contratado.

No entanto, dada a concentração desta execução no ano 2006, a CEAD considera que as Entidades Beneficiárias devem ser alertadas para garantirem os seus melhores esforços no sentido de cumprirem os compromissos de Formação inscritos nos Planos Técnicos e Financeiros dos respectivos Projectos.

LISTA DE ACRÓNIMOS

AAD	Associação Aveiro Digital
AD	Aveiro Digital
AI	Área de Intervenção
AMRia	Associação de Municípios da Ria
CAP	Comissão de Acompanhamento e Peritos
CBTIC	Competências Básicas em Tecnologias da Informação e da Comunicação
CCBTIC	Certificação em Competências Básicas em Tecnologias da Informação e da Comunicação
CD	<i>Compact Disc</i>
CEAD	Comissão Executiva Aveiro Digital
CG POSI	Comissão Gestão do POSI
CIES	Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
CIUMED	Rede para a Promoção das Cidades Médias do Sudoeste Europeu
CM	Câmara Municipal
DVD	<i>Digital Video Disk</i>
EB	Entidade Beneficiária
EBP	Entidade Beneficiária Principal
EIAD	Espaço Internet Aveiro Digital
EU	União Europeia
FEDER	Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
FEP	Faculdade de Engenharia do Porto
FSE	Fundo Social Europeu
GAD	Gabinete Aveiro Digital
GEIAD	Gestão dos Espaços Internet Aveiro Digital
HM	Homem Mês
IRS	Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
ISCTE	Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
IVA	Imposto sobre o Valor Acrescentado
JF	Junta de Freguesia
MCTES	Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MSN	Microsoft Messenger
OCS	Órgãos de Comunicação Social
PAD	Programa Aveiro Digital
POSI	Programa Operacional Sociedade da Informação
PTF	Plano Técnico e Financeiro
SAE-PAD	Sistema de Avaliação Externa do Programa Aveiro Digital
SAVAD	Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital
SI	Sociedade da Informação
TIC	Tecnologias da Informação e da Comunicação
UA	Universidade de Aveiro
UMIC	Unidade Missão Inovação e Conhecimento
ZINGs	Zonas Industriais de Nova Geração
