Programa Aveiro Digital 2003-2006

Relatório de Actividades

Ano 2004

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÍNDICE

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES - 2004

Sumário Executivo 2

Capítulo 1: Relatório de Progresso Material e Financeiro Medida 1.1 - 2004 3

Capítulo 2: Relatório de Progresso Material e Financeiro Medida 2.3 – 2004 19

Capítulo 3: Relatório de Progresso Material e Financeiro Medida 2.4 – 2004 115

Análise Crítica e Conclusões 144

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SUMÁRIO EXECUTIVO

A gestão global do Programa Aveiro Digital, assumida pela Associação Aveiro Digital e pela Associação de Municípios da RIA é baseada num modelo de execução que contempla:

- Os projectos enquadrados na Área de Intervenção 1-"Comunidade Digital", que são da responsabilidade directa da Comissão Executiva, pois constituem investimentos estruturantes de alinhamento e alavanca de todo o Programa.

- Os projectos enquadrados nas restantes Áreas de Intervenção, da responsabilidade das Entidades Beneficiárias que, seleccionadas através de Concurso Público, se responsabilizam pela sua execução perante a Comissão Executiva do Programa.

Dada a natureza das Medidas de financiamento do Programa Aveiro Digital e as responsabilidades assumidas pela Comissão Executiva Aveiro Digital, este Relatório contempla a descrição detalhada das actividades associadas a cada Medida de financiamento, com especial destaque para os projectos da Área de Intervenção "Comunidade Digital", com financiamento associado às Medidas 2.3 e 1.1.

O Relatório de Actividades – 2004, contempla o Sumário Executivo e as Conclusões e está organizado em 3 capítulos:

O 1º capítulo descreve a execução da Medida 1.1: Competências Básicas, conforme Relatório de Execução Material e Financeira enviado ao POSI.

O 2º capítulo descreve a execução da Medida 2.3: Cidades e Regiões Digitais, com especial destaque para os projectos enquadrados na Área de Intervenção 1: Comunidade Digital, da responsabilidade directa da Comissão Executiva, conforme Relatório de Execução Material e Financeira enviado ao POSI.

O 3º capítulo descreve a execução da Medida 2.4: Acções integradas de formação, conforme Relatório de Execução Material e Financeira enviado ao POSI.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Capítulo 1

Programa Aveiro Digital 2003-2006
POSI 95/1.1/C/CEN
Medida 1.1 – Competências Básicas
Relatório de Progresso Material e Financeiro – 2004

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Relatório de Progresso Material e Financeiro - 2004 da Medida 1.1 – Competências Básicas é da responsabilidade da Comissão Executiva Aveiro Digital e tem como objectivo descrever e documentar as actividades desenvolvidas entre 1 Janeiro e 31 Dezembro de 2004, no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003-2006.

A execução desta Medida que tem como objectivo último certificar, em Competências Básicas nas TIC, 45.000 residentes na Região da AMRia, é um indicador directamente associado a um dos principais objectivos do Programa Aveiro Digital 2003-2006: contribuir para a qualificação das pessoas e organizações da Região.

Assim a Comissão Executiva Aveiro Digital considera que a qualidade e eficiência da sua execução vão contribuir directamente para o êxito do Programa Aveiro Digital.

Este documento contempla o enquadramento da Certificação em Competências Básicas em TIC no Programa Aveiro Digital 2003-2006 e a descrição do seu Modelo de Execução. Em seguida descreve-se o Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital - SAVAD, com particular detalhe na área de Gestão da Certificação.

Finalmente é analisada a Execução Material e Financeira da Medida 1.1 – Competências Básicas e apresentam-se as conclusões e as perspectivas de execução desta medida.

Faz parte integrante deste Relatório um CD, contendo os seguintes Anexos:

Anexo 01 Modelo de Execução da Medida 1.1
Anexo 02 Lista de Entidades Credenciadas para a Certificação
Anexo 03 Convite às Entidades Beneficiárias
Anexo 04 Recomendações AD para CCBTIC

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ENQUADRAMENTO DA CCB NO PROGRAMA AVEIRO DIGITAL

O Programa Aveiro Digital 2003-2006 assume-se como um motor do desenvolvimento social, económico e cultural, perspectivando a modernização dos serviços e a qualificação das pessoas na região da Associação de Municípios da Ria.

A gestão deste Programa é da responsabilidade conjunta da AAD – Associação Aveiro Digital e da AMRIA – Associação de Municípios da Ria e a sua execução é, fundamentalmente, baseada na contratualização dos projectos seleccionados através de Concursos Públicos e apresentados pelas entidades adequadas e beneficiárias em cada Área de Intervenção.

O modelo de execução reflecte métodos e formatos já consolidados, assumindo uma natureza claramente matricial:

- A direcção operacional dos projectos enquadrados na Área "Comunidade Digital" é da responsabilidade directa da Comissão Executiva do Programa, pois estes projectos constituem os investimentos estruturantes de alinhamento e alavanca de todo o Programa.
- A direcção operacional dos projectos enquadrados nas restantes Áreas de Intervenção é da responsabilidade dos agentes respectivos, que através de Concurso Público, se comprometem pela sua execução perante a Comissão Executiva do Programa Aveiro Digital.

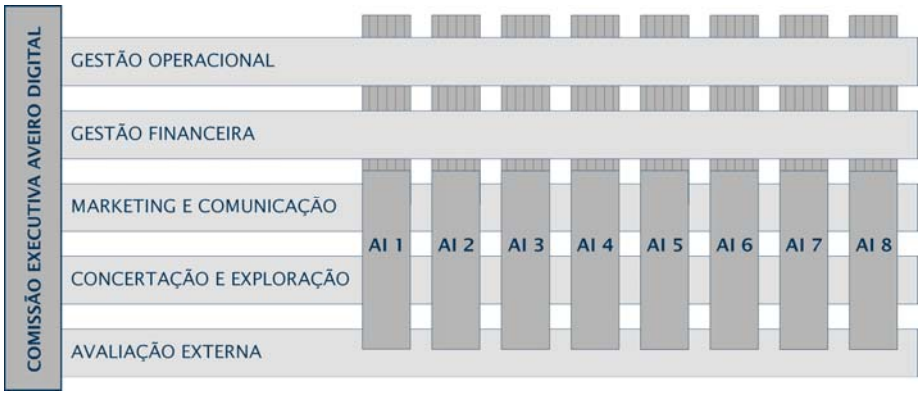

Através de 2 concursos públicos foram seleccionados 72 projectos, abrangendo todas as Áreas de Intervenção do Programa Aveiro Digital 2003-2006.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

O Programa Aveiro Digital 2003-2006 é financiado pelo POSI através de 3 Medidas distintas:

- Medida 1.1 – Competências Básicas
- Medida 2.3 – Projectos Integrados: das Cidades Digitais ao Portugal Digital
- Medida 2.4 – Acções integradas de formação

A visão integrada da execução das 3 Medidas obrigou a um esforço de harmonização de procedimentos, com o objectivo de minimizar a complexidade da execução e gestão de três medidas distintas no âmbito de cada Projecto Aveiro Digital.

A harmonização da execução das 3 Medidas foi conseguida através da concepção de um modelo para o Plano Técnico e Financeiro como referência base das Candidaturas e que, após a selecção e aprovação dos Projectos, se assumiu como compromisso de execução de cada Projecto onde constam todos os resultados técnicos e respectivos orçamentos que as Entidades Beneficiárias contratualizaram com a CEAD.

A estrutura do Plano Técnico e Financeiro contempla quatro tarefas mandatórias: Gestão, Concertação, Avaliação e Formação. A Tarefa D - Formação tem um formato especificamente orientado para os requisitos do FSE na identificação da Formação e mais especificamente, quanto à natureza da Medida 1.1, do número de Certificações em Competências Básicas a executar.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

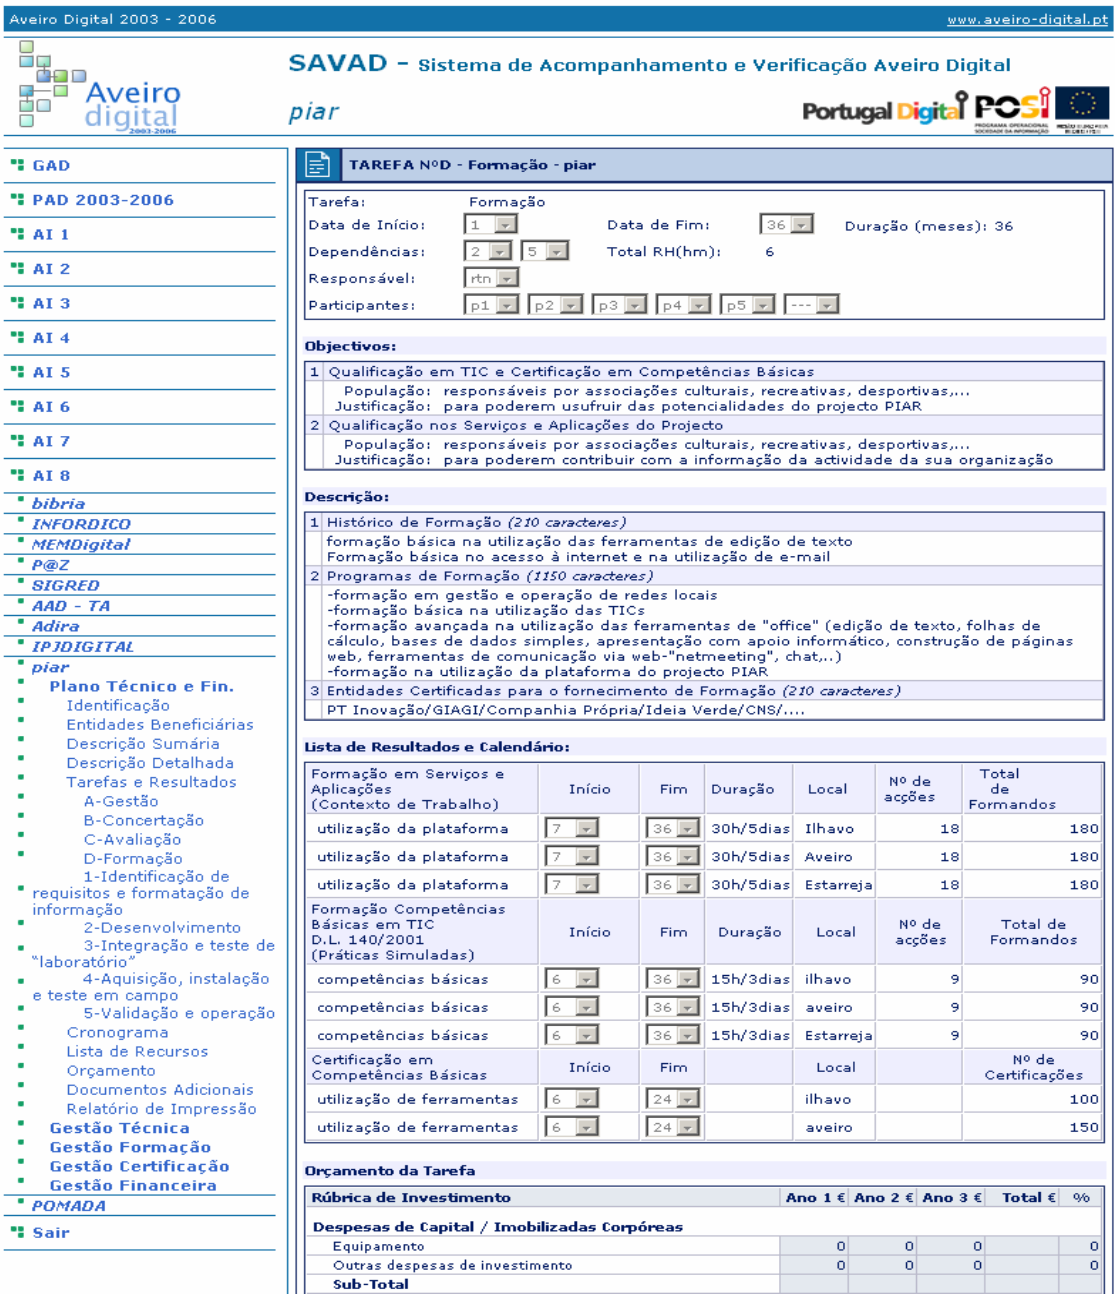

Plano Técnico e Financeiro: Tarefa D – Formação

O objectivo global comprometido pelo Programa Aveiro Digital é de 45.000 certificações em Competências Básicas. Os 72 Projectos Aveiro Digital assumiram o compromisso de certificar 25.272 pessoas, cabendo à CEAD a responsabilidade de executar as restantes certificações através das Iniciativas Horizontais planeadas para toda a Regiãoda AMRia e baseadas nos 11 Espaços Internet Municipais.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

MODELO DE EXECUÇÃO DA CERTIFICAÇÃO EM COMPETÊNCIAS BÁSICAS

A CEAD, na sua 17ª reunião, tendo em conta a legislação que regula o Processo de Certificação em Competências Básicas nas TIC, aprovou o Modelo de Execução da Medida 1.1 e seleccionou como Entidades Credenciadas para a Certificação das Competências Básicas nas TIC, no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003-2006, um conjunto de Entidades Beneficiárias que reúnem as condições necessárias para prestarem serviços de certificação, de acordo com a legislação aplicável (Anexo 01 e 02).

Foi dado conhecimento à UMIC e ao POSI do Modelo adoptado e da Lista de Entidades Credenciadas, dado o papel destas Entidades na gestão do processo de Certificação a nível nacional.

As Entidades Beneficiárias Aveiro Digital, credenciadas para a Certificação em Competências Básicas, foram convidadas a prestar serviços de certificação no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003-2006, com base num conjunto de condições e de recomendações para garantir a harmonização dos procedimentos de Certificação no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003-2006 (Anexo 03 e 04).

Cada EBP deverá seleccionar da lista de Entidades Credenciadas, a(s) Entidade(s) que considerar mais adequada(s) para a prestação dos Serviços necessários à execução dos seus compromissos de Certificação em Competências Básicas nas TIC.

As EBPs quando requisitam Serviços de Certificação obrigam-se à inscrição dos seus Formandos através do fornecimento às Entidades Certificadoras de um Ficheiro Word contendo a sua completa identificação de acordo com as normas do FSE.

As Entidades Certificadoras quando terminam o processo de Certificação obrigam-se a entregar às Entidades Beneficiárias Principais o respectivo ficheiro Excel de Certificados emitidos, extraído do Sistema Nacional de Certificação em http://www.sidiploma.umic.pcm.gov.pt, para apresentação no SAVAD (Gestão Certificação).

Os serviços de Certificação em Competências Básicas nas TIC são gratuitos para os Projectos Aveiro Digital não podendo ser facturados às EBPs.

As Entidades Credenciadas devem facturar com base nos preços de referência POSI, os serviços de Certificação directamente à Associação Aveiro Digital, como Serviços de Monitoria de CCBTIC, indicando o número de Certificados executados e o Projecto Aveiro Digital associado.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SAVAD: GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO

Integrada no Sistema SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital, foi criada uma área de Gestão da Certificação que implementa os procedimentos de gestão e controlo do FSE e contempla as seguintes funcionalidades:

- Gestão da Certificação: Inserir Certificados

Nesta área a Entidade Beneficiária Principal selecciona a Entidade Certificadora da lista de Entidades definidas pela CEAD, que lhe prestou os serviços de Certificação e insere o ficheiro extraído do Sistema de Informação Diploma de Competências Básicas em Tecnologias de Informação e Comunicação, que lhe foi fornecido por essa Entidade.

Gestão da Certificação: Inserir Certificados

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

- Gestão da Certificação: Relatório da Certificação

Nesta área são disponibilizados todos os ficheiros de certificação já entregues pelo projecto, com a possibilidade de impressão do Relatório da Certificação em formato de tabela com o acumulado à data de todos os Certificados atribuídos.

Gestão da Certificação: Relatório de Certificação

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MATERIAL

O objectivo da CEAD é certificar 45.000 pessoas da Região da AMRia. O compromisso de Certificação em Competências Básicas assumido pelos 72 projectos em curso é de 25.272 Certificações.

A CEAD assumiu a responsabilidade de executar as restantes 19.728 certificações através das Iniciativas Horizontais planeadas para toda a Região e baseadas nos 11 Espaços Internet Municipais, estando este plano associado à conjugação dos recursos previstos nos projectos P1.1 - Espaços Internet Aveiro Digital e P1.6 - Serviços de Certificação em Competências Básicas em TIC, incluídos na Área de Intervenção 1.

Em seguida, evidenciam-se os compromissos de Certificações por Projecto nas restantes Áreas de Intervenção.

ÁREA DE INTERVENÇÃO 2: AUTARQUIAS E SERVIÇOS CONCELHIOS

Os 10 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 3.784 Certificações.

Projecto		Compromisso
SICAVIM	Ref. PAD 017	250
SIGRia	Ref. PAD 001	100
Sal-ON LINE	Ref. PAD 016	1.000
AEI	Ref. PAD 020	870
VAGOSINFORMA	Ref. PAD 018	200
SEVERINFORMA	Ref. PAD 023	120
Ambi-Ria	Ref. PAD 140	60
Mobi-Ria	Ref. PAD 138	24
Secur-Ria	Ref. PAD 101	60
Ria-on-line	Ref. PAD 141	1.100

ÁREA DE INTERVENÇÃO 3: ESCOLAS E COMUNIDADES EDUCATIVAS

Os 5 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 6.240 Certificações.

Projecto		Compromisso
e-ria	Ref. PAD 060	1.600
Pormat	Ref. PAD 067	0
ria.edu	Ref. PAD 006	3.250
e-cmei	Ref. PAD 022	250
Professor	Ref. PAD 145	1.140

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 4: UNIVERSIDADE E COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

Os 6 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 10.000 Certificações.

Projecto		Compromisso
e-abs	Ref. PAD 008	470
situa	Ref. PAD 009	5.174
contactua	Ref. PAD 010	1.009
sinbad	Ref. PAD 012	1.514
Nartural	Ref. PAD 108	1.000
radical	Ref. PAD 014	833

ÁREA DE INTERVENÇÃO 5: SERVIÇOS DE SAÚDE

Os 2 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 385 Certificações.

Projecto		Compromisso
RDSR	Ref. PAD 039	85
RTS	Ref. PAD 071	300

ÁREA DE INTERVENÇÃO 6: SOLIDARIEDADE SOCIAL

Os 6 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 568 Certificações.

Projecto		Compromisso
saiss	Ref. PAD 015	200
Estar	Ref. PAD 128	68
SAD-SOS	Ref. PAD 102	100
ISSI	Ref. PAD 133	75
Incluinet	Ref. PAD 132	50
AMRia Social	Ref. PAD 113	75

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 7: TECIDO PRODUTIVO

Os 32 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 1.855 Certificações.

Projecto		Compromisso
Geo-MKT	Ref. PAD 029	100
TIC & TU	Ref. PAD 112	20
Geoinvest	Ref. PAD 027	14
red-aveiro	Ref. PAD 072	0
Tup	Ref. PAD 044	100
Hmc	Ref. PAD 042	13
Smia	Ref. PAD 052	150
fig-net	Ref. PAD 031	30
Digivacas	Ref. PAD 064	315
Marc	Ref. PAD 074	100
e-ntl	Ref. PAD 069	45
Sani	Ref. PAD 047	100
Estag	Ref. PAD 033	30
Inovortal	Ref. PAD 032	250
Onda	Ref. PAD 021	6
abs XXI	Ref. PAD 036	60
Sipa	Ref. PAD 026	80
Caderno Digital	Ref. PAD 147	7
ABDigital	Ref. PAD 106	45
SEMIAR	Ref. PAD 130	35
BRAXEN	Ref. PAD 115	45
uebe.SI	Ref. PAD 103	20
Web-IVE	Ref. PAD 129	12
Com.Web	Ref. PAD 137	18
GALILEU-DIAG	Ref. PAD 148	20
JFD	Ref. PAD 117	45
DigiPot	Ref. PAD 119	45
Imagem XXI	Ref. PAD 118	30
ATLETICA	Ref. PAD 139	60
Extraplas	Ref. PAD 110	30
VLM On-line	Ref. PAD 104	10
e-SI	Ref. PAD 123	20

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 8: INFORMAÇÃO, CULTURA E LAZER

Os 11 projectos desta Área de Intervenção estão comprometidos com 2.440 Certificações.

Projecto		Compromisso
Infordico	Ref. PAD 024	1.000
MEMDigital	Ref. PAD 055	200
P@Z	Ref. PAD 050	20
bibria	Ref. PAD 066	50
AAD-TA	Ref. PAD 038	20
piar	Ref. PAD 003	250
MUSEAVE	Ref. PAD 107	100
SIGRed	Ref. PAD 114	300
IPJDIGITAL	Ref. PAD 120	100
Adira	Ref. PAD 142	200
POMADA	Ref. PAD 136	200

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

A execução financeira da Medida 1.1 é da responsabilidade exclusiva da Comissão Executiva Aveiro Digital. Assim as Entidades Credenciadas vão facturar directamente à Associação Aveiro Digital, os Serviços de Monitoria de CCBTIC com base nos preços de referência POSI, indicando o número de Certificados executados e o Projecto Aveiro Digital associado.

A Gestão Financeira é realizada por dois técnicos, um com formação em Gestão e outro com formação em Auditoria Contabilística.

As actividades de gestão financeira planeadas para esta medida contemplam os seguintes pontos:

- Análise e avaliação regular da execução financeira;
- Elaboração de relatórios de apresentação de despesas à entidade financiadora (POSI), de acordo com as normas e os regulamentos estabelecidos;
- Registo e verificação da movimentação das contas bancárias do Programa Aveiro Digital 2003-2006;
- Especificação dos requisitos da Gestão Financeira do Sistema SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital.

METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO DE DESPESAS

A CEAD definiu uma metodologia para as Apresentações de Despesas baseada num processo de workflow, complementada com o desenvolvimento de uma ferramenta de apoio – o SAVAD, onde está incorporada toda a legislação aplicável, de forma a simplificar a complexidade destes processos e onde todos os projectos têm uma área própria de Gestão Financeira.

A metodologia consolidada para o processo de apresentação de despesas à entidade financiadora da Medida 1.1 é a seguinte:

- Identificação, selecção e recolha de todos os documentos de despesa;
- Introdução dos dados no SAVAD pelo Gabinete Aveiro Digital;
- Pré-verificação das despesas pelo Gabinete Aveiro Digital;
- Elaboração do dossier financeiro com as despesas e documentos justificativos associados;

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

- Análise e verificação dos dossiers financeiros;
- Anulação dos documentos contabilísticos originais, com a aposição do carimbo de financiamento POSI e FSE, respectiva taxa de imputação e rubrica do técnico GAD;
- Numeração sequencial de todos os documentos que integram o dossier financeiro, contendo o número do Pedido de Pagamento e o número da Refª PAD;
- Verificação dos registos nos formulários POSI;
- Extracção do SAVAD de todos os ficheiros e formulários POSI associados à Medida 1.1;
- Envio dos formulários em formato papel, acompanhados de cópias de todos os documentos de despesas e respectivos justificativos.

Até ao momento, apesar das 2136 certificações atribuídas através do Programa Aveiro Digital 2003-2006 durante o ano de 2004, ainda não se realizou qualquer apresentação de despesas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2004

Tendo o Programa Aveiro Digital atingido a sua dimensão plena com 78 projectos já em execução e estando consolidado o modelo de execução técnica e financeira da Medida 1.1 - Competências Básicas, a certificação massiva das pessoas nos 11 Municípios da AMRia vai arrancar em pleno durante o primeiro trimestre de 2005, com o consequente reflexo na execução financeira.

Durante o ano de 2004 não foi realizada qualquer apresentação de despesas referente à Medida 1.1 - Competências Básicas, mas as 2.136 Certificações já realizadas correspondem a uma execução financeira de 10.680€, cujos documentos contabilísticos terão a data de 2005.

FLUXO FINANCEIRO POSI - PROGRAMA AVEIRO DIGITAL 2003-2006

Durante o ano de 2004, o POSI transferiu, em duas tranches, 11.250,01 €, referente ao adiantamento previsto para o Projecto 95/1.1/C/CEN:

- Dia 22 de Setembro: Transferência de 5.623,88 €;
- Dia 03 de Novembro: Transferência de 5.626,13 €.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2005 E 2006

Tendo em conta o desenvolvimento e consolidação do modelo de execução da Medida 1.1 - Competências Básicas, prevê-se a seguinte calendarização de execução do respectivo Orçamento:

Rubricas Orçamental	2003	2004	2005	2006	Total
Monitoria	- €	- €	120.000 €	80.000 €	200.000 €

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÕES

O processo de Certificação em Competências Básicas em TIC está embebido no modelo matricial de execução do Programa Aveiro Digital.

À Área de Intervenção 1- Comunidade Digital conduzida pela CEAD, está cometida a responsabilidade de 19.728 Certificações, que serão executadas através dos instrumentos de massificação dos acessos aos serviços Internet: os Espaços Internet Aveiro Digital.

Prevê-se o pleno desenvolvimento desta actividade através das iniciativas de mobilização horizontal de segmentos específicos da população, conforme planeado no âmbito do Projecto P1.1 – Ver Relatório de Execução Material e Financeira – 2004 da Medida 2.3.

Nas restantes 7 Áreas de Intervenção, onde estão comprometidas 25.272 Certificações, cada projecto tem responsabilidades de certificar o segmento da população que lhe está naturalmente associado. Abrangem-se assim na AI2: 3.784 técnicos e funcionários da administração pública local e regional, na AI3: 6.240 professores, funcionários, alunos e encarregados de educação, na AI4: 10.000 docentes, alunos e funcionários da Universidade de Aveiro, na AI5: 385 profissionais de saúde, na AI6: 568 técnicos e utentes das Instituições de Solidariedade Social, na AI7: 1.855 gestores, técnicos e operários das empresas, na AI8: 2.440 agentes culturais e das associações desportivas e recreativas.

É esta ligação directa aos projectos que justifica uma execução temporalmente desfasada da sua data de início.

No último trimestre de 2004 o Programa Aveiro Digital atingiu a sua dimensão plena com 72 projectos verticais em execução, dos quais 40 atingiram já a fase de execução da Formação e consequentes Certificações estando previsto que a maioria dos restantes 32 projectos atinjam essa fase no segundo semestre de 2005.

Com um modelo operacional ágil e simplificado para esta Medida, a CEAD considera estarem consolidadas todas as condições para atingir a sua execução plena dentro do prazo contratado.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Capítulo 2

Programa Aveiro Digital 2003-2006
POSI 401/2.3/C/CEN
Medida 2.3 – Cidades e Regiões Digitais
Relatório de Progresso Material e Financeiro – 2004

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SUMÁRIO EXECUTIVO

Este Relatório de Progresso Material e Financeiro do ano 2004 é da responsabilidade da Comissão Executiva Aveiro Digital e tem como objectivo descrever detalhadamente a Execução Material e Financeira do Programa Aveiro Digital 2003-2006, na componente financiada pela Medida 2.3: Cidades e Regiões Digitais do Programa Operacional da Sociedade da Informação.

A conjugação das Medidas 1.1: Competências Básicas e da Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação sustentam a execução da Tarefa de Formação, mandatória e integrada nos Planos Técnicos e Financeiros dos 78 Projectos Aveiro Digital actualmente em curso.

Assim, este Relatório que se reporta ao objecto central do Programa Aveiro Digital 2003-2006, só reflecte a dimensão integral do Programa quando complementado pelos Relatórios de Progresso Material e Financeiro – 2004 da Medida 1.1 – Competências Básicas e da Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação.

Este documento está subdividido em duas Secções contemplando as grandes áreas da Execução Material e da Execução Financeira.

Na Secção da Execução Material deste Relatório contempla-se:

a) A descrição detalhada da execução da Área de Intervenção1: Comunidade Digital porque inclui os 6 Projectos horizontais e de alavanca de todo o Programa, decisivos para a qualidade e eficiência da Gestão Técnica e Financeira de todo o Programa e para garantir a toda a população da AMRia o acesso aos Serviços Internet.
b) Uma abordagem mais sintetizada das restantes 7 Áreas de Intervenção do Programa, acompanhada de uma breve apreciação do estado da Execução Material de cada Projecto que, mais detalhadamente, está sempre disponível no SAVAD.

Na Secção da Execução Financeira deste Relatório contempla-se:

a) A descrição detalhada da metodologia de Gestão Financeira global, dos procedimentos adoptados e dos sistemas de acompanhamento e verificação operados complementada pelo quadro de Execução Financeira global da Medida 2.3.
b) Uma abordagem mais sintetizada das restantes 7 Áreas de Intervenção do Programa acompanhada dos quadros de Execução Financeira por rubrica. A

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

análise mais detalhada da Execução Financeira de cada Projecto está sempre disponível no SAVAD.

c) A análise semestral dos fluxos financeiros POSI-CEAD e o Orçamento para o biénio 2005-2006.

Finalmente, o relatório termina com uma Análise Crítica e Conclusões, que inclui a apreciação da CEAD sobre o estado actual da Execução Material e Financeira desta Medida e também as suas perspectivas de execução para o biénio 2005-2006.

Faz parte integrante deste Relatório um CD, contendo os seguintes Anexos:

Anexo 01 – Protocolo de Adesão ao P 1.1 EIAD
Anexo 02 – CD de Apoio à Operação dos EIAD
Anexo 03 – Funcionalidades para Guardian
Anexo 04 – Relatório da Iniciativa IRS na Internet – 2004
Anexo 05 – Actas das Reuniões da CEAD - 2004
Anexo 06 – Lista Contactos GAD e Projectos Atribuídos
Anexo 07 – Relatório do 2º Concurso Aveiro Digital
Anexo 08 – PPT da 2ª Sessão Pública de Apresentação Aveiro Digital
Anexo 09 – Relatório da 1ª Reunião Global de Concertação Aveiro Digital
Anexo 10 – Relatórios das 1ªs Reuniões de Concertação por AI
Anexo 11 – Cartazes, Tarjas, Posters e Autocolantes Aveiro Digital
Anexo 12 – Press-Releases e Notícias na Comunicação Social
Anexo 13 – Suplemento Aveiro Digital no Diário de Aveiro de 28.07.2004
Anexo 14 – Apresentações em 2004 do PAD 2003-2006
Anexo 15 – DVD - Programa Iniciativa, Junho 2004
Anexo 16 – Artigo AD na Revista Comunicações, Nº 150, Abril 2004
Anexo 17 – Artigo AD na Revista Media XXI, Nº 78, Nov/Dez 2004
Anexo 18 – Artigo AD na Inter.face – Cidades e Regiões Digitais: O Essencial
Anexo 19 – Enquadramento a Estudos, Mestrados e Doutoramentos
Anexo 20 – Dissertação de Mestrado Célia Cavaleiro, Universidade de Lisboa
Anexo 21 – Artigo de Flávio Nunes da U. MInho, Seminário Internacional "CityFutures"

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MATERIAL

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 1: CONSTRUIR A COMUNIDADE DIGITAL

Introdução

Esta Área de Intervenção é executada directamente pela CEAD e inclui os 6 Projectos horizontais e de alavanca de todo o Programa, decisivos para a qualidade e eficiência da Gestão Técnica e Financeira de todo o Programa e para garantir a toda a população da AMRia o acesso aos Serviços Internet.

Estão contemplados nesta AI os Projectos P1.1, P1.2 e P1.6 que contribuem para a promoção da igualdade de oportunidades e de acesso público e universal à informação, estimulando a formação generalizada e massiva da população para o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação.

No Projecto P1.3 enquadram-se os serviços de gestão e coordenação do Programa Aveiro Digital, baseados numa estrutura logística, técnica e humana com experiência, agilidade e qualidade, para as funções de gestão e controlo operacional, financeiro e administrativo de todos os Projectos.

Nos Projectos P1.4 e P1.5 enquadram-se as actividades associadas à regular comunicação pública ao longo das diferentes fases de execução do programa e dos seus resultados, de forma a garantir o estabelecimento de uma plataforma aberta e transparente que é a garantia do reforço e expansão da rede de confiança social.

A intervenção horizontal e estruturante desta área é fundamental, não só pelo impacto directo na criação de condições socio-culturais de adesão massiva dos cidadãos à Sociedade da Informação, mas também pelo impacto indirecto na avaliação, concertação e promoção dos serviços criados em todas as Áreas de Intervenção.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

P 1.1 – Espaços Internet Aveiro Digital

O Projecto 1.1 – Espaços Internet Aveiro Digital (EIAD) representa um forte compromisso do Programa Aveiro Digital 2003-2006 na criação de instrumentos que permitam a toda a população da AMRia o acesso gratuito à Internet em particular, e às TIC em geral, apoiada por Monitores preparados para prestar apoio e acompanhamento.

O relatório de 2003 incidiu sobre a operação dos EIAD do Município de Aveiro e previa a expansão da rede aos 11 de Municípios da AMRia, contemplando a instalação e operação de um Espaço Internet em cada uma das 95 freguesias da AMRia.

Esta rede é gerida de forma integrada, pela CEAD/GAD e conta com o apoio dos Interlocutores Municipais. Estes interlocutores, com mais conhecimento da realidade local de cada um dos 11 municípios da AMRia e respectivas freguesias, contribuem para a gestão deste Projecto, trazendo-lhe mais valias na operacionalidade e harmonização regional e local e foram, sem dúvida, uma peça chave na fase de adesão das juntas de freguesia ao Projecto EIAD.

Além da instalação e operação regular dos Espaços Internet, estão ainda previstas Iniciativas Horizontais baseadas nos 11 Espaços Internet Municipais, com o objectivo de demonstrar a utilidade da Internet para os segmentos específicos da população da AMRia em risco de info-exclusão como os idosos, as mulheres, os desempregados e os imigrantes, e também para promover, junto da generalidade dos cidadãos, os serviços on-line disponibilizados pela Administração Pública Local e Central.

Espaços Internet no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003-2006

Tendo em conta o orçamento disponível, a dimensão dos objectivos para a Região da AMRia e a importância da sustentabilidade destes Espaços Internet, a CEAD aprovou, na reunião de 28..01.04, o plano de execução para este Projecto, bem como o protocolo de adesão ao Projecto EIAD, baseado num formato que contempla a partilha de responsabilidades e das despesas de exploração com as Câmaras Municipais e com as Juntas de Freguesia, tendo sido convidadas estas entidades a aderirem a este novo formato. (Anexo 01)

No âmbito deste plano, os Espaços Internet Municipais foram equipados com 10 computadores, uma impressora, um *scanner* e um *hub*/*switch* de 16 portas e a sua operação é assegurada por dois monitores, enquanto que os novos Espaços Internet nas Juntas de Freguesia foram equipados com 4 computadores, uma impressora, um

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

scanner e um *hub*/*switch* de 8 portas e a sua operação é assegurada por apenas um monitor.

São da responsabilidade das Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia as despesas de acesso à Internet e de manutenção dos equipamentos, assumindo a CEAD as despesas de investimento nos equipamentos informáticos nos novos Espaços Internet e as despesas mensais com monitoria (250€) e consumíveis (25€), durante dois anos.

Assim, no início de 2004 estavam em funcionamento 11 EIAD, que transitaram para o novo modelo de funcionamento em Maio de 2003 e a "Montra de Aveiro" que formalizou a sua adesão ao protocolo em Fevereiro de 2004.

Durante o ano de 2004 aderiram ao P 1.1 os EIAD Municipais de Vagos e Murtosa, e 68 freguesias da região da AMRia, o que totaliza no final de 2004, sob gestão directa da CEAD, 79 EIAD de Freguesia e 3 EIAD de Município.

No espaço da AMRia os Municípios de Aveiro, Vagos e Murtosa tinham aderido ao Protocolo para instalação e operação dos respectivos Espaços Internet e os restantes 8 Espaços Internet Municipais estavam financiados pelo POSI através da Medida 2.1. No entanto os calendários de financiamento não estavam sincronizados e alguns espaços Internet Municipais terminaram em 2004 o seu financiamento via Medida 2.1.

Com o objectivo de garantir a operação dos 11 Espaços Internet em todos os Municípios da AMRia e também para harmonizar a operação dos EIAD Municipais e a sua participação nas Iniciativas Horizontais a organizar em 2005, nomeadamente o seu papel no processo de Certificação em Competências Básicas nas TIC, a CEAD decidiu convidar estes Espaços Internet a aderirem ao Projecto EIAD, garantindo a sua operação até 31 de Dezembro de 2006, embora num formato de financiamento bastante mais restritivo do que a Medida 2.1.

Instalação dos Espaços Internet Aveiro Digital

Processo de Adesão e Plano de Instalação

Dando seguimento à decisão da CEAD de 28.01.04, foi enviado um convite às 95 Juntas de Freguesia da AMRia e às Câmaras Municipais de Aveiro, Murtosa e Vagos para assinatura do Protocolo de adesão aos EIAD. A instalação dos Espaços Internet de Freguesia foi planeada e realizada em 3 fases e a prioridade foi dada às freguesias que primeiro demonstraram e formalizaram a vontade de aderir ao Projecto, ocorrendo em paralelo a sensibilização das freguesias menos proactivas nesta adesão. Os Interlocutores Aveiro Digital tiveram um papel importantíssimo nesta última tarefa.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

As tabelas seguintes evidenciam as datas de adesão e as Juntas de Freguesia que aderiram em cada uma das fases:

1ª Fase	03.02.04 a 25.02.04
Município	**Junta de Freguesia**
Águeda	Águeda
	Travassô
	Espinhel
	Borralha
	Óis da Ribeira
Albergaria-a-Velha	Angeja
	Alquerubim
	Frossos
Ílhavo	Gafanha da Encarnação
	Gafanha do Carmo
	Gafanha da Nazaré
	São Salvador
Mira	Praia de Mira
	Mira
	Seixo
Murtosa	Murtosa
	Bunheiro
	Torreira
Oliveira do Bairro	Troviscal
Ovar	Ovar
	Esmoriz
Sever do Vouga	Silva Escura
Vagos	Calvão
	Vagos
	Ponte de Vagos
	Santo António de Vagos
	Sosa
	Santa Catarina
	Santo André de Vagos

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

2ª Fase	27.02.04 a 14.09.04
Município	**Junta de Freguesia**
Águeda	Castanheira do Vouga
	Lamas do Vouga
	Macinhata do Vouga
	Aguada de Baixo
Albergaria-a-Velha	Branca
	São João de Loure
	Albergaria-a-Velha
	Fráguas
	Vale Maior
Aveiro	Vera Cruz
Estarreja	Beduído
	Canelas
	Pardilhó
	Salreu
Oliveira do Bairro	Oiã
	Palhaça
	Oliveira do Bairro
Ovar	Cortegaça
	S. João de Ovar
	S. Vicente de Pereira Jusã
Sever do Vouga	Cedrim
	Pessegueiro do Vouga
	Talhadas
Vagos	Ouca

3ª Fase	23.09.04 a 17.12.04
Município	**Junta de Freguesia**
Águeda	Aguada de Cima
	Fermentelos
	Segadães
	Préstimo
	Agadão
Aveiro	Nariz
	São Jacinto
Estarreja	Avanca
	Fermelã
Oliveira do Bairro	Bustos
	Mamarrosa
Ovar	Maceda
Sever do Vouga	Paradela do Vouga
Vagos	Covão do Lobo
	Angeão

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

O modelo de instalação que se inicia após a formalização da adesão, através do envio do protocolo assinado para o Gabinete Aveiro Digital, foi aplicado às 3 fases e, contemplou 4 acções:

a) Visita aos locais;
b) Instalação e configuração dos equipamentos;
c) Reunião com os Presidentes das Juntas de Freguesia;
d) Reunião com os Monitores.

a) Na visita ao local foi feito o levantamento das condições de cada espaço para receber o EIAD e através de uma conversa com o responsável da Junta de Freguesia presente, eram explicitadas as condições necessárias a criar pela Junta de Freguesia e as datas previstas para a instalação e início de operação do Espaço Internet.

Edifício da JF de Espinhel - 06.04.04

Antigo edifício da JF de Cedrim - 05.04.04

b) Os equipamentos foram sempre entregues, nos EIAD, pelas empresas às quais foram adjudicados. Após esta entrega o técnico do GAD responsável, deslocou-se aos EI e procedeu à instalação e configuração de todos os equipamentos.

EIAD de Espinhel

EIAD de Cedrim

c) Com os equipamentos instalados e configurados foi marcada a reunião entre a CEAD, os Presidentes das Juntas de Freguesia e o membro da Junta de Freguesia

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

responsável pelo Espaço Internet Aveiro Digital. Nesta reunião foi apresentado o modelo de gestão global dos EIAD, as normas para apresentação de despesas, divulgado o calendário de abertura dos novos Espaços Internet Aveiro Digital e foi entregue material de apoio e promocional evidenciado na tabela seguinte, com as respectivas quantidades por Espaço Internet.

Designação	Brochuras	Autocolantes	Tarjas AD	Tarjas EI	Cartazes	Bonés	T'shirts	CD	PAD
Quantidade por EIAD	200	100	1	1	10	25	2	1	5

Este material foi de extrema utilidade para a sinalização, divulgação e operação regular dos EIAD. É de destacar, o CD que contem o modelo de relatório mensal de operação e diverso material de apoio à dinamização, e a brochura "Ensina o teu Computador: Manual só para miúdos", uma ferramenta essencial para a qualificação da população nas TIC. (Anexo 02)

Reunião com as Juntas de Freguesia 1ª Fase – 28.04.04

Reunião com as Juntas de Freguesia 2ª Fase – 30.07.04

d) Por último, foi promovida uma reunião do GAD com os Monitores dos EIAD. Nesta reunião, após um breve enquadramento do P 1.1 EIAD no Programa Aveiro Digital, que se demonstrou útil para melhor compreensão da missão dos EIAD, foram tratados assuntos gerais da operação regular dos EIAD e concretamente o preenchimento e uso do relatório mensal de operação.

Reunião com os Monitores 1ª Fase – 31.05.04

Reunião com os Monitores 2ª Fase – 14.09.04

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Na tabela seguinte podem ser vistas as datas das acções descritas, para as 3 fases de instalação.

1ª Fase	
Visita aos locais dos futuros 29 EIAD	29.03.04 a 13.04.04
Instalação e configuração dos equipamentos	12.04.04 a 30.04.04
Reunião com os Presidentes das 29 Juntas de Freguesia	28.04.04
Press Release: Abertura de 29 Novos EIAD	28.04.04
Abertura dos 29 EIAD – 1ª fase	03.05.04
Reunião com os Monitores – 1ª fase	31.05.04
2ª Fase	
Visita aos locais dos futuros 24 EIAD	13.07.04 a 16.07.04
Instalação e configuração dos equipamentos	16.07.04 a 21.08.04
Reunião com os Presidentes das 24 Juntas de Freguesia	30.07.04
Press Release: Abertura de 22 Novos EIAD	28.07.04
Abertura dos 24 EIAD – 2ª fase	02.08.04
Reunião com os Monitores – 2ª fase	14.09.04
3ª Fase	
Visita aos locais dos futuros 15 EIAD	18.11.04 a 03.12.04
Instalação e configuração dos equipamentos	13.12.04 a 22.12.04
Reunião com os Presidentes das 15 Juntas de Freguesia	20.12.04
Press Release: Abertura de 15 Novos EIAD	19.12.04
Abertura dos 15 EIAD – 3ª fase	22.12.04
Reunião com os Monitores – 3ª fase	21.01.05

Data de início de operação dos EIAD

A data concreta para a abertura do respectivo Espaço Internet foi deixada ao critério das Juntas de Freguesia, bem como o modo a adoptar. Algumas optaram por inaugurações formais, onde a CEAD e o GAD estiveram presentes sempre que convidados, conforme evidenciado na tabela seguinte:

Iniciativa	Local de Realização	Data
Inauguração do EIAD da Freguesia de Esmoriz	Esmoriz	22.05.04
Inauguração do EIAD da Freguesia de São Salvador	São Salvador	24.05.04
Inauguração do EIAD da Freguesia de Ouca	Ouça	01.09.04
Inauguração do EIAD da Freguesia de Canelas	Canelas	11.09.04
Inauguração do EIAD da Freguesia de Albergaria-a-Velha	Albergaria-a-Velha	18.09.04
Inauguração do EIAD da Freguesia da Branca	Branca	18.09.04
Inauguração do EIAD da Freguesia da Palhaça	Palhaça	01.10.04
Inauguração do EIAD da Freguesia de Salreu	Salreu	04.10.04
Inauguração do EIAD da Freguesia de São João de Loure	São João de Loure	27.11.04
Inauguração do EIAD da Freguesia de Ribeira de Fráguas	Ribeira de Fráguas	28.11.04

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Inauguração do EIAD de São Salvador, Ílhavo - 24.05.04

Inauguração do EIAD de Ouca - 01.09.04

Quanto aos EIAD de Município, Vagos iniciou a sua operação regular a 17.02.04, Murtosa um pouco mais tarde, a 28.07.04, este atraso deveu-se ao facto de o edifício ter necessitado de obras que tiveram algum atraso.

Inauguração do EIAD do Município de Vagos - 17.02.04

Inauguração do EIAD do Município da Murtosa - 28.07.04

Equipamento instalado em 2004

A tabela seguinte é uma síntese dos equipamentos instalados durante o ano de 2004, no âmbito do Projecto EIAD, evidenciando o número e a tipologia de equipamentos actualmente a operar no terreno:

Equipamento Instalado durante 2004	EIAD	PC's	Impressoras	Scanner's
Nos EIAD de Freguesia	68	272	68	68
Nos Municípios	2	20	2	2
Total	**70**	**292**	**70**	**70**
Equipamento total instalado actualmente	**EIAD**	**PC's**	**Impressoras**	**Scanner's**
Nas freguesias (1ª, 2ª e 3ª fase)	68	272	68	68
Nas freguesias de Aveiro desde (Maio de 2003)	11	51	11	11
Municipal da Murtosa	1	10	1	1
Municipal de Vagos	1	10	1	1
Municipal de Aveiro	1	12	1	1
Total	**82**	**355**	**82**	**82**

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Operação Regular dos Espaços Internet Aveiro Digital

A operação regular dos EIAD é da responsabilidade dos Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia, que para o efeito contratam Monitores com o adequado perfil.

Compete ao GAD e aos Interlocutores Municipais acompanhar esta operação de modo a garantir que são cumpridos os horários de funcionamento comprometidos e é dado o necessário apoio aos utilizadores.

A verificação do funcionamento é feita com regularidade mensal através da validação dos relatórios de operação que acompanham a apresentação de despesas. Os dados dos relatórios referidos alimentam os dados estatísticos anuais.

Aplicação de gestão de Espaços Internet – Guardian

O registo dos utilizadores nos EIAD é actualmente feito pelos Monitores numa folha de cálculo, com evidentes problemas de fiabilidade e de rigor.

Ainda em 2003 foi considerado necessário encontrar um formato de registo e gestão da utilização dos EIAD que garantisse a fiabilidade e a credibilidade destes processos, tendo sido identificado no mercado uma aplicação comercial – o Guardian, usada para gestão de Cyber-Cafés.

Assim a CEAD decidiu, na sua 14ª reunião, que o Guardian tinha características que o posicionavam como uma ferramenta de gestão para Espaços Internet, mas que apesar deste software aparentemente responder ao pretendido, era necessário avaliar a sua aplicação às condições reais de funcionamento e de gestão de um EIAD. Assim, foi decidido testar o software Guardian através da sua aplicação experimental em 2 EIAD, um de Município – Vagos, e outro de Freguesia – Esgueira, durante um mês. Neste teste o GAD verificou que a aplicação necessitava de incluir mais algumas funcionalidades para responder à especificidade da gestão dos EIAD. Foi então elaborado um documento – Funcionalidades Aveiro Digital para o produto Guardian, que foi negociado com o fornecedor que aceitou patrocinar este desenvolvimento adicional para o Programa Aveiro Digital em contrapartida da evidência deste apoio. (Anexo 03)

Nestas condições o Software Guardian foi adjudicado à CASE, prevendo-se a sua instalação durante o mês de Janeiro de 2005.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Estatísticas da Utilização dos Espaços Internet Aveiro Digital

Apresentam-se em seguida os resultados da frequência dos utilizadores[1] e das utilizações[2] dos EIAD no período de Janeiro a Dezembro de 2004.

O número total de utilizadores dos EIAD no ano de 2004 foi de 35.200 utilizadores, sendo este resultado obtido com base no registo mensal produzido pelos Monitores dos EIAD, que se obrigam a garantir a recolha e registo de dados com base num formato único e comum.

Gráfico 1 - Número de utilizadores dos EIAD/Mês - 2004

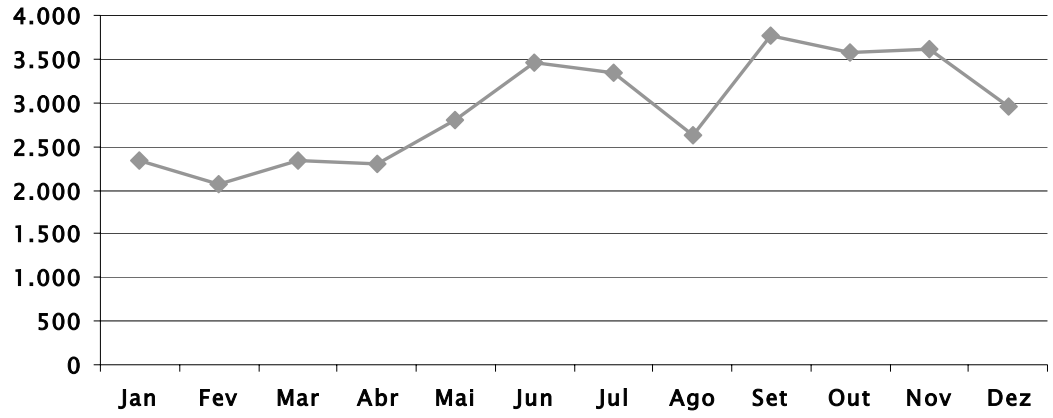

A distribuição destes utilizadores por faixa etária, pode ser visualizada nos gráficos seguintes:

Gráficos 2 e 3 - Distribuição dos utilizadores por faixa etária

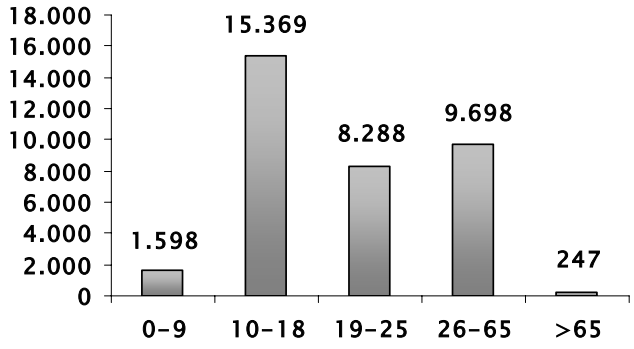



[1] Por "utilizador", entende-se a pessoa que utilizou apenas um período de meia hora em qualquer um dos EIAD num determinado mês.

[2] Por "utilização" entende-se a soma dos períodos de meia hora que cada utilizador realizou durante cada mês;

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

A ocupação dos utilizadores, obtida com base em valores anuais, pode ser visualizada nos gráficos seguintes:

Gráficos 4 e 5 – Ocupação dos Utilizadores

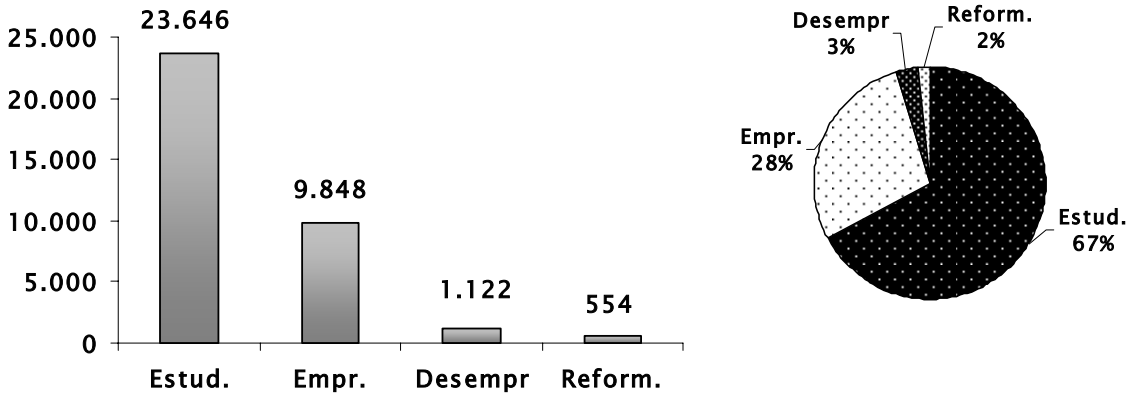

O número total de utilizações dos EIAD no ano de 2004 foi de 260.527, numa média de 21.711 utilizações por mês. A distribuição destas utilizações ao longo dos meses de 2004, pode ser visualizada no gráfico seguinte:

Gráfico 6 – Número de utilizações nos EIAD/Mês

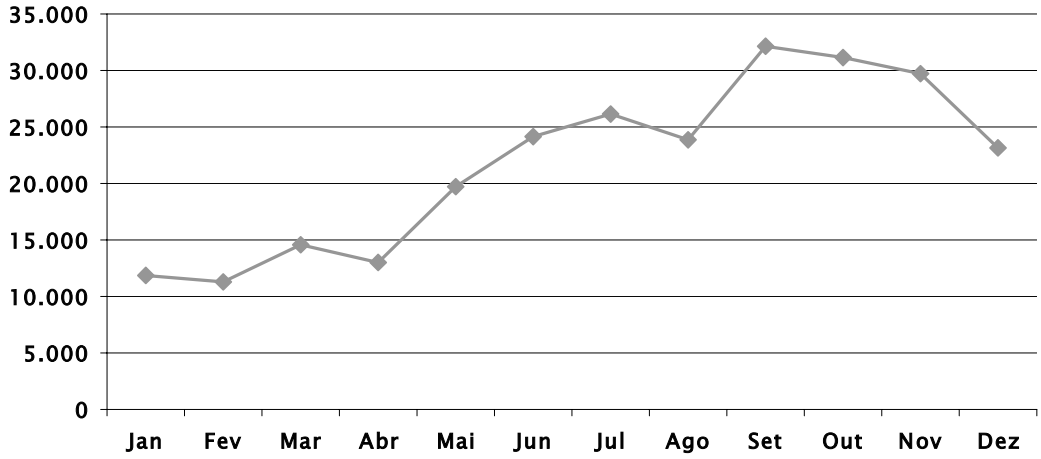

Como se pode verificar pela analise do gráfico anterior, existiram 2 grandes aumentos no número de utilizações, o 1º em Maio e o 2º em Setembro, que se deve ao facto de nesses meses se ter iniciado a operação dos novos EIAD, da 1ª e 2ª fase de adesão, respectivamente. A entrada dos EIAD que aderiram à 3ª fase só se vai sentir em Janeiro de 2005.

De referir, que estas utilizações são, na sua grande maioria, dedicadas à realização de trabalho pessoal/profissional (71%), como é evidenciado nos gráficos seguintes:

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Gráficos 7 e 8 – Utilizações por tipo de utilização



No gráfico seguinte, podem ser visualizadas as ferramentas/aplicações mais usadas pelos utilizadores dos Espaços Internet Aveiro Digital:

Gráficos 9 – Utilizações por ferramenta (Nº absoluto)

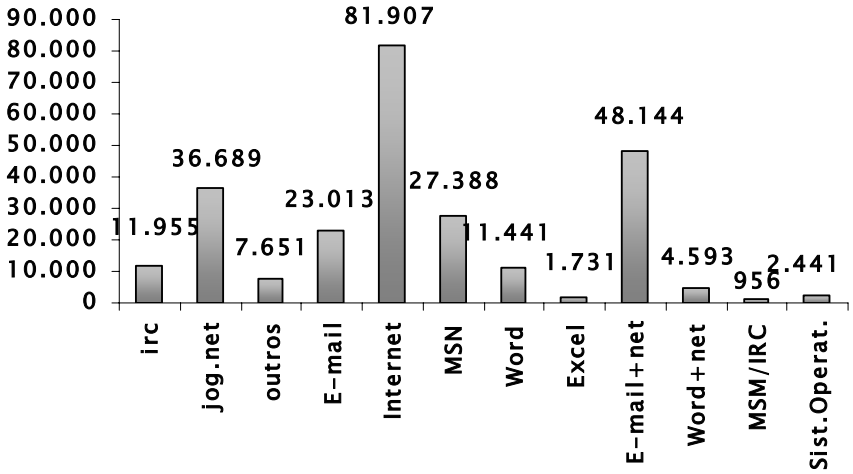

De referir ainda que o rácio entre utilizações e utilizadores foi de 7, o que equivale a dizer que cada utilizador usufruiu, em média, de um conjunto de 7 períodos de 30 minutos durante cada mês.

Iniciativas Horizontais

O Projecto Espaços Internet Aveiro Digital prevê no seu Plano Técnico e Financeiro a realização de um conjunto de Iniciativas Horizontais.

Estas Iniciativas Horizontais têm como objectivo estimular a utilização de serviços disponíveis na Internet, com evidente utilidade para os cidadãos, promovendo uma metodologia comum de operação dos 11 Espaços Internet Municipais, focada na

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

utilidade dos serviços e nos segmentos da população com maiores problemas de inclusão.

Durante o ano de 2004 realizou-se apenas a iniciativa IRS na Internet, pois foi dada prioridade à instalação dos novos Espaços Internet.

No entanto já durante 2004 a iniciativa IRS na Internet foi lançada em todos os Municípios da AMRia, estendendo o modelo usado em 2003 nos EIAD das freguesias de Aveiro e nos EIAD dos Municípios de Aveiro e Ílhavo.

Esta iniciativa foi desenvolvida em colaboração com as Direcções Distritais de Finanças de Aveiro e Coimbra e as Câmaras Municipais de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos e decorreu de 23.02.04 a 30.04.04.

Foi uma iniciativa claramente oportuna e útil aos contribuintes de toda a região da AMRia, o que transparece na adesão que teve na maioria dos EIAD e pelo aumento significativo do número de contribuintes aderentes relativamente ao ano anterior, conforme se pode verificar pela analise dos números apresentados na tabela seguinte:

Iniciativa IRS na Internet - Totais de aderentes por Município

Adesão por Município	1ª Fase	2ª Fase	1ª+2ª Fase
Águeda	0	1	1
Albergaria	28	6	34
Aveiro	45	41	86
Estarreja	15	11	26
Ílhavo	10	4	14
Mira	3	0	3
Oliveira do Bairro	5	0	5
Ovar	0	0	0
Sever	82	14	96
Vagos	1	0	1
Total	**189**	**77**	**266**

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Para uma ideia mais clara e rápida os mesmos números são apresentados sobre a forma gráfica:

Gráfico 10 – Adesão à iniciativa IRS na Internet (por Município)

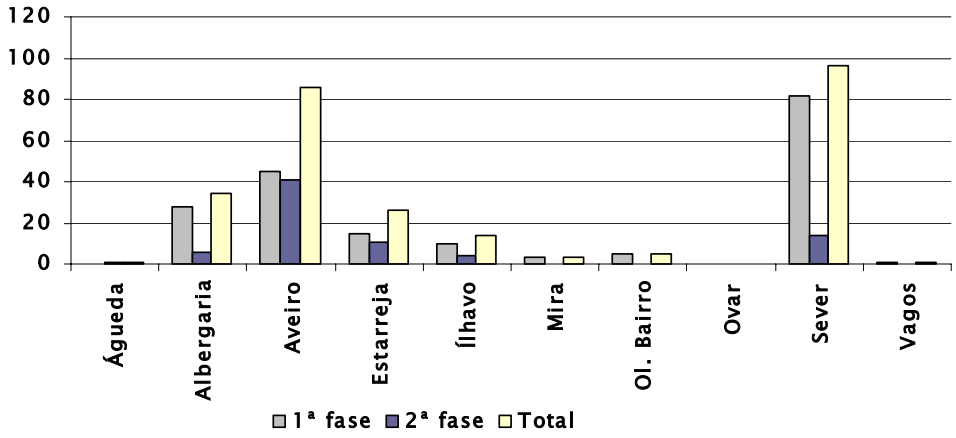

Para um conhecimento mais profundo desta iniciativa, pode ser consultado o Relatório da Iniciativa IRS na Internet 2004. (Anexo 04)

Iniciativas Horizontais 2005

As Iniciativas Horizontais planeadas para 2005 serão estruturadas seguindo o modelo de outras iniciativas realizadas anteriormente, com base no formato definido no Documento "Notas de uma aprendizagem...Pequena contribuição para a iniciativa Espaços Internet"" publicado em Março de 2001 pelo Programa Aveiro Digital. Entre estas iniciativas, contam-se, por exemplo, a "Internet para as Mulheres" ou "Preparar o futuro para lá dos 50".

Estas Iniciativas Horizontais são organizadas com base na articulação com entidades locais e regionais com experiência nos sectores específicos a dinamizar ou nos serviços a promover e envolvem grandes recursos de divulgação nos OCS e na rede global dos Espaços Internet.

A metodologia para a organização das Iniciativas Horizontais obedece a um modelo comum, caracterizado pelas seguintes fases:

- Identificação e convite à(s) Entidade(s) apropriada(s) para a organização conjunta da Iniciativa Horizontal;
- Sistematização de uma lista de sítios web, contendo uma descrição sumária dos serviços oferecidos e com interesse directo para o público alvo;

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

- Aplicação à população alvo do guia de formação básica "Ensina o teu Computador: Manual só para miúdos";
- Promoção de debates on-line, moderados por pessoas de reconhecida competência nas áreas de interesse do público-alvo;
- Implementação sincronizada baseada nos 11 Espaços Internet Municipais, de forma a assegurar a harmonização de processos e o impacto alargado a toda a Região da AMRia.

Todos os materiais produzidos ao longo de cada Iniciativa Horizontal integram áreas específicas do site www.aveiro-digital.pt para garantir a continuidade da sua utilidade para a população.

Assim, tendo em conta a importância destas iniciativas na qualificação da população em geral e de sectores da população em particular, e estando, em 2005, a rede de 11 Espaços Internet Municipais, a funcionar em toda a região da AMRia, foi elaborado e aprovado na 17ª reunião da CEAD, um plano macro de Iniciativas Horizontais para 2005.

As iniciativas propostas, evidenciadas na tabela seguinte, são direccionadas à população em geral e/ou a sectores específicos da sociedade que como públicos alvo, determinam os serviços Internet que lhe são úteis.

Iniciativa - Designação	Mês	Entidades Envolvidas	Orçamento
"IRS na Internet"	Fev-Abr 2005	CEAD, CM da AMRia, DDF de Aveiro e Coimbra	2.250€
"Procura Emprego? O Rato ajuda..."	Fev-Mar 2005	CEAD, CM da AMRia, JF da AMRia, IEFP	2.250€
"A Internet para os +Velhos"	Mai-Jun 2005	CEAD, CM da AMRia, JF da AMRia, IPSS	2.250€
"Conta Bancária na Internet"	Jun-Jul 2005	CEAD, CM da AMRia, JF da AMRia, Instituições Bancárias	2.250€
"A Internet para as Mulheres"	Set-Out 2005	CEAD, CM da AMRia, JF da AMRia,	2.250€
"Administração Pública na Internet"	Out-Nov 2005	CEAD, CM da AMRia, JF da AMRia, Loja do Cidadão	2.250€

Adicionalmente, o Projecto P1.6 – Certificação em Competências Básicas nas TIC, vai mobilizar os 11 Espaços Internet Municipais e alguns Espaços Internet de Freguesia com condições adequadas, para o plano global de execução de 20.000 CCBTic na Região da AMRia, como uma iniciativa horizontal mobilizadora destes recursos localizados em toda a Região e próximos da população.

Analise crítica e conclusões

A rede de EIAD no final de 2004 é constituída por 79 EIAD nas freguesias da AMRia e 3 EIAD nas sedes de Município pois embora todos os 11 Municípios estejam equipados com Espaços Internet, 8 deles ainda são financiados pela Medida 2.1.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Durante o ano 2004 atingiram-se mais de 260.000 utilizações e já com a adesão, no ano de 2004, de 35.200 utilizadores num total de 130.000 Horas de operação.

Considerando a dimensão geográfica do Projecto EIAD o ano 2004 foi um exercício muito positivo de conjugação e articulação de vontades, da CEAD, das Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia, o que permitiu estender a rede de EIAD a toda a região da AMRia e assim criar uma vasta rede de equipamentos oferecendo à população acesso gratuito à Internet e aos serviços que esta oferece.

Para Janeiro de 2005 está planeada a instalação da aplicação Guardian, ferramenta de gestão para EIAD. Com esta ferramenta o registo e gestão da utilização dos EIAD será mais fiável e credível garantindo a fiabilidade e uniformização dos dados de utilização dos 90 EI da Região da AMRia.

Considerando a importância das Iniciativas Horizontais para a qualificação da população em geral e o seu contributo no combate à info-exclusão de vários sectores, a sua realização assumirá um papel fundamental nas actividades de 2005.

Assim, prevê-se que as Iniciativas Horizontais planeadas com os 11 Espaços Internet Municipais mobilizem sincronizadamente em toda a AMRia, segmentos da população específicos como os idosos, as mulheres e os imigrantes para a utilização dos serviços na Internet.

Adicionalmente e para promover e divulgar os serviços úteis à generalidade dos cidadãos, as Iniciativas Horizontais através dos 11 Espaços Internet Municipais, vão também permitir o treino nas aplicações da Administração Pública Local e Central, da Banca on line e da Administração Fiscal.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

P 1.2 – Serviços Básicos Aveiro Digital

Este Projecto tem como objectivo facilitar o acesso a serviços Internet de forma livre, gratuita e fiável ao público em geral, às famílias, aos utilizadores dos Espaços Internet Aveiro Digital, às escolas e às associações culturais, recreativas e sociais.

Pretende-se por um lado disponibilizar à população da Região da AMRia toda a informação relevante no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003 – 2006 através do site www.aveiro-digital.pt e por outro, facilitar o uso das TIC, através dos serviços de correio electrónico e de páginas pessoais, www.aveiro-digital.net, estimulando-se assim a massificação e uso das TIC consideradas fundamentais para a qualificação generalizada da população da Região.

As principais actividades realizadas em 2004, no âmbito deste Projecto, foram:

Serviços .PT

Através do site www.aveiro-digital.pt foi garantida, em 2004, a divulgação e apresentação das actividades desenvolvidas no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003-2006, destacando-se o suporte às várias iniciativas, promovendo a regular comunicação com a população da Região da AMRia.

Assim, no caso concreto dos Projectos de execução directa pela CEAD, foi garantido o seguinte:

- EIAD – Espaços Internet Aveiro Digital, em que foram divulgados todos os espaços Internet da região da AMRia em funcionamento, horários e sua localização;
- GCAD – Gestão e Coordenação do Programa Aveiro Digital, no sentido de racionalizar os meios para a comunicação com os grupos de entidades mais relevantes no âmbito do Programa Aveiro Digital, foram criadas e actualizadas regularmente um conjunto de listas de correio electrónico: CEAD@aveiro-digital.pt: Comissão Executiva Aveiro Digital; Gad@aveiro-digital.pt: Gabinete Aveiro Digital; Interlocutores@aveiro-digital.pt: Interlocutores Aveiro Digital; EBC@aveiro-digital.pt: Entidades Beneficiárias Credenciadas Aveiro Digital; EBP@aveiro-digital.pt: EBPs – Entidades Beneficiárias Principais dos 72 Projectos Aveiro Digital; EBP1@aveiro-digital.pt: EBPs dos Projectos AD Aprovados no âmbito do 1º Concurso; EBP2@aveiro-digital.pt: EBPs dos Projectos AD Aprovados no âmbito do 2º Concurso; AI2 a AI8@aveiro-digital.pt: EBPs dos Projectos AD nas várias Áreas de Intervenção; OCS@aveiro-digital.pt: Órgãos de

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Comunicação Social. Neste âmbito, foi criado o acesso directo ao SAVAD: Sistema de Acompanhamento e Verficação Aveiro Digital;

- MARKAD – Marketing e Promoção para Ganhar Massificação, foram publicados eventos, acontecimentos, notícias e iniciativas do Programa Aveiro Digital 2003 – 2006 e dos 78 Projectos em execução. Foi ainda revista regularmente a área: "O que a Internet tem para si";
- APAD – Aprender e Partilhar Aveiro Digital, foram publicados os materiais produzidos, nomeadamente os PowerPoint's e também os documentos relevantes produzidos pelo POSI e pela UMIC para as Cidades e Regiões Digitais.

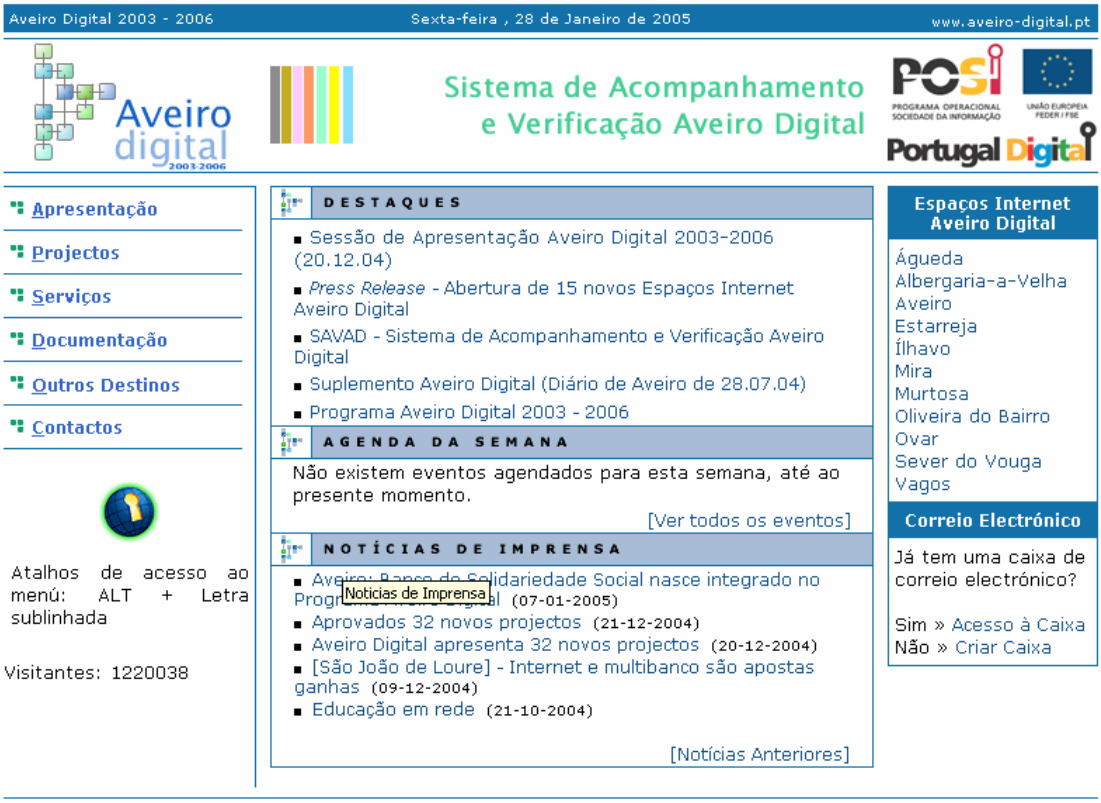

Site www.aveiro-digital.pt

O *site* do Programa Aveiro Digital 2003-2006, registou em 2004, uma média de 172 mil acessos por mês.

De referir que um número significativo de acessos ao SAVAD – Sistema de Apoio e Verificação Aveiro Digital é feito através do endereço www.aveiro-digital.pt, embora este Sistema tenha um acesso independente a partir de www.aveiro-digital.pt/savad que, em 2004, contabilizou uma média mensal de 27.000 acessos.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Serviços.NET

Os serviços oferecidos gratuitamente em aveiro-digital.net são fundamentais para estimular a aprendizagem e utilização regular das TIC e dos serviços Internet.

São oferecidos serviços de páginas pessoais e de correio electrónico com a extensão @aveiro-digital.net. O serviço de chat com moderação é usado para debates específicos por iniciativa concreta como por exemplo as Iniciativas Horizontais planeadas para os Espaços Internet e também por Área de Intervenção do Programa.

O serviço de páginas pessoais permite o alojamento com um tamanho máximo de 10 MB, por utilizador.

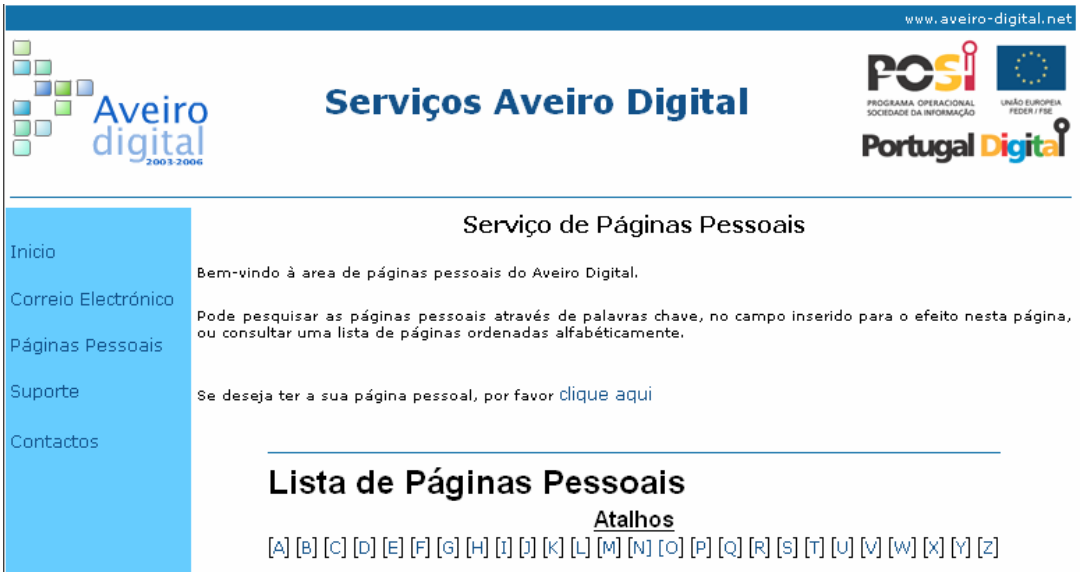

Serviço de páginas pessoais

O serviço de e-mail tem a mais valia de ser uma ferramenta útil na operação dos Espaços Internet Aveiro Digital, possibilitando a criação de contas de correio electrónico com 10 MB para cada utilizador.



Serviço de correio electrónico

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

O serviço de chat moderado, baseado num servidor de irc, é utilizado em www.aveiro-digital.pt, na secção de debates que abrangem as 8 áreas de intervenção do Programa Aveiro Digital 2003 – 2006.

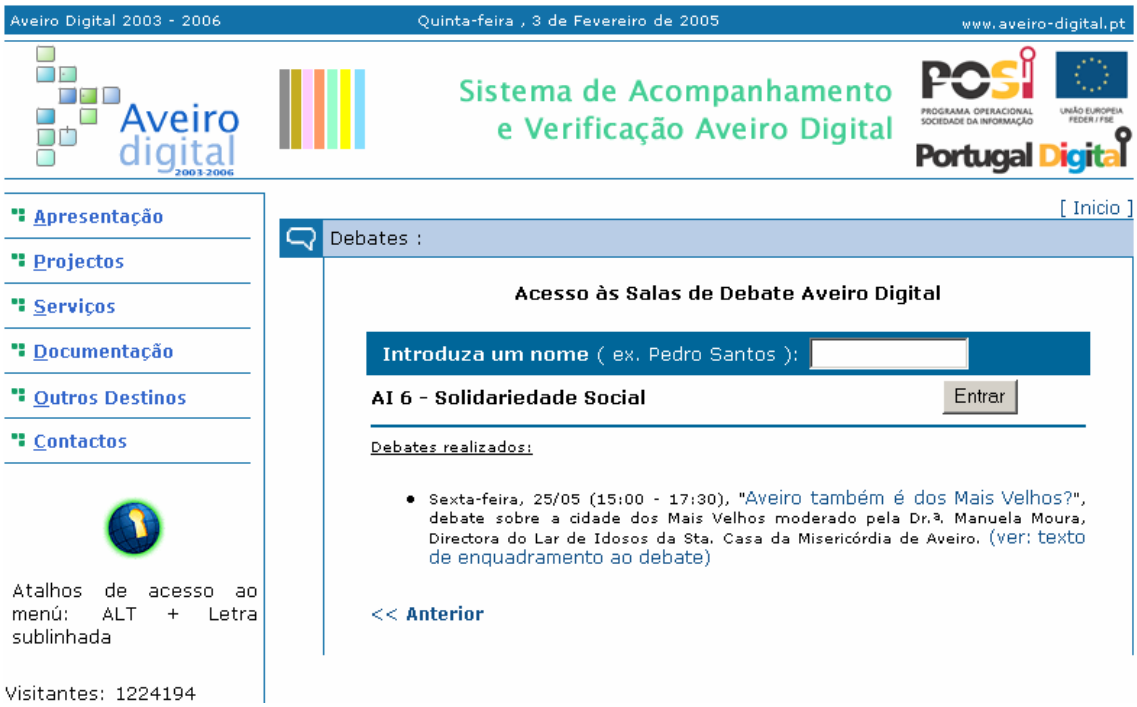

Serviço de chat com moderação

Para garantir a utilização massiva destes serviços e a correcção atempada dos problemas, foi feita a sua sistemática monitorização, tendo ainda sido disponibilizado um help-desk que respondeu em tempo útil e caso a caso, às dúvidas dos utilizadores, nomeadamente sobre a configuração dos serviços.

Foi ainda disponibilizada uma área de suporte aos utilizadores em www.aveiro-digital.net, onde se encontram manuais de apoio à configuração dos serviços de correio electrónico e de páginas pessoais.

Em Dezembro de 2004, estavam alojadas nos serviços www.aveiro-digital.net 498 páginas pessoais, o que representa um acréscimo de 32% relativamente a 2003 e 6992 caixas de correio electrónico, registando-se a sua utilização regular.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

P 1.3 – Gestão e Coordenação do Programa Aveiro Digital

O Projecto 1.3 – Gestão e Coordenação do Programa Aveiro Digital, tem como objectivo a gestão e coordenação do Programa Aveiro Digital 2003-2006.

Compete à Comissão Executiva Aveiro Digital, constituída com base num protocolo entre a Associação de Municípios da Ria e a Associação Aveiro Digital, a direcção e gestão do Programa Aveiro Digital 2003-2006, bem como a promoção das actividades de concertação e avaliação.

A CEAD é apoiada pelo Gabinete Aveiro Digital com uma estrutura logística, técnica e humana adequada à execução das decisões de gestão, nomeadamente ao acompanhamento e verificação da execução dos Projectos da AI2 à AI8, à concertação e avaliação e à execução dos Projectos incluídos na Área de Intervenção 1: Comunidade Digital.

A CEAD reúne periodicamente e extraordinariamente quando necessário, sendo produzidas Actas e Agendas de todas as Reuniões. Em 2004 realizaram-se 6 Reuniões da CEAD. (Anexo 05)

Foi adoptada uma arquitectura funcional que representa a intervenção da CEAD na execução global do Programa:

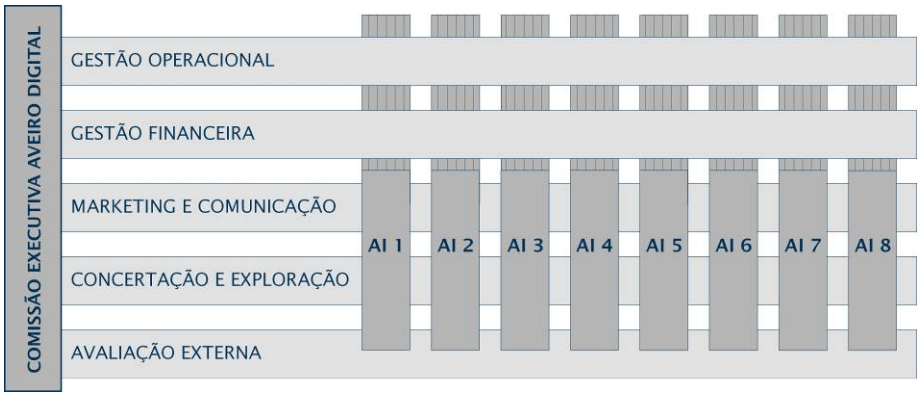

As principais actividades realizadas em 2004, no âmbito deste Projecto, foram as seguintes:

Gabinete Aveiro Digital

Tendo em conta as funções técnicas de gestão operacional e financeira necessárias ao Programa Aveiro Digital 2003-2006, foi tida particular atenção com a estrutura logística e humana do GAD – Gabinete Aveiro Digital. O Gabinete Aveiro Digital

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

funciona nas instalações do Parque de Exposições de Aveiro, ocupando 4 gabinetes e dispondo ainda de uma Sala de Reuniões, um Arquivo Documental, um Espaço de Armazém e um Gabinete da CEAD.

O GAD é constituído por 3 Técnicos Superiores (Planeamento Regional e Urbano, Gestão de Empresas e Auditoria Contabilística); 3 Técnicos (Profissional de Informática, Bacharel em Planeamento Regional e Urbano e Bacharel em Gestão) e uma Secretária. Neste Gabinete estão incluídos os serviços de apoio técnico, atendimento e secretariado que mantém o arquivo e registo documental e de correspondência actualizados e que em 2004 processou e deu encaminhamento à entrada e saída de, respectivamente, 1538 e 1356 Ofícios, garantindo o melhor seguimento dos contactos telefónicos com o PAD 2003-2006 a mais de 320 entidades diferentes.

Dada a necessidade de garantir ferramentas informáticas de trabalho fiáveis e eficientes e tendo em conta as exigências de segurança e qualidade de serviço no processamento e arquivo de informação, em 2004, foram adquiridos para o GAD vários pacotes de software de escritório: MS Office (8); Adobe Acrobat Writer (3); MS FrontPage (2); Macromedia Studio (1); Symantec Norton Corporate Anti-Virus (9); Norton SystemWorks 2004 (1).

Para agilizar e racionalizar os procedimentos de acompanhamento e verificação da execução dos 78 Projectos Aveiro Digital, foi concebido e desenvolvido, o SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital, tendo a CEAD nomeado ainda um Técnico do GAD como Contacto único para cada Projecto Aveiro Digital.

O Contacto GAD de cada Projecto é o elo de ligação preferencial com a Entidade Beneficiária Principal de cada Projecto e acompanha de perto a execução dos Projectos AD que lhe estão atribuídos, estando-lhe cometidas as funções de harmonização e validação prévia de processos de Aquisição de Equipamentos, de análise e verificação dos Resultados documentais, de emissão de pareceres para a Alteração dos Planos Técnicos e Financeiros e para a validação técnica dos Reembolsos de Despesas. (Anexo 06)

Em 2004 os Contactos GAD verificaram 60 processos de Aquisição de Equipamentos, 248 Resultados Documentais e emitiram pareceres para 17 Alterações aos PTFs e 13 para validação técnica dos Reembolsos de Despesas.

A concepção e o desenvolvimento do SAVAD garantiram que toda a informação da execução material e financeira dos 78 Projectos Aveiro Digital fosse harmonizada e arquivada em formato digital, permitindo o seu processamento e agregação em três níveis distintos: PAD 2003-2006, Área de Intervenção e Projecto.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

O acesso ao SAVAD é feito através de logins e passwords específicos, que permitem aceder a áreas e funcionalidades específicas conforme o tipo de perfil atribuído. Foram criados os perfis das EBPs, do GAD, do POSI, das Entidades Avaliadoras e dos Fornecedores de Formação.

Além das funcionalidades para o acompanhamento e verificação das tarefas dos Projectos AD associadas à Medida 2.3 – Cidades e Regiões Digitais, financiamento FEDER, foram também implementadas no SAVAD, funcionalidades de Gestão das Certificações e de Gestão da Formação, para o acompanhamento e verificação dos Resultados das Medidas 1.1 – Competências Básicas e 2.4 – Acções Integradas de Formação, ambas com financiamento FSE.

Assim, as EBPs dispõem no SAVAD de 4 áreas específicas para a Gestão Técnica e Financeira dos respectivos Projectos: Gestão Técnica, Gestão Financeira, Gestão da Formação e Gestão da Certificação.

As descrições detalhadas das funcionalidades SAVAD para a Gestão da Formação e para a Gestão da Certificação estão contempladas, respectivamente, nos Relatórios de Progresso Material e Financeiro – 2004 das Medidas 2.4 e 1.1.

As funcionalidades SAVAD para a Gestão Financeira, são descritas em detalhe no Relatório de Execução Financeira e a descrição detalhada das funcionalidades SAVAD para a Gestão Técnica é apresentada de seguida.

Gestão Técnica no SAVAD

Conforme referido, o SAVAD está estruturado em três níveis diferentes: PAD 2003-2006, Área de Intervenção e Projecto AD, que contemplam funcionalidades e informação específica por perfil.

Assim, na área da Gestão Técnica do PAD 2003-2006, encontra-se a Lista e Estado dos Resultados comprometidos nos Projectos AD, conforme os Planos Técnicos e Financeiros aprovados. A informação é agregada por Projecto AD e ordenada por Área de Intervenção, não sendo passível de qualquer intervenção. Esta área de informação é disponibilizada a todas as Entidades Beneficiárias Principais, no sentido de estimular a sua participação.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

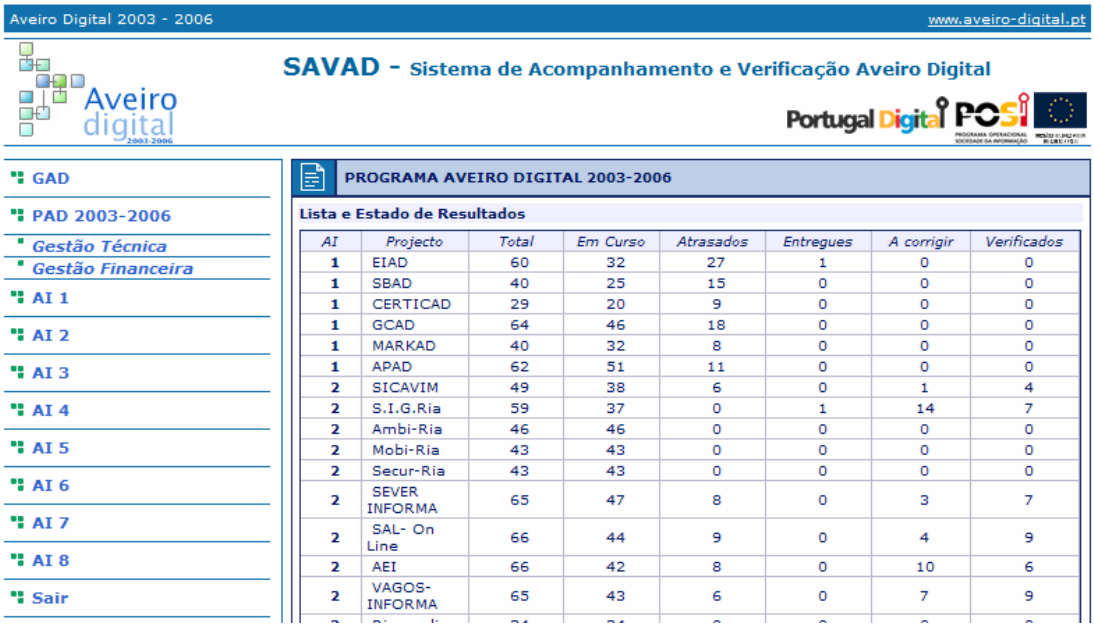

AI	Projecto	Total	Em Curso	Atrasados	Entregues	A corrigir	Verificados
1	EIAD	60	32	27	1	0	0
1	SBAD	40	25	15	0	0	0
1	CERTICAD	29	20	9	0	0	0
1	GCAD	64	46	18	0	0	0
1	MARKAD	40	32	8	0	0	0
1	APAD	62	51	11	0	0	0
2	SICAVIM	49	38	6	0	1	4
2	S.I.G.Ria	59	37	0	1	14	7
2	Ambi-Ria	46	46	0	0	0	0
2	Mobi-Ria	43	43	0	0	0	0
2	Secur-Ria	43	43	0	0	0	0
2	SEVER INFORMA	65	47	8	0	3	7
2	SAL- On Line	66	44	9	0	4	9
2	AEI	66	42	8	0	10	6
2	VAGOS-INFORMA	65	43	6	0	7	9

SAVAD – Execução Técnica: PAD 2003-2006

A informação relativa à Gestão Técnica associada a cada Área de Intervenção evidencia os Projectos, respectivos resultados e estado. Esta área permite ainda visualizar o orçamento e a execução financeira da Área de Intervenção seleccionada.

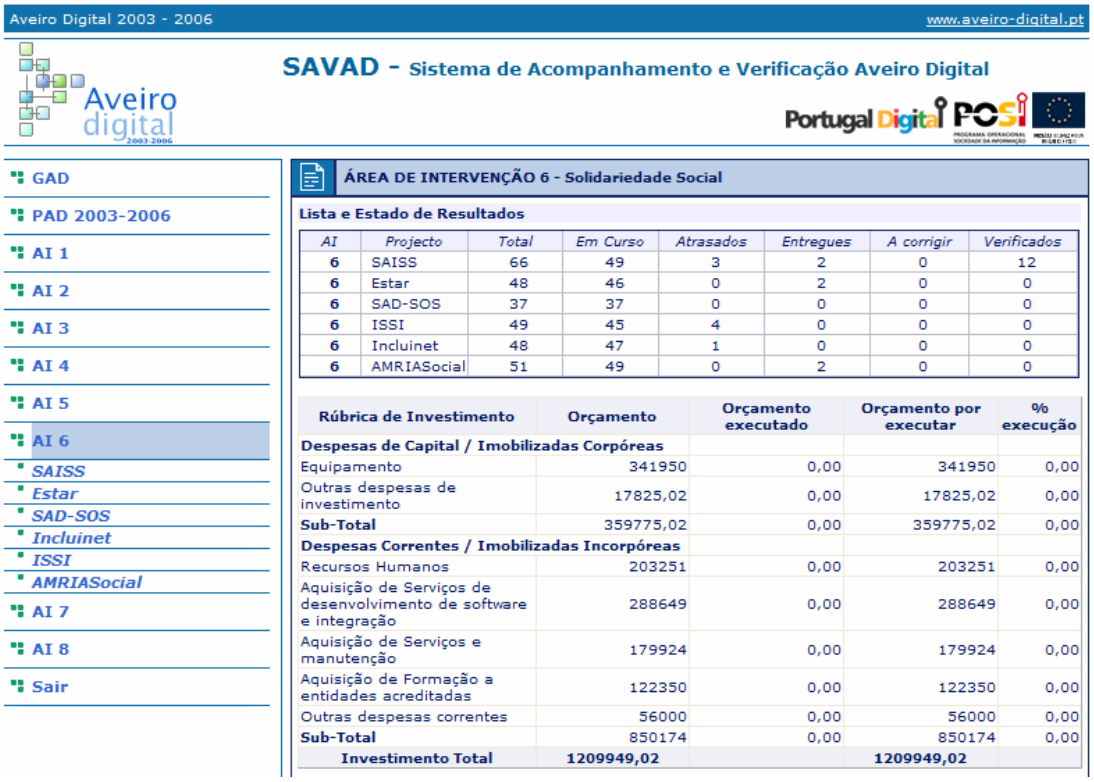

AI	Projecto	Total	Em Curso	Atrasados	Entregues	A corrigir	Verificados
6	SAISS	66	49	3	2	0	12
6	Estar	48	46	0	2	0	0
6	SAD-SOS	37	37	0	0	0	0
6	ISSI	49	45	4	0	0	0
6	Incluinet	48	47	1	0	0	0
6	AMRIASocial	51	49	0	2	0	0

Rúbrica de Investimento	Orçamento	Orçamento executado	Orçamento por executar	% execução
Despesas de Capital / Imobilizadas Corpóreas				
Equipamento	341950	0,00	341950	0,00
Outras despesas de investimento	17825,02	0,00	17825,02	0,00
Sub-Total	359775,02	0,00	359775,02	0,00
Despesas Correntes / Imobilizadas Incorpóreas				
Recursos Humanos	203251	0,00	203251	0,00
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	288649	0,00	288649	0,00
Aquisição de Serviços e manutenção	179924	0,00	179924	0,00
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	122350	0,00	122350	0,00
Outras despesas correntes	56000	0,00	56000	0,00
Sub-Total	850174	0,00	850174	0,00
Investimento Total	**1209949,02**		**1209949,02**	

SAVAD – Execução Técnica e Financeira por AI

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Na área Gestão Técnica dos Projectos AD, é possível não só visualizar cada um dos Resultados comprometidos e respectivo estado, como ainda permite às EBPs a inserção dos Resultados comprometidos nos PTF aprovados e das Justificações de Aquisição de Equipamento Tecnológico. A inserção de Processos de Aquisição de Equipamento Tecnológico é independente dos Resultados planeados no PTF, enquanto a inserção dos Resultados obriga à selecção prévia do Resultado comprometido.

Cada Resultado é um único ficheiro, num formato adequado à sua natureza, embora as EBPs adoptem preferencialmente o formato de folha de texto e.g. Microsoft Word ou PDF. Este último é especialmente usado, uma vez que permite a integração de vários documentos de vários formatos. Os vários estados de cada Resultado são:

- "Em curso": quando o Resultado está em período de realização;
- "Atrasado": quando a entrega do Resultado não é feita até ao último dia do mês comprometido no PTF aprovado;
- "Entregue": quando o Resultado aguarda verificação pelo Contacto GAD do Projecto;
- "A Corrigir": quando o Contacto GAD considera que o Resultado não está conforme a natureza, extensão, detalhe e qualidade do compromisso explícito no PTF;
- "Verificado": quando o Contacto GAD do Projecto considera que o Resultado está conforme a natureza, extensão, detalhe e qualidade do compromisso explícito no PTF. Este estado não é passível de alteração, implicando o fim do compromisso da EBP relativamente a esse Resultado.

Sempre que um Resultado é entregue, o SAVAD gera a correspondente notificação para a EBP e para o Contacto GAD dessa entrega, colocando o respectivo Resultado no estado de "Verificar".

O Contacto GAD do Projecto verifica então a qualidade do Resultado entregue, conforme PTF aprovado, colocando o Resultado num dos seguintes estados: "A Corrigir" ou "Verificado". No caso "A Corrigir", são inseridas as respectivas notas, sinalizando à EBP as sugestões de correcções a introduzir.

Cada Resultado pode ser colocado no Estado "A Corrigir", mais do que uma vez, enquanto que a decisão de "Verificado", implica o fim do processo de apresentação do Resultado, sendo a data dessa decisão identificada no SAVAD.

As funcionalidades para verificação dos Resultados estão disponíveis somente para o perfil associado ao GAD estando estabelecido o prazo limite de 5 dias para a análise do GAD.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SAVAD – Gestão Técnica por Projecto

A inserção do ficheiro de Resultado é feita numa área específica, onde existem as seguintes funcionalidades:

- "Inserir Ficheiro de Resultado": Inserção do ficheiro do Resultado através de um upload intuitivo e simplificado, sendo solicitada unicamente a introdução do nome do ficheiro e a respectiva localização. Estas funcionalidades estão disponíveis para as EBPs e para o GAD;
- "Histórico de Resultados Inseridos": Permite registar e visualizar o workflow de acções do GAD e das EBPs até à verificação final de cada Resultado, mantendo o histórico das versões entregues. Esta funcionalidade está disponível para as EBPs e para os respectivos contactos GAD que detém ainda a permissão de eliminação de ficheiros, apenas quando e formalmente requerido pelas EBPs;
- "Listagem das Notificações": Esta informação que está disponível para as EBPs e GAD, evidencia as notificações geradas pelo SAVAD. Estas notificações são geradas sempre que o Resultado se encontre em atraso ou sempre que existe uma mudança de estado dos Resultados. Estas notificações são geradas automaticamente pelo SAVAD e enviadas por e-mail e por SMS para a EBP e para o Contacto GAD do Projecto;

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

- "Inserir Notificação": Esta função só está disponível para o GAD e permite gerar uma notificação específica, alertando a EBP para uma qualquer situação relevante;

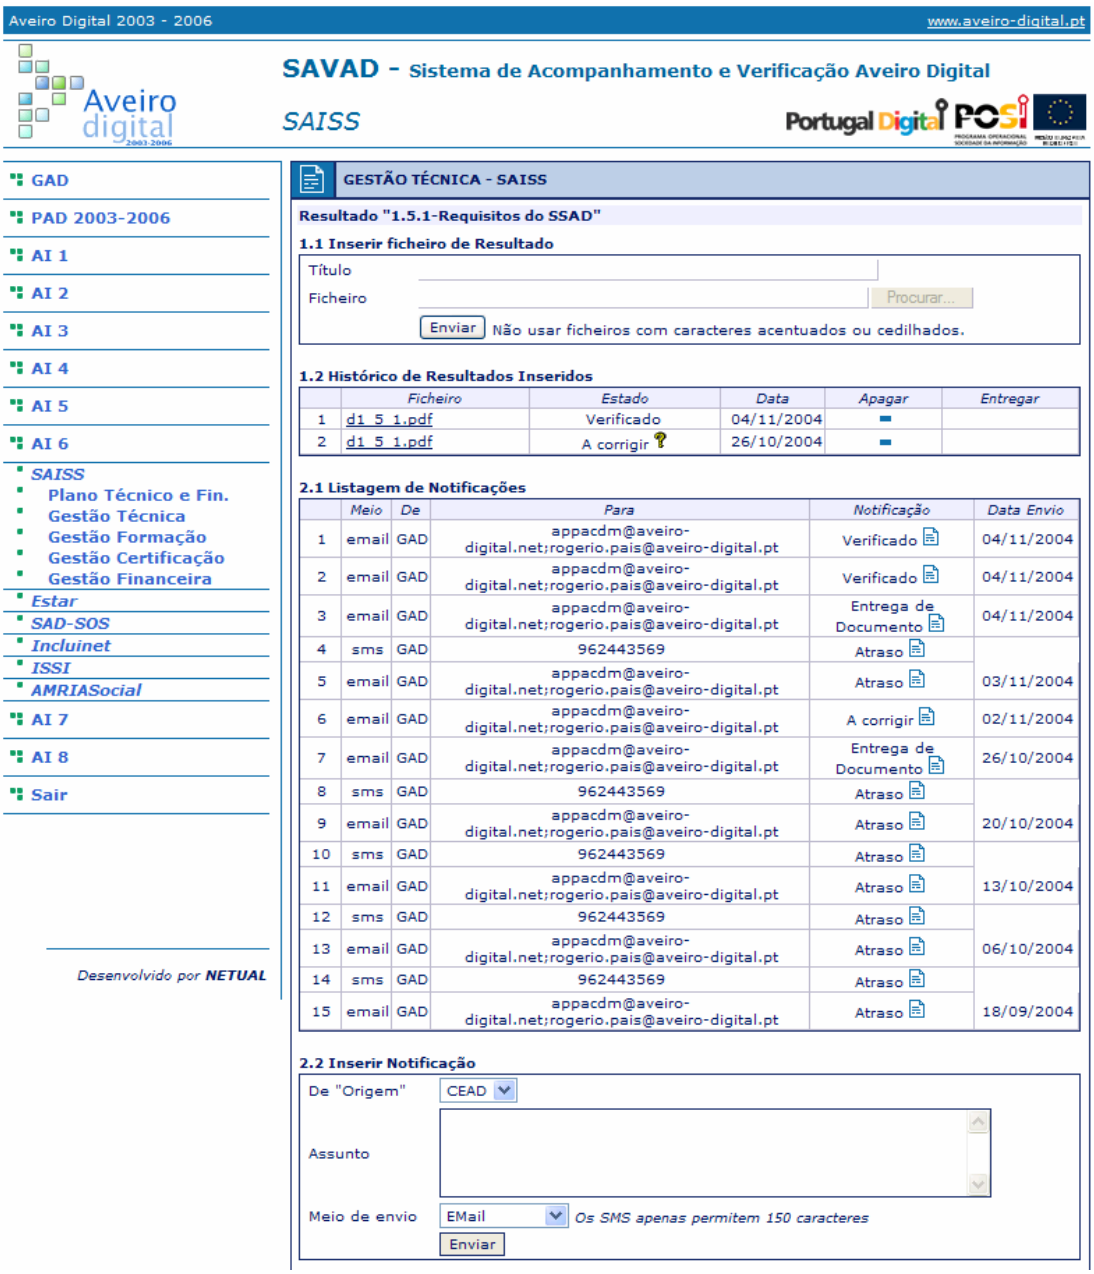

SAVAD – Gestão Técnica: Entrega de Resultados

Rede de Interlocutores AD

Durante o ano 2004 foi consolidada a rede de Interlocutores Aveiro Digital, através de reuniões informais e da comunicação regular, tendo estes sido convidados e estado

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

presentes em todas as iniciativas públicas do PAD. Os Interlocutores Aveiro Digital apoiaram ainda a divulgação e o desenvolvimento das iniciativas do Programa Aveiro Digital 2003-2006, a nível municipal, sendo de realçar o seu papel na implementação do Projecto 1.1 – EIAD, estimulando a adesão das autarquias locais do seu município.

2º Concurso Aveiro Digital 2003-2006

O 2º Concurso Aveiro Digital 2003-2006, aberto entre 15 de Fevereiro e 31 de Março de 2004, foi enquadrado pelo Regulamento de Acesso ao Programa Aveiro Digital 2003-2006 e respectivos anexos: i) Programa Aveiro Digital 2003-2006; ii) Formulário de Candidatura – Plano Técnico e Financeiro de Projecto – exclusivamente on-line e iii) Termo de Aceitação da Decisão de Aprovação.

Estes documentos foram publicados a 15 de Fevereiro de 2004 e disponibilizados em formato digital, através do site do PAD 2003-2006 em www.aveiro-digital.pt, criando-se uma área específica para acesso à documentação deste 2º Concurso, sem qualquer tipo de restrição.

O Formulário de Candidatura – Plano Técnico e Financeiro de Projecto, foi disponibilizado exclusivamente on-line e permitiu harmonizar e simplificar o procedimento de apresentação de Candidaturas ao PAD 2003-2006.

No âmbito do 2º Concurso Aveiro Digital foram recebidas 48 candidaturas no valor global de 7,84 M€, tendo sido aprovados, após avaliação, 32 Projectos, no valor global de 3,75 M€.

A avaliação das candidaturas decorreu de Abril a Setembro de 2004, tendo sido baseada na Metodologia de Selecção e Avaliação – 2º Concurso Aveiro Digital, que já tinha sido adoptada para o 1º Concurso Aveiro Digital, realizado em 2003. O Processo de avaliação contempla dois tipos de Análise: Quantitativa e Qualitativa, produzindo uma classificação sobre os 15 critérios previamente publicados no Regulamento de Acesso.

Todos os documentos associados ao 2º Concurso estão integrados no Relatório do 2º Concurso AD 2003-2006. (Anexo 07)

O Programa Aveiro Digital 2003-2006 atingiu, assim, durante o ano de 2004, a sua plena dimensão, uma vez que, além dos 6 Projectos da AI1, da responsabilidade directa da CEAD, estão a ser executados os 72 Projectos nas restantes Áreas de Intervenção, resultantes dos dois Concursos Aveiro Digital – 40 Projectos aprovados no âmbito do 1º Concurso e 32 no âmbito do 2º Concurso.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Apresentam-se em seguida as listas de Projectos em curso por Área de Intervenção, evidenciando o resultado mais relevante de cada Projecto, Duração, Entidade Beneficiária Principal e Orçamento associado à Medida 2.3:

Área de Intervenção 1 – Comunidade Digital

Projecto	Acrónimo	Resultado	Duração	EBP	Orçamento
1.1	eiad	Espaços Internet AD nos 11 Municípios e 95 freguesias da AMRia	48 Meses	CEAD	1.321.865€
1.2	sbad	Serviços aveiro-digital.pt e aveiro-digital.net	48 Meses	CEAD	100.000€
1.3	gacd	Gestão e Coordenação do PAD 2003-2006	48 Meses	CEAD	1.562.252€
1.4	markad	Acções de Marketing e Promoção do PAD 2003-2006	48 Meses	CEAD	400.000€
1.5	apad	Partilha de práticas e métodos com Outras Iniciativas similares	48 Meses	CEAD	50.000€
1.6	certicad	45.000 Certificações em Competências Básicas em TIC	48 Meses	CEAD	(Medida 1.1)
				Orçamento AI 1	**3.434.117€**

Área de Intervenção 2 – Autarquias e Serviços Concelhios

C.	P.	Acrónimo	Resultado	Duração	EBP	Orçamento
1º	2.1	sicavim	Sistema Integrado de Gestão Cadastral	36 Meses	CM Mira	448.985€
1º	2.2	sig.ria	Serviços SIG da Região da AMRia	36 Meses	AMRia	2.274.394€
2º	2.3	ambi-ria	Planos e SIG do Ambiente e da Água para a Região da AMRia	24 Meses	AMRia	413.950€
2º	2.4	mobi-Ria	Serviços para a Gestão do Tráfego Urbano e Inter-Modal	24 Meses	CM Aveiro	367.400€
2º	2.5	secur-Ria	Planos e SIG de Risco e Segurança para a Região da AMRia	24 Meses	AMRia	413.950€
1º	2.6	aei	Serviços de Back-office e Front-office das Câmaras Municipais	36 Meses	CM Águeda	337.500€
1º	2.6	sal-on line	Serviços de Back-office e Front-office das Câmaras Municipais	36 Meses	CM Albergaria-a-Velha	565.000€
1º	2.6	severinforma	Serviços de Back-office e Front-office das Câmaras Municipais	36 Meses	CM Vagos	112.500€
1º	2.6	vagosinforma	Serviços de Back-office e Front-office das Câmaras Municipais	36 Meses	CM Sever do Vouga	112.500€
2º	2.7	ria-on-line	Portal Regional da AMRia	24 Meses	AMRia	45.500€
					Orçamento AI2	**5.091.679€**

Área de Intervenção 3 – Escolas e Comunidades Educativas

C.	P.	Acrónimo	Resultado	Duração	EBP	Orçamento
1º	3.1	e-ria	Serviços de Gestão e Administração na Rede Escolar da AMRia	36 Meses	DREC - CAE de Aveiro	756.000€
1º	3.2	pormat	Curricula Digital e de E- Learning de Português e Matemática	36 Meses	DREC - CAE de Aveiro	269.500€
2º	3.3	professor	Serviços de Formação a Distância para Professores	24 Meses	DREC - CAE de Aveiro	115.200€
1º	3.4	e-cmei	Conselho Municipal de Educação de Ílhavo online	36 Meses	CM Ílhavo	119.250€
1º	3.4	ria.edu	Serviços *Online* para a Comunidade Educativa da AMRia	36 Meses	ACEAV	360.000€
					Orçamento AI3	**1.619.950€**

Área de Intervenção 4 – Universidade e Comunidade Universitária

C.	P.	Acrónimo	Resultado	Duração	EBP	Orçamento
1º	4.1	e-abs	Aquisição de Bens e Serviços em Ambiente Electrónico	36 Meses	Universidade de Aveiro	89.994€
1º	4.2	situa	Sist. Integrado de Tele-Trabalho para a Comunidade Universitária	36 Meses	Universidade de Aveiro	922.498€
1º	4.3	contactua	Sistema de Contacto e Interacção *Online* com a UA	36 Meses	Universidade de Aveiro	180.000€
1º	4.4	sinbad	Sistema Integrado para Biblioteca e Arquivo Digitais	24 Meses	Universidade de Aveiro	295.001€
2º	4.5	nartural	Produtos Pedagógicos para a Ciência através da Arte	24 Meses	Universidade de Aveiro	180.000€
1º	4.6	radical	Produtos Multimédia para a Aprendizagem Interactiva	36 Meses	Universidade de Aveiro	158.510€
					Orçamento AI4	**1.826.003€**

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Área de Intervenção 5 – Serviços de Saúde						
C.	**P.**	**Acrónimo**	**Resultado**	**Duração**	**EBP**	**Orçamento**
1º	5.3	rdsr	Serv. de Tele-Diagnóstico nos Hospitais e Centros Saúde da AMRia	24 Meses	ARS Centro – SRS Aveiro	773.913€
1º	5.4	rts	Portal Regional da Saúde com Serv. para o Utente e Prof. da Saúde	36 Meses	Hospital Infante D. Pedro	795.750€
					Orçamento AI5	**1.569.663€**

Área de Intervenção 6 – Solidariedade Social						
C.	**P.**	**Acrónimo**	**Resultado**	**Duração**	**EBP**	**Orçamento**
1º	6.1	saiss	Serviços de Gestão e Administração da Rede das IPSS da AMRia	36 Meses	APPACDM	644.000€
2º	6.2	estar	Centros e Serviços de Info-Inclusão	24 Meses	CerciMira	72.000€
2º	6.4	sad_sos	Serviços de Apoio a Idosos em Situações de Risco	24 Meses	S. C. Misericórdia Murtosa	38.700€
2º	6.5	incluinet	Centros e Serviços de Info-Inclusão	24 Meses	Solsil	99.900€
2º	6.5	issi	Centros e Serviços de Info-Inclusão	18 Meses	Cáritas Diocesanas Aveiro	128.250€
2º	6.8	amriasocial	Serviços de Oferta e de Procura de Solidariedade Social	24 Meses	Associação BETEL	104.750€
					Orçamento AI6	**1.087.600€**

Área de Intervenção 7 – Tecido Produtivo						
C.	**P.**	**Acrónimo**	**Resultado**	**Duração**	**EBP**	**Orçamento**
1º	7.1	geo-mkt	Serv. de Marketing das ZING- Zonas Industriais de Nova Geração	24 Meses	AIDA	124.315€
2º	7.3	tic & tu	Serviço de Informação Turística e de Reservas da Rota da Luz	24 Meses	R. Turismo Rota da Luz	146.598€
1º	7.4	geoInvest	Serviços SIG de Localização das ZING na Região da AMRia	24 Meses	AIDA	258.385€
1º	7.5	abs XXI	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Abril	24 Meses	Abril-Mob. Metálico, Lda	45.118€
1º	7.5	digivacas	Serviços de Back-office de Gestão e de Produção da EABL	32 Meses	Est. Apoio Bovin. Leiteira	92.620€
1º	7.5	e-ntl	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Netual	24 Meses	Netual, Lda	40.300€
1º	7.5	estag	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Estóragueda	24 Meses	Estorágueda, Lda	30.063€
1º	7.5	fig-net	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da FIG	24 Meses	FIG-Fáb. de Plásticos, Lda	29.594€
1º	7.5	hmc	Serv. de Gestão Doc. E de Processos de Clientes da HM	24 Meses	HM Consultores, Lda	80.600€
1º	7.5	inovortal	Serv. de Data-Center e de Marketing para as Empresas Associadas	24 Meses	Associação INOVA-RIA	90.300€
1º	7.5	marc	Serviços de Gestão da Produção Online da Empresa Marques	24 Meses	Marques, S.A.	131.221€
1º	7.5	onda	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da OndaVideo	12 Meses	OndaVideo, Lda.	142.300€
1º	7.5	red-aveiro	Serviços *Online* para a Rede de Jovens Empresas	36 Meses	ANJE	177.500€
1º	7.5	sani	Serv. Controlo e Gestão Integrada da Prod. e Stocks da Sanindusa	24 Meses	Sanindusa, S.A.	211.461€
1º	7.5	sipa	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da APA	27 Meses	APA-Adm. Porto Aveiro	30.1802€
1º	7.5	smia	Serviços de Informatização dos Processos de Produção da LP	12 Meses	LP, Lda	82.840€
1º	7.5	tup	Serv Gestão de Encom., Fabrico, Armazéns e Exped. Da TUPAI	30 Meses	Tupai, S.A	195.040€
2º	7.5	abdigital	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Abimota	14 Meses	Abimota	114.700€
2º	7.5	atlética	Serviços de Back-office e de Gestão da Produção da Atlética	8 Meses	Atlética Ibérica, Lda	51.050€
2º	7.5	braxen	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Braxen	12 Meses	Braxen, Lda	40.740€
2º	7.5	cadernodigital	Serviços de Back-office e de Edição On-line da Caderno Digital	7 Meses	Caderno Digital, Lda	45.024€
2º	7.5	com.web	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Audiodecor	12 Meses	AudioDecor, Lda	40.109€
2º	7.5	digipot	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da 5ª Potência	12 Meses	5ª Potência, Lda	44.508€
2º	7.5	e-si	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da HFA	12 Meses	HFA, Lda	54.000€
2º	7.5	extraplas	Serviços de Back-office de Gestão e de Produção da Madaleno	12 Meses	Madaleno, Lda	41.558€
2º	7.5	galileu-diag	Serv. de Diagnóstico e Gestão Formação da Activos e Recursos	12 Meses	Activos e Recursos, Lda	45.400€
2º	7.5	imagemXXI	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da UmaImagem	12 Meses	Uma Imagem, Lda	43.568€
2º	7.5	jfd	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Janeves	12 Meses	Janeves, Lda	44.577€
2º	7.5	semiar	Serviços de Back-office e de Edição On-line da Semiar	10 Meses	Semiar, Lda	41.200€
2º	7.5	uebe.SI	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Ponto.C.	12 Meses	Ponto.C, Lda	36.600€
2º	7.5	vlm-online	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da VLM Consultores	24 Meses	VLM Consultores, Lda	31.207€
2º	7.5	web-IVE	Serviços de Back-office e Gestão Integrada da IVE	12 Meses	IVE – Insp. Veículos, Lda	30.605€
					Orçamento AI7	**2.884.903€**

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Área de Intervenção 8 – Informação, Cultura e Lazer						
C.	**P.**	**Acrónimo**	**Resultado**	**Duração**	**EBP**	**Orçamento**
1º	8.1	bibria	Serv.on-line e de Arquivo Digital das Bibliotecas Região AMRia	24 Meses	CM Aveiro	297.189€
1º	8.1	infordico	Serv. on-line e Webização interna do Museu Marítimo de Ílhavo	24 Meses	CM Ílhavo	361.004€
1º	8.1	memdigital	Serviços on-line e Webização interna do Museu Egas Moniz	24 Meses	CM Estarreja	176.011€
1º	8.1	p@z	Serviços on-line e Arquivo Digital do Juizado de Paz da Murtosa	36 Meses	S. C. Misericórdia Murtosa	75.714€
2º	8.1	museave	Produtos e Serviços Pedagógicos para Pólos Museológicos	24 Meses	IPM – Museu de Aveiro	54.007€
2º	8.2	sigred	Serviços para a Gestão e Reserva de Recintos Desportivos	18 Meses	Associação Rededucativa	107.676€
1º	8.3	aad-ta	Academia de Artes Digitais	36 Meses	Teatro Aveirense	400.502€
1º	8.4	piar	Serviço Público de Informação via RDS	36 Meses	Cooperativa Terra Nova	629.750€
2º	8.4	adira	Serv. para Gestão e Promoção das Associações da Região AMRia	24 Meses	Soc. Recreio Artístico	289.740€
2º	8.4	ipjdigital	Serv. para Gestão e Promoção das Assoc. Juvenis da Região AMRia	24 Meses	IPJ – Aveiro	63.000€
2º	8.4	pomada	Serviços para a Gestão e Promoção da AAUA	24 Meses	Assoc. Académica da UA	31.500€
					Orçamento AI8	**2.486.093€**

2ª Sessão Pública de Apresentação Aveiro Digital

A Sessão Pública de Apresentação Aveiro Digital para a formalização dos Termos de Aceitação com os 32 novos Projectos, ocorreu em 20 de Dezembro de 2004, no Auditório do Parque de Exposições de Aveiro, com a presença do Sr. Gestor do POSI, Dr. Jaime Quesado e do Sr. Gestor da UMIC, Dr. Diogo Vasconcelos, tendo estado presentes 111 Entidades Beneficiárias. (Anexo 08)

2ª Sessão Pública de Apresentação Aveiro Digital – 20.12.04

Representação do Programa Aveiro Digital 2003-2006

Foi assegurada a representação da CEAD em diversas reuniões e iniciativas, promovidas quer pelo POSI, quer por outras entidades e decidida em função da natureza da missão e da disponibilidade dos seus membros.

No ano de 2004, a CEAD esteve representada nas iniciativas seguintes:

Iniciativa	Local de Realização	Data
Seminário Internacional *Semana da Banda Larga*	Lisboa	04-05.02.04
Workshop *Banda Larga para as Zonas Rurais e Periféricas*	Aveiro	27.02.04
Reunião com o Sr. Gestor do POSI – Guia Cidades e Regiões Digitais	Tagus Park, Oeiras	04.03.04
II Encontro Nacional dos Espaços Internet	Tagus Park, Oeiras	26.03.04
LanParty – Associação CyberClip	Gaf. Da Encarnação	27.03.04
Congresso da Ria	Aveiro	22-24.04.04

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Iniciativa (cont.)	Local de Realização	Data
Seminário na Área de Gestão Estratégica	Ílhavo	05.05.04
Inauguração do Espaço Internet AD da Freguesia de Esmoriz	Esmoriz	22.05.04
Inauguração do Espaço Internet AD da Freguesia de São Salvador	São Salvador	24.05.04
Programa INICIATIVA, RTP2	Lisboa	08.06.04
Programa Causas Comuns, RTP2	Lisboa	16.06.04
Inauguração do Espaço Internet de Paços de Ferreira	Paços de Ferreira	30.07.04
Inauguração do Espaço Internet AD da Freguesia de Ouca	Ouca	01.09.04
Inauguração do Espaço Internet AD da Freguesia de Canelas	Canelas	11.09.04
Workshop *Projecto Ria.EDU*	Aveiro	13.09.04
Sessão Comemorativa do 1º Aniversário do Jornal on-line Moliceiro.com	Mealhada	17.09.04
Inauguração do Espaço Internet AD da Freguesia de Albergaria-a-Velha	Albergaria-a-Velha	18.09.04
Inauguração do Espaço Internet AD da Freguesia da Branca	Branca	18.09.04
Inauguração do Espaço Internet AD da Freguesia de Salreu	Salreu	04.10.04
Inauguração do Espaço Internet AD da Freguesia da Palhaça	Palhaça	01.10.04
Fórum CYTED-IBEROEKA 2004 *Sociedade da Informação*	Lisboa	17-19.10.04
Workshop OCDE *O Desenvolvimento da Banda Larga em Áreas Rurais e Remotas*	Porto	25-26.10.04
Quinzena Temática *Tecnologias da Informação e da Comunicação*	São Bernardo	04.11.04
Reunião Cidades e Regiões Digitais	Pombal	16.11.04
Inauguração do EIAD da Freguesia de São João de Loure	São João de Loure	27.11.04
Inauguração do EIAD da Freguesia de Ribeira de Fráguas	Ribeira de Fráguas	28.11.04
Assinatura do Protocolo entre o IGP e as CMs de Mira, Vagos e Ílhavo	Mira	17.12.04
	Total:	**27 Iniciativas**

Inauguração EIAD da JF da Branca - 18.09.04

Workshop Ria.edu - 13.09.04

Iniciativas de Concertação

A Concertação Aveiro Digital enquadra as actividades de articulação dos 72 Projectos Aveiro Digital, promovendo a conjugação de esforços, a partilha de práticas e métodos e a promoção e divulgação dos seus resultados.

A Concertação tem uma natureza global enquadrando todos os Projectos e também por Área de Intervenção, dada a especificidade de cada sector e a maior eficiência da concertação quando os actores envolvidos pertencem ao mesmo segmento social e organizacional.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Em 2004, foram promovidas, a 1ª Reunião de Concertação com todos os Projectos Aveiro Digital, realizada a 28 de Julho (Anexo 09), e as primeiras Reuniões de Concertação por AI, realizadas em Novembro de 2004. (Anexo 10)

1ª Reunião de Concertação Aveiro Digital - 28.07.04

1ª Reunião de Concertação Aveiro Digital - 28.07.04

Avaliação Externa do PAD 2003-2006

O Programa Aveiro Digital 2003-2006 prevê, para o bom acompanhamento, monitoria e intervenção regular na sua condução global, a instalação de um Sistema de Avaliação Externa, que garanta também a avaliação dos impactos directos e indirectos no desenvolvimento social, cultural e económico na Região da AMRia.

Considerando que só no 4º trimestre de 2004, o Programa Aveiro Digital atingiu a sua plena dimensão, com a execução dos 78 Projectos AD, cobrindo todas as 8 Áreas de Intervenção, a Comissão Executiva Aveiro Digital decidiu, na sua 17ª Reunião do dia 21 de Setembro de 2004, lançar um convite a 6 Entidades nacionais de reconhecido mérito para apresentação de propostas de Serviços de Avaliação Externa. (Anexo 05)

A selecção da melhor proposta ocorrerá em Fevereiro de 2005, prevendo-se iniciar, ainda nesse mês, a instalação e operação do Sistema de Avaliação Externa do PAD 2003-2006.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

P 1.4 - Marketing e Promoção para ganhar a massificação

Este Projecto tem como objectivo principal a divulgação e promoção do Programa Aveiro Digital 2003-2006 e dos serviços implementados pelos vários Projectos deste Programa.

A regular comunicação pública ao longo das diferentes fases de execução do Programa Aveiro Digital e dos seus resultados é uma condição necessária para o estabelecimento de uma plataforma aberta e transparente para reforçar e expandir a rede de confiança social.

Neste âmbito, estão previstas várias campanhas de marketing e promoção do Programa Aveiro Digital e a organização de iniciativas concretas dirigidas a públicos-alvo específicos, nomeadamente o Festival Internet e o Fórum Aveiro Digital.

Estas iniciativas serão realizadas a partir de 2005, uma vez que só no último trimestre de 2004, o Programa Aveiro Digital 2003-2006 atingiu a sua plena operação, com a integração dos 32 novos Projectos Aveiro Digital aprovados no âmbito do 2º Concurso.

As principais actividades realizadas em 2004, no âmbito deste Projecto, foram as seguintes:

Produção dos Manuais "Ensina o Teu Computador: Manual só para miúdos"

Foi contratada à FCCN a produção de uma edição especial de 50.000 exemplares do Manual "Ensina o Teu Computador: Manual só para miúdos". Este manual, de formato adequado como apoio à formação básica em TIC, foi amplamente distribuído nos Espaços Internet Aveiro Digital, às Entidades Beneficiárias Principais do PAD 2003-2006 e ainda em iniciativas por estas promovidas.

A produção deste manual resultou da necessidade de promover massivamente a Certificação em Competências Básicas e de estimular a população em geral à aprendizagem e utilização das TIC, nomeadamente através dos Espaços Internet Aveiro Digital.

Este manual contempla na contracapa a referência do apoio do Programa Aveiro Digital 2003-2006 nesta edição, bem como os logótipos do PAD e das Entidades Financiadoras, de acordo com a regulamentação comunitária e nacional aplicável.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

"Dia do Coração" em Castanheira do Vouga

2ª Sessão Pública de Apresentação Aveiro Digital

Produção de Cartazes, Tarjas e Posters AD 2003-2006

Foram produzidos 2000 cartazes com as dimensões 500x700mm e 100 tarjas com as dimensões 600x1000mm, que são utilizados nos eventos promovidos pelo PAD e na identificação dos Espaços Internet Aveiro Digital, respectivamente.

Foram produzidos 60 Posters de tamanho A0 (1189x841mm), para divulgação e promoção do Programa Aveiro Digital 2003-2006, tendo sido afixados no local de exposição da Conferência Internacional "Semana da Internet – Portugal em Banda Larga" organizado pela UMIC, no Congresso da Ria promovido pela AMRia, na Sessão de Apresentação dos Projectos do 2° Concurso, e ainda distribuídos aos Interlocutores Aveiro Digital, ao POSI e à UMIC.

Todos estes materiais apresentam a imagem do Programa Aveiro Digital 2003-2006, contemplando em local visível e destacado a referência às entidades financiadoras de acordo com a regulamentação comunitária e nacional aplicável. (Anexo 11)

2ª Sessão Pública de Apresentação Aveiro Digital

2ª Sessão Pública de Apresentação Aveiro Digital

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Produção de Autocolantes AD 2003-2006

Foram produzidos 20.000 autocolantes, com as dimensões 31x31mm, distribuídos por todos os Projectos do Programa Aveiro Digital 2003-2006, para identificação dos equipamentos adquiridos. (Anexo 11)

Produção de Bonés e T-shirts AD 2003-2006

Em 2004 e no âmbito das actividades de divulgação do Programa Aveiro Digital 2003-2006, foram produzidos 5.000 bonés e 5.000 t-shirts, em diferentes cores e tamanhos, conforme formato similar adoptado em 2003.

O formato adoptado para a distribuição destes materiais incidiu fundamentalmente em iniciativas que envolveram crianças, jovens e idosos, promovidas pelos Municípios e Juntas de Freguesia da região da AMRia e ainda nos Espaços Internet Aveiro Digital.

Elevação de Oliveira do Bairro a Cidade - 1.º Aniversário

Dia dos Avós - CM Aveiro

Distribuição do Material Promocional Aveiro Digital

Os materiais de divulgação e promoção Aveiro Digital foram massivamente distribuídos pela população da Região da AMRia, com especial incidência nos utilizadores dos Espaços Internet Aveiro Digital e em iniciativas Municipais e das Juntas de Freguesia que envolveram crianças, jovens e idosos.

Nesta tarefa, contou-se com a colaboração dos Interlocutores Aveiro Digital que canalizaram os pedidos destes materiais ao GAD para validação das quantidades a distribuir.

De forma a contribuir para a info-inclusão dos participantes nas iniciativas, foi ainda oferecido a cada um dos participantes nas iniciativas, o Manual "Ensina o Teu Computador: Manual só para Miúdos", contendo um convite à frequência dos EIAD existentes no município.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Foram inúmeros os eventos e iniciativas promovidas durante o ano de 2004 pelos diversos agentes de desenvolvimento da região da AMRia e pelo próprio Programa Aveiro Digital, que utilizaram materiais de promoção Aveiro Digital, tendo sido divulgada de forma massiva a imagem do Programa Aveiro Digital 2003-2006 junto de toda a população:

Dia Europeu sem Carros

Campo de Férias "Verão a Abrir"

Data	Iniciativa	Organização	Materiais Aveiro Digital									
			Bonés	T-shirts	Manual Ensina o Teu Computador	Cartazes	Tarjas	Posters	Programas	Pastas	Autocolantes	Suplemento Diário Aveiro
Fev/04	Equipa de Futebol	CM Aveiro		12								
Mar/04	Convívio Lan Party	Associação Cyberclip	50	50								
Abr/04	Actividades da Comunidade Escolar	Centro de Área Educativa de Aveiro								100		
Abr/04	Reunião Abertura EIAD 1ª Fase	PAD 2003-2006	725	58	12004	290	29		189		3450	
Abr/04	Congresso da Ria de Aveiro	AMRia	500					3	500			
Mai/04	Abertura Espaço Internet São Salvador	PAD 2003-2006		25								
Jun/04	Ciclo Turísmo	JF Travassô	550		550							
Jun/04	Campo de Férias Escolas 2º e 3º Ciclos de Eixo	Pelouro Juventude CM Aveiro	116	116								
Jul/04	Net Party	Associação Cyberclip	100	100								
Jul/04	Dia dos Avós	CM Aveiro	524	524	500							
Jul/04	1ª Reunião Concertação	PAD 2003-2006	118	133	130							150
Jul/04	Abertura Espaço Internet Murtosa	PAD 2003-2006	55	56								
Jul/04	Reunião Abertura EIAD 2ª Fase	PAD 2003-2006	550	44	4400	220	22		110		2200	160
Ago/04	IV Milha Noct. Praia Vagueira	CM Vagos / GRECAS	200	200	200							
Ago/04	1º Aniversário Elevação Oliveira do Bairro a Cidade	CM Oliveira do Bairro	300	300	300							
Ago/04	Ocupação Tempos Livres	CM Sever Vouga	60	60	60							
Ago/04	Actividades Univ. Aveiro	Universidade Aveiro	100	100	500							
Ago/04	Campo Férias "Verão a Abrir"	CM Aveiro	30	30	30							
Ago/04	Domingos em Movimento	CM Estarreja	550	550	550							
Set/04	Feira Internacional do Idoso	CM Águeda	900	900	900							

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Data	Iniciativa (Cont.)	Organização	Materiais Aveiro Digital									
			Bonés	T-shirts	Manual Ensina o Teu Computador	Cartazes	Tarjas	Posters	Programas	Pastas	Autocolantes	Suplemento Diário Aveiro
Set/04	Dia Europeu sem carros	Agrupamento de Escolas/CM Aveiro	100	100	100							
Set/04	Dia Mundial do Coração	JF Castanheira do Vouga	50	50	50							
Out/04	Convívio de Pesca	Taberna Marilena Alb-a-Velha	21	21	21							
Out/04	Actividades de Formação Ria.EDU	Consórcio Ria.EDU			2000							
Out/04	Expressão, Educação Físico Motora	CM Ílhavo		1400	2000							
Out/04	12º Gr. Prémio Atletismo	Rádio Terra Nova	250	250	250							
Out/04	Abertura Academia dos Saberes	Academia dos Saberes/CM Aveiro			100					100		
Nov/04	Gr. Prémio Atletismo de Eixo	Associação de Jovens de Eixo	500	54	500							
Dez/04	Torneio Jovens Basquetebol	Secção de Basquetebol do Beira-Mar		10	50							
Dez/04	Sessão Apresentação dos Projectos 2º Concurso	PAD 2003-2006			2176	460		42			700	176
Dez/04	Reunião Abertura EIAD 3ª Fase	PAD 2003-2006	350	25	3000	150	15		75		750	95
		Total	**6699**	**5168**	**30371**	**1120**	**66**	**45**	**874**	**200**	**7100**	**581**

www.aveiro-digital.pt

O site do PAD 2003-2006 foi regularmente actualizado ao longo do ano de 2004, com toda a informação relativa às actividades desenvolvidas. Procedeu-se à sua reorganização adequando-a ao actual período de desenvolvimento do Programa Aveiro Digital, com a inclusão dos 32 Projectos aprovados no 2º Concurso, possibilitando a todos os seus utilizadores um acesso directo e contextualizado aos documentos e às diferentes etapas da actividade desenvolvida.

Assim, o site apresenta em destaque o Programa Aveiro Digital 2003-2006, os 72 Projectos aprovados no 1º e 2º Concurso AD 2003-2006 e os documentos relevantes produzidos pelo POSI e pela UMIC para as Cidades e Regiões Digitais, tendo-se registado uma média de 172 mil acessos mensais, no ano 2004.

O site www.aveiro-digital.pt é um instrumento fundamental de comunicação e divulgação do desenvolvimento do Programa, das iniciativas e dos resultados já realizados, nomeadamente os 90 Espaços Internet Aveiro Digital em operação na Região da AMRia.

São ainda destacadas no site, as notícias relevantes publicadas nos OCS sobre o Programa e os seus 78 Projectos actualmente em curso.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Notícias Aveiro Digital em www.aveiro-digital.pt

Promoção e divulgação na Comunicação Social

Para que os órgãos de comunicação social tenham conhecimento atempado sobre as iniciativas Aveiro Digital 2003-2006, foram antecipadamente enviados Press Releases aos OCS, sobre cada uma dessas iniciativas. Do tratamento desta informação pelos órgãos de comunicação social, bem como da cobertura das iniciativas que estes fazem, resultaram várias notícias nos órgãos de comunicação locais, regionais e nacionais. (Anexo 12)

Campanha publicitária 2º Concurso

Foi desenvolvida uma campanha publicitária em rádios e jornais, tendo como objectivo divulgar massivamente a abertura do 2º Concurso Aveiro Digital 2003-2006. A selecção dos rádios e jornais teve em conta a abrangência territorial de cada um deles, garantindo-se que a sua combinação, tanto ao nível das rádios como dos jornais, cobrisse a totalidade da região da AMRia.

Neste âmbito, foram seleccionadas 6 rádios em diferentes Municípios da AMRia, tendo a campanha decorrido de 16 de Fevereiro a 4 Março de 2004. No que se refere à imprensa, foram seleccionados 11 jornais de 10 municípios diferentes da região da

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

AMRia, bem como um Jornal de distribuição nacional – Jornal de Notícias. A promoção do 2º Concurso Aveiro Digital 2003-2006 nos jornais decorreu de 13 de Fevereiro a 12 de Março de 2004. Na secção 2.1 do Relatório do 2º Concurso Aveiro Digital encontra-se uma descrição detalhada do processo desta divulgação. (Anexo 07)

Divulgação da iniciativa "IRS na Internet"

Foi desenvolvida uma campanha publicitária em rádios e jornais, tendo como objectivo divulgar a iniciativa "IRS na Internet" que decorreu nos Espaços Internet Municipais da Região da AMRia. A selecção dos rádios e jornais teve em conta a abrangência territorial de cada um deles, garantindo a cobertura da região da AMRia.

Neste âmbito, foram seleccionadas 6 rádios em diferentes Municípios da AMRia, tendo a campanha decorrido de 29 de Fevereiro a 14 Março de 2004. No que se refere à imprensa, foram seleccionados 9 jornais de municípios diferentes da região da AMRia. A promoção desta iniciativa nos jornais decorreu de 3 de Março a 12 de Março de 2004. No Relatório da Iniciativa IRS na Internet encontra-se uma descrição detalhada do processo desta divulgação. (Anexo 04)

Edição no Diário de Aveiro do Suplemento Aveiro Digital 2003-2006

O Diário de Aveiro, jornal de distribuição local e regional, procedeu à edição de 1000 exemplares de um suplemento em regime de exclusividade com o Programa Aveiro Digital 2003-2006, composto por 12 páginas, dando destaque às actividades desenvolvidas por alguns Projectos representativos das oito Áreas de Intervenção do Programa Aveiro Digital 2003-2006. Neste suplemento, foi ainda publicada uma entrevista com a Comissão Executiva Aveiro Digital e uma extensa publicitação dos Espaços Internet Aveiro Digital. Esta publicação foi associada à realização da 1ª Reunião de Concertação, como um instrumento de divulgação dos Projectos em curso. (Anexo 13)

Produção e realização de imagens

No âmbito deste Projecto, foram produzidas e recolhidas imagens de vídeo e fotografias, com o objectivo de documentar todas as actividades realizadas e promovidas pelo Programa Aveiro Digital em 2004. Na Sessão de Apresentação dos Projectos do 2º Concurso do Programa Aveiro Digital 2003-2006, procedeu-se à captura de imagens vídeo em formato profissional DVCAM digital e produção de 100 fotografias em formato digital. As restantes iniciativas contaram com a colaboração das entidades envolvidas nas suas organizações, tendo-lhes sido solicitado a apresentação de fotografias em formato digital que evidenciem a utilização dos materiais promocionais Aveiro Digital.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Apresenta-se de seguida uma selecção de fotos referentes aos diversos eventos:

1º Reunião de Concertação Aveiro Digital

2ª Sessão Pública de Apresentação Aveiro Digital

Campo de Férias "Verão a Abrir"

Sessão de Abertura - Academia dos Saberes

"Dia do Coração" em Castanheira do Vouga

Elevação de Oliveira do Bairro a Cidade - 1.º Aniversário

Campo de Férias - Escolas 2º e 3º Ciclos de Eixo

Ocupação de Tempos Livres - CM Sever Vouga

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Apresentações do Programa e Projectos AD 2003-2006

Em 2004, e com o objectivo de divulgar amplamente o Programa Aveiro Digital e a sua execução, realizaram-se várias apresentações do Programa e dos Projectos Aveiro Digital (Anexo 14):

Iniciativa	Local de Realização	Data
Workshop *Banda Larga para as Zonas Rurais e Periféricas*	Aveiro	27.02.04
II Encontro Nacional de Espaços Internet	Tagus Park, Oeiras	26.03.04
Congresso da Ria 2004	Aveiro	22-24.04.04
Seminário na Área de Gestão Estratégica	Ílhavo	05.05.04
Programa Causas Comuns "A Sociedade de Informação-Pilar da Cidadania" RTP 2	Lisboa	16.06.04
Programa INICIATIVA "Redes de Conhecimento" na RTP 2	Aveiro	19.06.04
Inauguração EIAD de Paços de Ferreira	Paços de Ferreira	30.07.04
Sessão Comemorativa do 1º Aniversário do Jornal on-line Moliceiro.com	Mealhada	17.09.04
Quinzena Temática Tecnologias da Informação e da Comunicação	São Bernardo	04.11.04

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

P 1.5 - Aprender e Partilhar Aveiro Digital

No Projecto Aprender e Partilhar Aveiro Digital contemplam-se actividades de partilha e divulgação de âmbito nacional e internacional das metodologias e resultados associados ao Programa Aveiro Digital 2003-2006, enquadradas em iniciativas para a promoção do desenvolvimento da SI.

O Projecto Aprender e Partilhar Aveiro Digital centra-se na troca de experiências com outras iniciativas semelhantes, podendo levar ao estabelecimento de parcerias, quer a nível nacional, quer a nível internacional.

Assim, pretende-se identificar e seleccionar iniciativas, com elevada pertinência no âmbito das cidades e regiões digitais, perspectivando-se mesmo a colaboração em iniciativas concretas, bem como ao estabelecimento de parcerias, nomeadamente, com entidades nacionais e internacionais envolvidas em processos semelhantes.

As principais actividades realizadas em 2004, no âmbito deste Projecto, foram as seguintes:

Apresentações AD 2003-2006

Em 2004, realizaram-se várias apresentações do Programa Aveiro Digital 2003-2006 (Anexo 14):

Iniciativa	Local de Realização	Data
Workshop Banda Larga para as Zonas Rurais e Periféricas	Aveiro	27.02.04
II Encontro Nacional dos Espaços Internet	Tagus Park, Oeiras	26.03.04
Congresso da Ria 2004	Aveiro	22-24.04.04
Aula *Factores Críticos na Gestão de Projectos*	FEUP, Porto	29.04.04
Seminário na área de Gestão Estratégica	Ílhavo	05.05.04
Inauguração do Espaço Internet de Paços de Ferreira	Paços de Ferreira	30.07.04
Sessão Comemorativa do 1º Aniversário do Jornal on-line Moliceiro.com	Mealhada	17.09.04
Quinzena Temática Tecnologias da Informação e da Comunicação	São Bernardo	04.11.04
Reunião com a HP Europa	Aveiro	16.12.04

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

II Encontro Espaços Internet

Congresso da Ria 2004

O Programa Aveiro Digital 2003-2006 foi convidado para participar em dois programas televisivos, ambos na RTP 2: O Programa Causas Comuns e o Programa Iniciativa.

O Programa Causas Comuns, emitido pela RTP 2 no dia 16 de Junho, convidou a Comissão Executiva do Programa Aveiro Digital 2003-2006, para participar numa emissão subordinado ao tema "A Sociedade de Informação – Pilar da cidadania", juntamente com o Eng. Roberto Carneiro (Observatório da Inovação e Conhecimento", o Prof. Paulo Serra (Universidade da Beira Interior) e o Eng. Norberto Fernandes (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações).

O Programa Iniciativa, subordinado ao tema "Redes de Conhecimento", transmitido pelo na RTP 2, no dia 19 de Junho dedicou parte do seu conteúdo ao Programa Aveiro Digital 2003-2006 através de uma entrevista à Comissão Executiva e a gravações sobre o Projecto Espaços Internet Aveiro Digital, tendo recolhido as imagens no Espaço Internet Municipal de Vagos e o Projecto PIAR. (Anexo 15)

Genérico do Programa Iniciativa

Entrevista à CEAD

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

EIAD do Município de Vagos

Projecto PIAR

Participação em Conferências, Fóruns e *Workshops*

A Comissão Executiva Aveiro Digital, a convite da UMIC, esteve presente na Conferência Internacional, integrada na Semana da Banda Larga, realizada no Estoril nos dias 4 e 5 de Fevereiro. A Comissão Executiva também se fez representar no Fórum CYTED IBEROEKA "Sociedade da Informação na Região Ibero-americana", realizado em Lisboa nos dias 18 e 19 de Outubro e no "Workshop on Developing BroadBand Access in Rural and Remote Areas" organizado pela OCDE, realizado no Porto nos dias 25 e 26 de Outubro.

Participação noutras iniciativas

O Programa Aveiro Digital 2003-2006 fez-se representar na LanParty, organizada pela Associação CyberClip, realizada na Gafanha da Encarnação, Ílhavo, no dia 27 de Março, promovendo iniciativas com o objectivo de promover a utilização das TIC nas camadas jovens da população.

LanParty da Associação CyberClip

LanParty da Associação CyberClip

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Publicações

Durante o ano de 2004, algumas publicações solicitaram ao Programa Aveiro Digital 2003-2006 informações sobre a sua execução, para redigir matérias a incluir nas suas edições.

Assim, o Programa Aveiro Digital 2003-2006 é referido na edição nº 150, de Abril, da Revista Comunicações, editada pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. (Anexo 16)

A Media XXI - Revista da Comunicação e Sociedade da Informação refere o Programa Aveiro Digital 2003-2006 na sua edição nº 78, de Novembro/ Dezembro numa matéria denominada "Dossier: Cidades e Regiões Digitais". (Anexo 17)

No seguimento do Fórum Administração Pública Local, organizado pela Revista Interface, realizado em Aveiro, em 2 de Outubro de 2003, foi elaborada uma publicação editada em 2004 e denominada "Cidades e Regiões Digitais: o essencial" onde é focado o Programa Aveiro Digital 2003-2006. (Anexo 18)

Enquadramento a estudos, mestrados e doutoramentos

Dadas as inúmeras solicitações no sentido de utilizar o Programa Aveiro Digital 2003-2006 como caso estudo para trabalhos de âmbito académico, a CEAD aprovou o seu enquadramento (Anexo 19) estabelecendo os termos de cooperação para este apoio.

Em 2004 foi prestado apoio à Licenciada Célia Cavaleiro, no âmbito da sua Dissertação de Mestrado, subordinada ao tema "A Sociedade da Informação e o Território: das Cidades Digitais ao Portugal Digital – os casos de Aveiro Digital e Trás-os-Montes Digital" - Mestrado em Geografia e Planeamento Regional e Urbano da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, orientada pelo Prof. Doutor Jorge Gaspar. (Anexo 20)

Também foi prestado apoio a Flávio Nunes, do Departamento de Geografia da Universidade do Minho, para a elaboração do artigo "Lessons learned from the Portuguese Digital Cities implementation process", apresentado na "International Conference CITY FUTURES", University of Illinois - College of Urban Planning and Public Affairs, realizada em Chicago, 08-10.07.2004. (Anexo 21)

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

P 1.6 – Serviço de Certificação em Competências Básicas nas TIC

O Projecto P 1.6 – Serviços de Certificação em Competências Básicas nas TIC tem como objectivo principal a gestão dos Serviços de Certificação em Competências Básicas nas TIC, de acordo com o D.L. 140/2001, respeitando as orientações e modelo de execução aprovado pela CEAD.

De acordo com os compromissos assumidos no P2003-2006, contratualizados com o POSI através da Medida 1.1, pretende-se atingir 45.000 certificações em Competências Básicas nas TIC.

Estão já comprometidas 25.272 certificações através dos 72 Projectos Aveiro Digital, actualmente em curso.

As restantes 19.728 CCBTIC serão executadas através das Iniciativas Horizontais baseadas na rede dos 11 EIAD Municipais a operar na Região da AMRia. (Ver P 1.1)

Foi mandatório para as candidaturas ao Programa Aveiro Digital 2003-2006 realizadas no âmbito dos dois Concursos Aveiro Digital a indicação do número de certificações em competências básicas a realizar em cada um dos Projectos.

Assim, os 72 Projectos aprovados no âmbito dos dois Concursos Aveiro Digital contemplam 25.272 certificações em competências básicas nas TIC, mostrando o quadro seguinte o número de certificações comprometido por Área de Intervenção:

Área de Intervenção	Total
AI 2	3.784
AI 3	6.240
AI 4	10.000
AI 5	385
AI 6	568
AI 7	1.855
AI 8	2.440
Total	**25.272**

A CEAD, na sua 17ª reunião, tendo em conta a legislação que regula o Processo de Certificação em Competências Básicas nas TIC, aprovou o Modelo de Execução da Medida 1.1 e seleccionou como Entidades Credenciadas para a Certificação das Competências Básicas nas TIC, no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003-2006, um conjunto de Entidades Beneficiárias que reúnem as condições necessárias para prestarem serviços de certificação, de acordo com a legislação aplicável.

A execução deste Projecto é objecto de descrição detalhada no Relatório de Progresso Material e Financeiro – 2004 da Medida 1.1.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 2: AUTARQUIAS E SERVIÇOS CONCELHIOS

Introdução

Nesta Área de Intervenção foram aprovados 10 Projectos, envolvendo as 11 Câmaras Municipais da Região da AMRIa e a Associação de Municípios da Ria. Os Projectos em execução são fundamentais para a modernização dos serviços das autarquias em áreas tão distintas como a modernização administrativa, o planeamento e ordenamento do território, a gestão do cadastro, o ambiente, a mobilidade e a segurança. Participam na execução 51 Pessoas, com um volume de trabalho de 837HM. Ao nível da execução material, foram já verificados 31 Resultados documentais.

P 2.1.Cadastros Predial Rústico e Urbano Digital

SICAVIM, Refª PAD 017

Este Projecto registou alguns atrasos iniciais tendo em conta o PTF aprovado, mas que estão a ser recuperados, justificados por só a 17.12.04 ter formalizado a colaboração com o IGP – Instituto Geográfico Português para a disponibilização do cadastro de Ilhavo e Vagos, e aprendizagem das melhores práticas para a implementação de um sistema de gestão de informação cadastral a nível nacional pelo IGP. A execução financeira atingiu os 15.113 €, o que corresponde a 6% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

P 2.2.SIG / Região da Ria de Aveiro

SIGRia, Refª PAD 001

Este Projecto está a decorrer de acordo com o PTF aprovado, tendo realizado o diagnóstico da situação existente ao nível dos SIGs na Região da AMRia, a concepção do respectivo sistema de informação geográfica, adquirido e instalado o equipamento e software SIG e de cartografia nas 11 Câmaras Municipais e na AMRia. A execução financeira atingiu os 1.049.794 €, o que corresponde a 73% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

P 2.3.Sistemas de Gestão Ambiental

Ambi-Ria, Refª PAD 140

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como Resultado final a realização de Planos e SIG do Ambiente e da Água para a Região da AMRia, tendo já iniciado a sua execução material em 14.12.04, podendo o seu PTF ser consultado no SAVAD.

P 2.4.Sistemas Integrados de Mobilidade

Mobi-Ria, Refª PAD 138

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como Resultado final a realização de Serviços para a Gestão do Tráfego Urbano e Inter-modal, estando o início da sua execução material previsto para 01.01.05, podendo o seu PTF ser consultado no SAVAD.

P 2.5.Serviços de Segurança e Protecção Civil

Secur-Ria, Refª PAD 101

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como Resultado final a realização de Planos e SIG de Risco e Segurança para a Região da AMRia, tendo já iniciado a sua execução material em 14.12.04, podendo o seu PTF ser consultado no SAVAD.

P 2.6.Administração Local para o Cidadão

AEI, Refª PAD 020

Este Projecto regista alguns atrasos, tendo em conta o PTF aprovado, tendo sido já adquirido equipamento para a CM de Águeda, identificado e especificado os serviços e as aplicações a integrar, adjudicado as Intranets para as 3 CMs envolvidas. A execução financeira atingiu os 35.828 €, o que corresponde a 18% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

Sal-On-Line, Refª PAD 016

Este Projecto está a decorrer de acordo com o PTF aprovado, tendo sido adquirido, instalado e configurado todo o equipamento, bem como o software de e-mail, iniciado a harmonização de processos e requerimentos, especificado e adjudicado os serviços e

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

as aplicações. A execução financeira atingiu os 298.806 €, o que corresponde a 75% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

SeverInforma, Refª PAD 023

Este Projecto registou alguns atrasos iniciais tendo em conta o PTF aprovado, mas que estão a ser recuperados, tendo adquirido a quase totalidade do equipamento, iniciado a harmonização de processos e requerimentos, especificado e adjudicado serviços e aplicações, incluindo a Intranet de serviços. A execução financeira atingiu os 50.540 €, o que corresponde a 76% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

VagosInforma, Refª PAD 018

Este Projecto regista atrasos na sua execução, tendo em conta o PTF aprovado, devido à mudança de instalações da CM de Vagos, tendo já adquirido a quase totalidade do equipamento, iniciado a harmonização de processos e requerimentos, adjudicado e instalado redes, serviços e aplicações. A execução financeira atingiu os 58.867 €, o que corresponde a 89% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

P 2.7. Portal de Serviços da Administração Local

Ria-On-line, Refª PAD 141

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como Resultado final a realização do Portal Regional da AMRia, estando o início da sua execução material previsto para 02.01.05, podendo o seu PTF ser consultado no SAVAD.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 3: ESCOLAS E COMUNIDADES EDUCATIVAS

Introdução

Nesta Área de Intervenção foram aprovados 5 Projectos, envolvendo 74 Entidades Beneficiárias. Participam na execução 31 Pessoas com um volume de trabalho de 290 HM. Já estão verificados 36 Resultados Documentais e como factor a realçar destaca-se a participação da comunidade educativa: alunos, pais, encarregados de educação, professores e funcionários.

P 3.1.Serviços de Gestão e Administração da Rede Escolar

e-RIA, Refª PAD 060

Depois de algum atraso inicial, este Projecto já recuperou e está a decorrer de acordo com o PTF, tendo já executado o diagnóstico e inventariação das necessidades de rede, hardware e software; elaborados os cadernos de encargos; instalado parcialmente a rede nas escolas parceiras. A execução financeira atingiu os 216.558 €, o que corresponde a 49% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

P 3.2.Curricula Digital

PorMat, Refª PAD 067

Este Projecto está decorrer com algum atraso relativamente ao PTF, tendo já realizado um seminário - "O Desafio Digital"; os cadernos de encargos dos módulos a desenvolver; a especificação e guião de conteúdos de Português e contratação dos recursos humanos para elaboração dos mesmos. A execução financeira atingiu os 26.228 €, o que corresponde a 30% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

P 3.3.Serviços de Formação à Distância de Professores

Professor, Refª PAD 145

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso, tem como resultado final Serviços de Formação à Distância para Professores, já iniciou a execução material a 02.12.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

P 3.4.Expansão e Consolidação das Comunidades Educativas

e-CMEI, Refª PAD 022

Este Projecto está decorrer com algum atraso relativamente ao PTF, tendo identificado as funcionalidades e requisitos do sistema, adquirido e instalado parte do equipamento. A execução financeira atingiu os 40.355 €, o que corresponde a 51% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

Ria.EDU, Refª PAD 006

Este Projecto está decorrer com algum atraso relativamente ao PTF, tendo executado o Modelo Comunicacional, a arquitectura e especificação dos Serviços Básicos e Complementares, aquisição e instalação do equipamento. A execução financeira atingiu os 169.258 €, o que corresponde a 89% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 4: UNIVERSIDADE E COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

Introdução

Nesta Área de Intervenção foram aprovados 6 Projectos, envolvendo 1 Entidade Beneficiária. Participam na execução 57 Pessoas com um volume de trabalho de 182 HM. Já estão verificados 44 Resultados Documentais e como factores a realçar destacam-se a abrangência e complexidade dos Projectos em curso e a qualidade dos resultados apresentados.

P 4.1.Sistemas para a Gestão de Aquisição de Bens e Serviços

e-ABS, Refª PAD 008

Este Projecto encontra-se com algum atraso relativamente ao PTF, estando em fase de finalização e entrega do Documento de especificação de requisitos. A execução financeira atingiu os 4.293 €, o que corresponde a 10% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

P 4.2.Teletrabalho

SITUA, Refª PAD 009

Este Projecto encontra-se em atraso relativamente ao PTF aprovado, nomeadamente na Monitorização e gestão remota de sistemas e serviços informáticos, tendo já efectuado a aquisição de parte do equipamento e de desenvolvimento de software. A execução financeira atingiu os 243.417 €, o que corresponde a 57% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

P 4.3. Contact-Ciência

ContactUA, Refª PAD 010

Este Projecto está decorrer com um ligeiro atraso em relação ao calendarizado no PTF, tendo sido já definidos os Perfis de Utilizadores e o Serviço Noticioso, bem como parte da Formação prevista. A execução financeira atingiu os 53.089 €, o que corresponde a 69% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

P 4.4. Biblioteca Digital da UA

SInBAD, Refª PAD 012

Este Projecto está decorrer de acordo com o PTF, tendo já executado as especificações e arquitectura dos sistemas de Biblioteca Digital e de Arquivo Digital. A execução financeira atingiu os 85.413 €, o que corresponde a 51% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

P 4.5. ArteDigital

Nartural, Refª PAD 108

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso, tem como resultado final Produtos Pedagógicos para a Ciência através da Arte, estando o início da sua execução material previsto para 02.01.05 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

P 4.6. Produção Multimédia para a Formação Profissional e Educação

RAdIcal, Refª PAD 014

Este Projecto está decorrer de acordo com o PTF, com bastante trabalho de base já executado, nomeadamente grafismo, desenho, estrutura e desenvolvimento de alguns Módulos, bem como criação e introdução de conteúdos científicos. A execução financeira atingiu os 31.735 €, o que corresponde a 55% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 5: SERVIÇOS DE SAÚDE

Introdução

Nesta Área de Intervenção foram aprovados 2 Projectos, envolvendo 17 Entidades Beneficiárias. Participam na execução 19 Pessoas com um volume de trabalho de 132 HM. Já estão verificados 8 Resultados Documentais e como factor a realçar destaca-se a representação de todos os Hospitais e Centros de Saúde da região.

P 5.3.Serviços de Diagnóstico Remoto

RDSR, Refª PAD 039

Este Projecto, apesar de enfrentar algumas dificuldades na instalação das redes, tarefa da responsabilidade do IGIF, apresenta uma execução técnica de acordo com o previsto, tendo já iniciado o processo de instalação das plataformas de tele-diagnóstico. A execução financeira atingiu os 422.285 €, o que corresponde a 95% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

P 5.4. Saúde Online

RTS, Refª PAD 071:

O Projecto RTS enfrentou grandes dificuldades em estabelecer o Acordo de Consórcio entre todas as entidades envolvidas, obrigando mesmo a um adiamento do seu início. Neste momento, e após reprogramação do Projecto, a execução técnica decorre a um ritmo que permite recuperar o atraso verificado. A execução financeira atingiu os 29.381 €, o que corresponde a 10% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 6: SOLIDARIEDADE SOCIAL

Introdução

Nesta Área de Intervenção foram aprovados 6 Projectos com 29 Entidades Beneficiárias. Participam na execução 78 Pessoas com um volume de trabalho de 202 HM. Já estão verificados 10 Resultados Documentais e como factores a realçar destacam-se os benefícios para os utentes das IPSS que advém da quantidade e diversidade das Instituições envolvidas nestes Projectos.

P 6.1.Serviços de Gestão e Administração da Rede Social

SAISS, Refª PAD 015

Este Projecto está a decorrer de acordo com o PTF, tendo já elaborado as especificações de requisitos para todas as aplicações. A execução financeira atingiu os 114.621 €, o que corresponde a 83% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

P 6.2.Conteúdos Pedagógicos

Estar, Refª PAD 128

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso, tem como resultado final a criação de Centros e Serviços de Info-inclusão. Iniciou a execução material em 27.10.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

P 6.4.Viver em Segurança

SAD_SOS, Refª PAD 102

Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso, tem como resultado final a criação de Serviços de Apoio a Idosos em Situações de Risco, estando o início da sua execução material previsto para 03.01.05 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

P 6.5. Inclusão Social na SI

Incluinet, Refª PAD 132

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso, tem como resultado final a criação de Centros e Serviços de Info-Inclusão. Iniciou a execução material em 29.11.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

ISSI, Refª PAD 133

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso, tem como resultado final a criação de Centros e Serviços de Info-Inclusão. Iniciou a execução material em 08.11.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

P 6.8. Balcão Único de Solidariedade Social

AMRiaSocial, Refª PAD 113

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso, tem como resultado final a criação de Serviços de Oferta e de Procura de Solidariedade Social. Iniciou a execução material em 01.10.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 7: TECIDO PRODUTIVO

Introdução

Nesta Área de Intervenção foram aprovados 32 Projectos, envolvendo 33 Entidades Beneficiárias. Na execução participam 130 Pessoas com um volume de trabalho de 1299 HM. Já estão verificados 72 Resultados Documentais e como factor a realçar destaca-se a dinâmica demonstrada para a modernização do Tecido Produtivo da Região da AMRia.

P 7.1.Informar e Mobilizar para Inovar

Geo-MKT, Refª PAD 029

Os objectivos deste Projecto passam pela divulgação das Zonas Industriais de Nova Geração, sendo fortemente correlacionado com o Projecto GeoInvest, onde se verifica um atraso na sua execução. Assim, este Projecto também apresenta desvios pois deve estar perfeitamente sincronizado com o Projecto GeoInvest. A execução financeira atingiu os 8.352 €, o que corresponde a 15% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

P 7.3.Serviços de Turismo

TIC & TU, Refª PAD 112

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviço de Informação Turística e de Reservas da Rota da Luz. Iniciou a execução material em 02.11.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

P 7.4.Zonas Industriais de Nova Geração

GeoInvest, Refª PAD 027

As dificuldades sentidas na definição do modelo para a localização para as Zonas Industriais de Nova Geração originaram um atraso na sua execução técnica, tendo a EBP apresentado uma recalendarização técnica, mantendo os objectivos e o prazo para a execução do Projecto. A execução financeira atingiu os 71.063 €, o que corresponde a 32% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

P 7.5.Modernizar a Indústria, o Comércio e os Serviços

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

RED-AVEIRO, Refª PAD 072

O Projecto apresenta atrasos significativos na execução técnica em toda a sua extensão. A execução financeira atingiu os 2.644 €, o que corresponde a 5% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

e-NTL, Refª PAD 069

Este Projecto está decorrer de acordo com o PTF, tendo já executado a aquisição e instalação de todo o equipamento e tem a funcionar a 1ª versão da plataforma de serviços. A execução financeira atingiu os 29.871 €, o que corresponde a 109% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

ESTAG, Refª PAD 033

Este Projecto está decorrer de acordo com o PTF, tendo já adquirido o equipamento e tem a funcionar a 1ª versão da plataforma de serviços. A execução financeira atingiu os 18.575 €, o que corresponde a 87% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

FIG-NET, Refª PAD 031

Este Projecto está decorrer de acordo com o PTF, tendo já adquirido o equipamento e tem a funcionar a 1ª versão da plataforma de serviços. A execução financeira atingiu os 18.246 €, o que corresponde a 85% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

Inovortal, Refª PAD 032

Este Projecto, no geral, está decorrer de acordo com o PTF, tendo no entanto atrasada a aquisição de equipamento. A execução financeira atingiu os 23.517 €, o que corresponde a 40% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

MARC, Refª PAD 074

Este Projecto apresenta atrasos na execução técnica, nomeadamente na aquisição e instalação da rede, servidor e terminais e no desenvolvimento de software. A execução financeira atingiu os 14.620 €, o que corresponde a 22% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ONDA, Refª PAD 021

O Projecto apresenta atrasos significativos na execução técnica em toda a sua extensão, no entanto existe neste momento um esforço por parte da EBP para recuperar. A execução financeira atingiu os 26.378 €, o que corresponde a 17% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

TUP, Refª PAD 044

O Projecto TUP apresenta atrasos na execução técnica, nomeadamente ao nível do Back Office comercial, prevendo que este sistema esteja instalado no início de 2005. A execução financeira os atingiu os 101.820 €, o que corresponde a 95% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

HMC, Refª PAD 042

Apesar do atraso verificado, por não terem previsto uma equipa pluridisciplinar que tivesse uma visão integrada das aplicações a desenvolver, o Projecto apresenta uma tendência de recuperação na sua vertente técnica. A execução financeira atingiu os 13.493 €, o que corresponde a 37% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

SANI, Refª PAD 047

Das 3 unidades fabris da Sanindusa onde vai ser instalado o Sistema de Gestão e Controlo de Produção, numa já está instalado, com um elevado grau de satisfação por parte dos seus responsáveis. A execução financeira atingiu os 82.401 €, o que corresponde a 67% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

SMIA, Refª PAD 052

O Projecto SMIA já executou as suas tarefas mais críticas, tendo mesmo as aplicações a funcionar no terreno. A execução financeira atingiu os 80.289 €, o que corresponde a 95% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

SIPA, Refª PAD 026

O Projecto SIPA apresenta uma execução técnica conforme o previsto no PTF, prevendo-se que a aplicação integrada esteja completamente operacional no final do 1º trimestre de 2005. A execução financeira atingiu os 40.490 €, o que corresponde a 12% do orçamento previsto para os dois primeiros anos do Projecto.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ABS XXI, Refª PAD 036

O Projecto decorre como o previsto no PTF, estando numa fase de desenvolvimento da Plataforma de Serviços. A execução financeira atingiu os 14.199 €, o que corresponde a 44% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

Digivacas, Refª PAD 064

O Projecto DigiVacas corre conforme o previsto, tendo definido o seu modelo conceptual para as aplicações a desenvolver, estando, neste momento, na fase de aquisição de equipamentos e adjudicação do desenvolvimento das aplicações. O Projecto DigiVacas ainda não apresentou despesas, pois iniciou-se em Julho de 2004, tendo optado por apresentar despesas apenas na 1ª Apresentação de Despesas de 2005.

Abdigital, Refª PAD 106

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Abimota. Iniciou a execução material em15.11.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

Atlética, Refª PAD 139

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Back-office e de Gestão da Produção da Atlética, estando o início da sua execução material previsto para 15.03.05 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

Braxen, Refª PAD 115

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Braxen, estando o início da sua execução material previsto para 01.01.05 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

CADERNO DIGITAL, Refª PAD 147

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Back-office e de Edição On-line da Caderno Digital. Iniciou a execução material em 22.11.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Com.Web, Refª PAD 137

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Audiodecor. Iniciou a execução material em 01.10.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

DigiPot, Refª PAD 119

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Back-office e Gestão Integrada da 5ª Potência, estando o início da sua execução material previsto para 01.01.05 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

e-SI, Refª PAD 123

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Back-office e Gestão Integrada da HFA. Iniciou a execução material em 10.11.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

Extraplas, Refª PAD 110

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Back-office de Gestão e de Produção da Madaleno. Iniciou a execução material em 15.10.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

GALILEU-DIAG, Refª PAD 148

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Diagnóstico e Gestão Formação da Activos e Recursos. Iniciou a execução material em 15.11.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

Imagem XXI, Refª PAD 118

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Uma Imagem, estando o início da sua execução material previsto para 01.01.05 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

JFD, Refª PAD 117

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Janeves, estando o início da

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

sua execução material previsto para 01.01.05 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

Semiar, Refª PAD 130

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Oferta e de Procura de Solidariedade Social. Iniciou a execução material em 01.10.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

uebe.SI, Refª PAD 103

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Back-office e Gestão Integrada da Ponto.C, estando o início da sua execução material previsto para 03.01.05 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

VLM-online, Refª PAD 104

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Back-office e Gestão Integrada da VLM Consultores. Iniciou a execução material em 02.12.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

web-IVE, Refª PAD 129

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso e tem como resultado final a criação de Serviços de Back-office e Gestão Integrada da IVE, estando o início da sua execução material previsto para 02.01.05 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 8: INFORMAÇÃO, CULTURA E LAZER

Introdução

Nesta Área de Intervenção foram aprovados 11 Projectos, envolvendo 74 Entidades Beneficiárias. Participam na execução 83 pessoas com um volume de trabalho de 1254 HM. Já estão verificados 47 Resultados Documentais e como factores a realçar destacam-se por um lado a qualidade, quantidade e diversidade de conteúdos que estão a ser criados, e por outro o impacto geográfico e alargado associado ao elevado número de Entidades Beneficiárias.

P 8.1.Museus e Arquivos

bibria, Refª PAD 066

Este Projecto encontra-se em atraso relativamente ao PTF aprovado, estando em fase de finalização e entrega dos Cadernos de Encargos e abertura de concurso para Software e Equipamento. A execução financeira atingiu os 45.588 €, o que corresponde a 23% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

INFORDICO, Refª PAD 024

Este Projecto encontra-se com um ligeiro atraso em relação ao PTF, tendo já efectuado a aquisição e instalação de equipamento, iniciado a fotografia e registo do acervo, seleccionado a aplicação web a instalar. A execução financeira atingiu os 111.336 €, o que corresponde a 42% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

MEMDigital, Refª PAD 055

Este Projecto está decorrer de acordo com o PTF, tendo sido já adjudicada a 1ª fase de digitalização do acervo, estando neste momento em fase de lançamento do concurso para a Plataforma Dinâmica de Serviços. A execução financeira atingiu os 30.518 €, o que corresponde a 61% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

P@Z, Refª PAD 050

Este Projecto está decorrer de acordo com o PTF, estando em fase adiantada, tendo inclusive ultrapassado a percentagem prevista de análise e digitação do acervo manuscrito, já efectuado aquisição e instalação de equipamento e da aplicação de base

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

de dados. A execução financeira atingiu os 19.738 €, o que corresponde a 64% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

MUSEAVE, Refª PAD 107

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso, tem como resultado final Produtos e Serviços Pedagógicos para Pólos Museológicos, estando o início da sua execução material previsto para 01.02.2005 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

P 8.2. Redes de Serviços Regionais

SIGRED, Refª PAD 114

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso, tem como resultado final Serviços para a Gestão e Reserva de Recintos Desportivos, estando o início da sua execução material previsto para 01.01.05 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

P 8.3. Academia Artes Digitais

AAD-TA, Refª PAD 038

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 1º Concurso, tem como resultado final Instalação da Academia de Artes Digitais e Produção de Arte Digital, ainda não deu iniciou a execução material, e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

P 8.4. Movimento Associativo Digital

PIAR, Refª PAD 003

Este Projecto está decorrer de acordo com o PTF, tendo já executado a aquisição e instalação do equipamento e estando em fase avançada de desenvolvimento da aplicação de gestão e transmissão de conteúdos. A execução financeira atingiu os 504.757 €, o que corresponde a 116% do orçamento previsto para o 1º ano do Projecto.

Adira, Refª PAD 142

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso, tem como resultado final Serviços para a Gestão e Promoção das Associações da Região AMRia, já iniciou a execução material a 01.11.04 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

IPJDIGITAL, Refª PAD 120

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso, tem como resultado final Serviços para a Gestão e Promoção das Associações Juvenis da Região AMRia, estando o início da sua execução material previsto para 01.01.2005 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

POMADA, Refª PAD 136

Este Projecto foi aprovado no âmbito do 2º Concurso, tem como resultado final Serviços para a Gestão e Promoção da Associação Académica da Universidade de Aveiro, já iniciou a execução material a 12.11.2004 e o seu PTF pode ser consultado no SAVAD.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

GESTÃO FINANCEIRA

As actividades associadas à gestão financeira do Programa Aveiro Digital 2003-2006, estão integradas no Projecto P1.3. Gestão e Coordenação Aveiro Digital. No entanto dada a sua especial relevância são detalhadamente descritas neste capítulo do Relatório Anual.

No âmbito da gestão financeira foi assegurado o planeamento, acompanhamento e controlo dos processos de execução financeira, nomeadamente dos processos de execução financeira dos 78 Projectos do Programa Aveiro Digital 2003-2006. Foi ainda assegurado o controlo e execução de actividades administrativas e de gestão dos recursos humanos do GAD.

No âmbito do 2º Concurso Aveiro Digital 2003-2006 foi ainda assegurada a componente de avaliação, registo e acompanhamento dos orçamentos comprometidos com os novos 32 Projectos aprovados.

A Gestão Financeira foi realizada por duas pessoas, uma com formação em Auditoria Contabilística e outra com formação em Gestão.

ACTIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA

As actividades relevantes associadas à Gestão Financeira foram as seguintes:

- Especificação dos requisitos da Gestão Financeira do Sistema SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital;
- Acompanhamento da execução do orçamento aprovado, tendo em conta os critérios e prioridades estabelecidas pela CEAD, bem como as normas financeiras aplicáveis;
- Análise e avaliação regular da execução financeira para apreciação da CEAD; (Anexo 05)
- Elaboração de planos de despesas e de pagamentos associados para apreciação e deliberação da CEAD e sua posterior execução; (Anexo 05)
- Elaboração de relatórios de apresentação de despesas à entidade financiadora (POSI), de acordo com as normas e os regulamentos estabelecidos;
- Registo e verificação da movimentação das contas bancárias do Programa Aveiro Digital 2003-2006;

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

- Reembolsos às Entidades Beneficiárias Principais dos adiantamentos e comparticipações financeiras das Despesas apresentadas, tendo em conta os critérios e prioridades estabelecidas pela CEAD. (Anexo 05)

As actividades relacionadas com a gestão dos recursos humanos foram as seguintes:

- Elaboração da documentação para o processamento e pagamento dos vencimentos e das prestações de serviços e respectiva liquidação;
- Elaboração das declarações fiscais/legais inerentes aos recursos humanos, nomeadamente, Declarações de Retenção na Fonte - IRS, Quadro de Pessoal/Outubro, Declarações de Rendimento e Imposto Retido e ainda as Declarações de Remunerações para a Segurança Social.

As actividades de natureza administrativas e associadas à gestão de processos compreenderam:

- Implementação de um sistema de contabilidade - Software Primavera, compreendendo os módulos de Contabilidade Geral e Analítica, Gestão de Terceiros, Gestão de Tesouraria e Gestão de Imobilizado;
- Encerramento das Contas do exercício de 2003 e elaboração de toda a documentação associada;
- Elaboração do Relatório da Execução Financeira de 2003 do Programa Aveiro Digital 2003-2006;
- Execução da Contabilidade do exercício de 2004 da Associação Aveiro Digital;
- Acompanhamento da movimentação das contas bancárias do Programa Aveiro Digital 2003-2006 e verificação recorrendo à reconciliação bancária;
- Elaboração dos processos de aquisição de bens e serviços integrados nos Projectos da Área de Intervenção 1 e preparação dos contratos de prestação de serviços, para apreciação e deliberação pela CEAD; (Anexo 05)
- Registo e encaminhamento de todos os Processos de Justificação de Aquisição de Equipamento para o Comité Técnico do POSI;
- Coordenação das actividades de expediente geral do Gabinete Aveiro Digital;
- Análise, encaminhamento e verificação de processos administrativos e controlo do economato.

METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO DE DESPESAS

A CEAD definiu uma metodologia para as Apresentações de Despesas baseada num processo de *workflow*, que serviu de orientação ao desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital – o SAVAD, onde está incorporada toda a

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

legislação aplicável, de forma a simplificar a complexidade destes processos e onde todos os Projectos têm uma área própria de Gestão Financeira.

A metodologia aplicada na elaboração de apresentação de despesas à entidade financiadora (POSI) consistiu no seguinte:

- Identificação, selecção e recolha de todos os documentos de despesa dos Projectos da área de Intervenção 1 e registo dos mesmos no SAVAD;
- Registo no SAVAD das despesas dos Projectos pelas respectivas Entidades Beneficiárias Principais;
- Entrega ao GAD após verificação, pelas Entidades Beneficiárias Principais, das despesas registadas no SAVAD através da análise dos dados e enquadramento nas rubricas orçamentais do respectivo Projecto;
- Pré-verificação pelo GAD das despesas registadas, com análise dos dados e enquadramento no respectivo Plano Técnico e Financeiro;
- Recepção no GAD dos dossiers físicos entregues pelas Entidades Beneficiárias Principais;
- Verificação pelo GAD da conformidade dos registos das despesas no SAVAD com os documentos contabilísticos originais e verificação pelos respectivos Contactos GAD de Projecto da conformidade das despesas apresentadas face à execução do Plano Técnico;
- Anulação dos documentos contabilísticos originais, com a aposição do carimbo de financiamento POSI e FEDER, respectiva taxa de imputação e rubrica do técnico financeiro GAD;
- Numeração sequencial de todos os documentos que integram o dossier financeiro de cada Projecto, contendo o número do Pedido de Pagamento do Projecto e o Número da Refª PAD;
- Verificação dos registos nos formulários POSI;
- Entrega no GAD de duas cópias do dossier financeiro pela respectiva Entidade Beneficiária Principal;
- Envio ao POSI dos ficheiros electrónicos das Listas de Despesas para primeira validação e dos Pedidos de Pagamento em formato papel, acompanhados de cópias de todos os documentos de despesas e respectivos justificativos.

A elaboração dos relatórios de apresentação de despesas à entidade financiadora (POSI) dando cumprimento às obrigações assumidas pelo Programa Aveiro Digital 2003-2006 no Termo de Aceitação assinado para a Medida 2.3, foram tarefas realizadas nos meses de Fevereiro, Junho, Outubro e Dezembro de 2004, tendo sido apresentadas durante o ano 2004, despesas no valor total de 5.332.663,86€.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SAVAD: Gestão Financeira

O SAVAD tem sido uma ferramenta fundamental para a qualidade e eficiência da gestão financeira, garantindo maior rigor, segurança, rapidez e eficácia na Apresentação de Despesas e dos Pedidos de Pagamento à entidade financiadora (POSI), para além de garantir informação sempre actual, gerada em tempo útil, quer para análise e controlo da CEAD, quer para todas as Entidades Beneficiárias Principais.

Esta implementação teve como principais objectivos:

- Maximizar a utilidade da informação produzida;
- Fornecer informação rigorosa, clara e objectiva;
- Garantir a integridade da informação e documentação produzida;
- Optimizar a área financeira do GAD e de todas as entidades executoras;
- Dar suporte ao processo de gestão de informação até à conclusão dos Projectos.

A informação de execução financeira no SAVAD é apresentada de forma agregada no PAD, por Área de Intervenção e por Projecto.

A área global de execução financeira "PAD 2003-2006" evidencia de forma sintetizada a informação de execução financeira global do Programa Aveiro Digital 2003-2006, permitindo ainda extrair o histórico dos Pedidos de Pagamento e as listas de Despesas, apresentadas, verificadas, quitadas e aceites por Projecto, por Área de Intervenção e dos totais do Programa.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

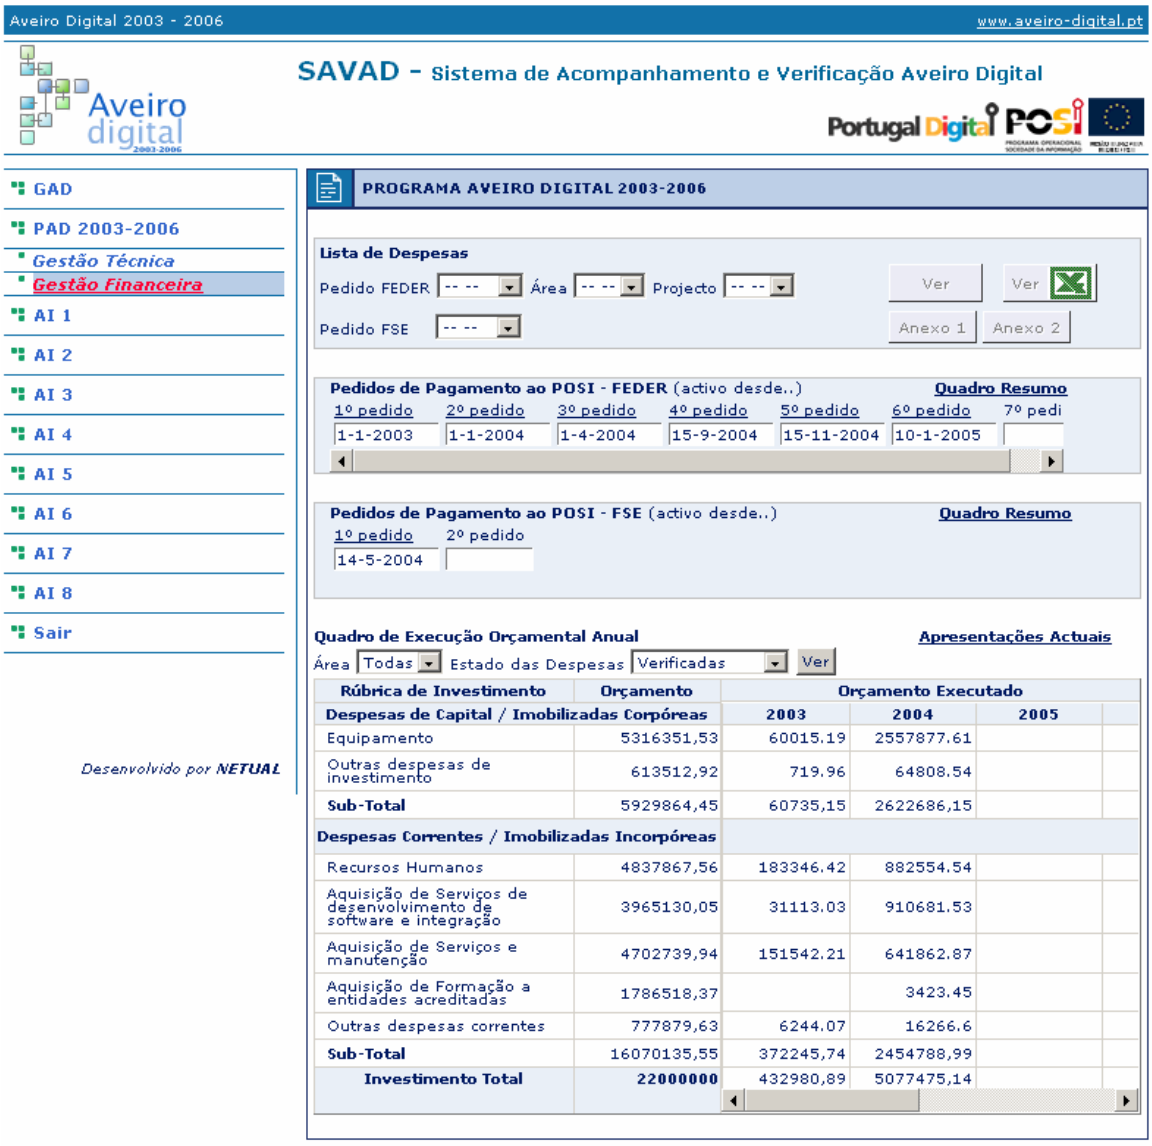

SAVAD – Execução Financeira global do Programa Aveiro Digital 2003-2006

Por Área de Intervenção é exibido o balanço da Execução Técnica e Financeira para todos os Projectos nela integrados, evidenciando o orçamento aprovado, o orçamento executado em valor e percentagem e ainda o orçamento por executar.

A despesa só é considerada no estado de aceite e o orçamento executado após validação do Gabinete do POSI.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

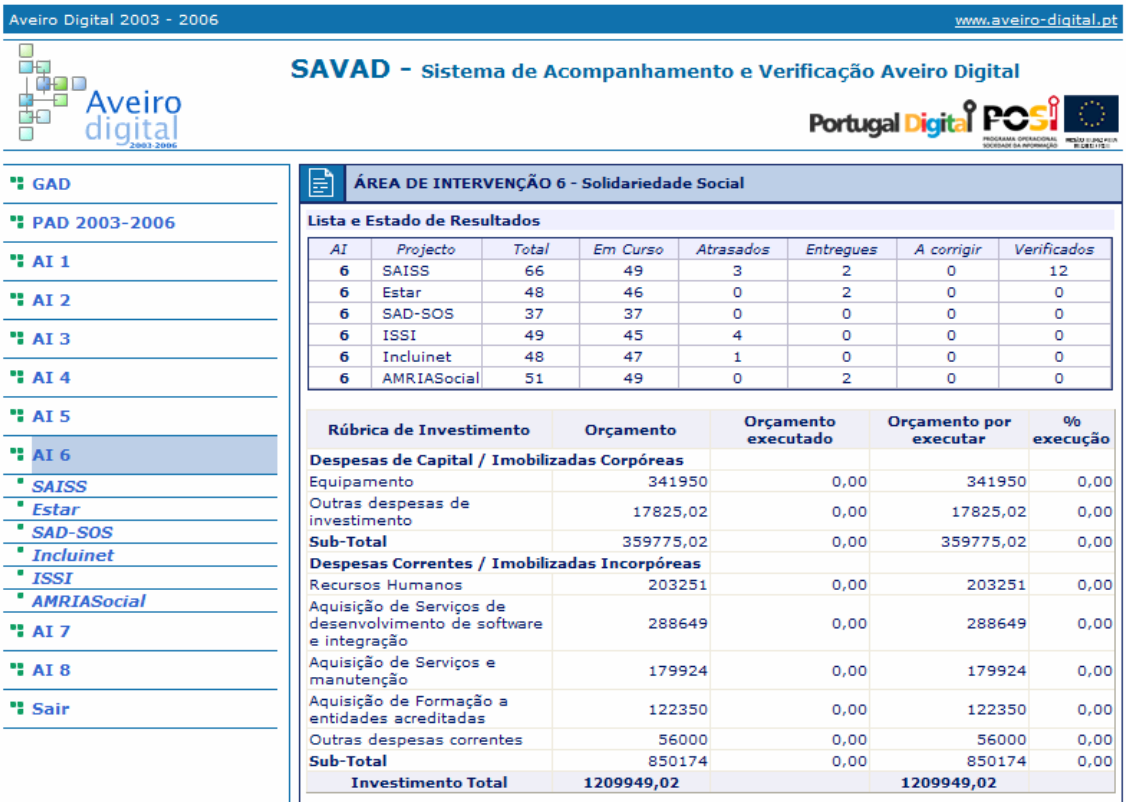

SAVAD – Execução Técnica e Financeira por AI

Cada Entidade Beneficiária Principal tem uma área de Gestão Financeira específica por Projecto que lhe permite o registo e introdução de despesas por rubrica orçamental e por Entidade Beneficiária e por Tarefa, de acordo com o Plano Técnico e Financeiro respectivo.

Na área de Gestão Financeira de cada Projecto, estão disponíveis as orientações de apoio ao processo de Apresentação de Despesas. O quadro do histórico de Apresentações de despesas evidencia o seu estado, a data de fecho, o valor de despesa apresentada e o valor da despesa já quitada.

Para o perfil de EBP estão disponíveis as funcionalidades 1: Introdução e Correcção de Despesas, 2: Verificação e Entrega de Despesas, 3: Lista e Estado das Despesas, 4: Documentos Consolidados e 5: Exportação para Excel.

Para o Perfil GAD estão ainda disponíveis as funcionalidades 6: Pré-Verificação de Despesas, 7: Verificação de Despesas, 8: Aceitação de Despesas e 9: Quadro Comparativo do Orçamento.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

A funcionalidade 8 está preparada para o perfil POSI, permitindo-lhe definir o estado da despesa, como aceite, não aceite ou a justificar. Neste dois últimos casos permite a introdução de comentários e pedidos de justificação.

SAVAD – Gestão Financeira por Projecto

Cada Projecto possui a sua própria área de Gestão Financeira, que contém toda a informação associada ao seu orçamento por ano e por rubrica orçamental conforme com o respectivo Plano Técnico e Financeiro, evidenciando-se ainda a informação das despesas já executadas.

O Quadro Comparativo do Orçamento, apresenta por rubrica orçamental, os montantes do orçamento, da despesa já apresentada, do orçamento por executar e respectiva percentagem de execução.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SAVAD – Quadro Comparativo da Execução Orçamental por Projecto

Na funcionalidade 1 da Gestão Financeira – Introdução e Correcção de despesas, as EBP procedem ao registo das suas despesas, por Entidade Beneficiária, por Rubrica orçamental e por Tarefa, preenchendo todos os campos associados ao documento de despesa e documento de quitação. Ao inserir um registo, este passa a constar na tabela "Documentos de Despesas já registados", permitindo editá-lo para o alterar ou anular.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SAVAD – Gestão Financeira: 1 – Introdução e Correcção de Despesas

A funcionalidade 2 – Verificação e Entrega de Despesas, apresenta todos os dados associados aos documentos registados, ordenados por rubrica orçamental e por ordem cronológica. Nesta área, a EBP valida a informação, assinalando cada despesa como verificada e fecha o processo da Apresentação de Despesa inibindo o acesso à funcionalidade 1.

O SAVAD gera uma notificação por e-mail à EBP informando que os documentos da apresentação de despesa foram inseridos com sucesso e que irão ser pré-verificada pelo GAD. Este e-mail segue igualmente para respectivo o Contacto GAD do Projecto.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SAVAD – Gestão Financeira: 2 – Verificação e Entrega de Despesas

A funcionalidade 3 – Lista e Estado das Despesas, evidencia por cada apresentação de despesa, o estado de cada documento de despesa e de quitação. Os documentos de despesa podem encontrar-se nos seguintes estados:

- "Entregue" – quando a Entidade Beneficiária Principal fecha o processo na funcionalidade 2;
- "Pré-verificado" – quando o GAD termina a pré-verificação da informação na funcionalidade 6;

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

- "Verificado" – quando o GAD verifica os documentos na funcionalidade 7;
- "Aceite" – quando a despesa é aceite como elegível pelo POSI;
- "Não Aceite" – quando a despesa é considerada não elegível pelo POSI;
- "A corrigir" – quando o registo contem erro(s) ou deve ser eliminado, sendo inserida uma nota explicativa;
- "A justificar" – quando o processo de justificação da despesa se encontra incompleto, sendo inserida uma nota explicativa.

Os documentos de quitação podem encontrar-se nos seguintes estados:

- "Entregue" – quando o registo do documento de quitação se encontra inserido;
- "Parcial" – quando o documento de quitação não liquida completamente o respectivo documento de despesa;
- "Não Entregue" – quando não se encontra registado o documento de quitação.

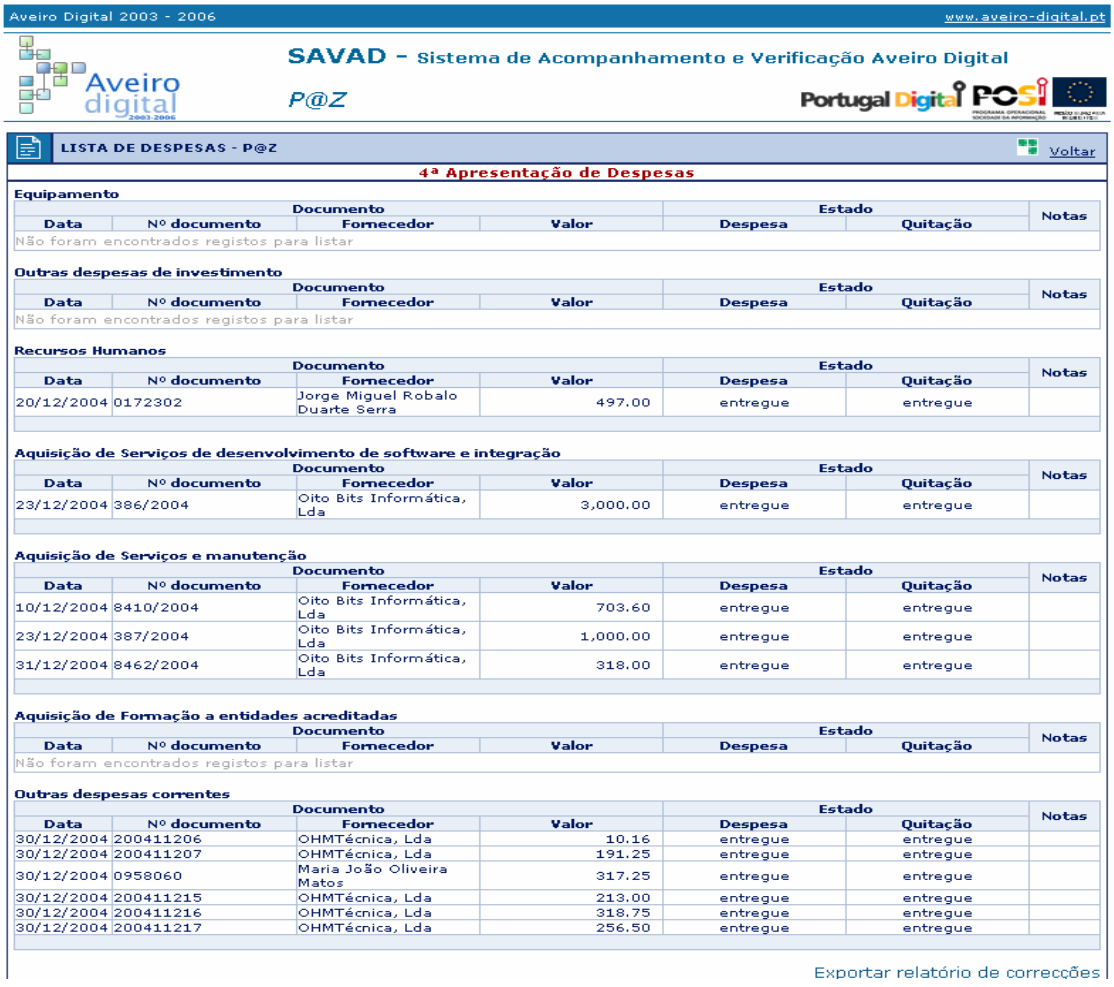

Aveiro Digital 2003 - 2006 www.aveiro-digital.pt

Aveiro digital

SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital

P@Z

Portugal Digital POSI

LISTA DE DESPESAS - P@Z Voltar

4ª Apresentação de Despesas

Equipamento

Documento				Estado		Notas
Data	Nº documento	Fornecedor	Valor	Despesa	Quitação	
Não foram encontrados registos para listar						

Outras despesas de investimento

Documento				Estado		Notas
Data	Nº documento	Fornecedor	Valor	Despesa	Quitação	
Não foram encontrados registos para listar						

Recursos Humanos

Documento				Estado		Notas
Data	Nº documento	Fornecedor	Valor	Despesa	Quitação	
20/12/2004	0172302	Jorge Miguel Robalo Duarte Serra	497.00	entregue	entregue	

Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração

Documento				Estado		Notas
Data	Nº documento	Fornecedor	Valor	Despesa	Quitação	
23/12/2004	386/2004	Oito Bits Informática, Lda	3,000.00	entregue	entregue	

Aquisição de Serviços e manutenção

Documento				Estado		Notas
Data	Nº documento	Fornecedor	Valor	Despesa	Quitação	
10/12/2004	8410/2004	Oito Bits Informática, Lda	703.60	entregue	entregue	
23/12/2004	387/2004	Oito Bits Informática, Lda	1,000.00	entregue	entregue	
31/12/2004	8462/2004	Oito Bits Informática, Lda	318.00	entregue	entregue	

Aquisição de Formação a entidades acreditadas

Documento				Estado		Notas
Data	Nº documento	Fornecedor	Valor	Despesa	Quitação	
Não foram encontrados registos para listar						

Outras despesas correntes

Documento				Estado		Notas
Data	Nº documento	Fornecedor	Valor	Despesa	Quitação	
30/12/2004	200411206	OHMTécnica, Lda	10.16	entregue	entregue	
30/12/2004	200411207	OHMTécnica, Lda	191.25	entregue	entregue	
30/12/2004	0958060	Maria João Oliveira Matos	317.25	entregue	entregue	
30/12/2004	200411215	OHMTécnica, Lda	213.00	entregue	entregue	
30/12/2004	200411216	OHMTécnica, Lda	318.75	entregue	entregue	
30/12/2004	200411217	OHMTécnica, Lda	256.50	entregue	entregue	

Exportar relatório de correcções

SAVAD – Gestão Financeira: 3 – Lista e Estado das Despesas

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Na funcionalidade 4 - Documentos Consolidados, procede-se à visualização e impressão dos formulários do Pedido de Pagamento e respectivas Lista de despesas, nos formatos normalizados pelo POSI. As Listas de despesas são geradas de forma automática quando as despesas são assinaladas como verificadas, sendo o formulário do Pedido de Pagamento gerado quando as despesas são assinaladas como aceites pelo POSI. Estes documentos são emitidos e assinados pelas Entidades Beneficiárias Principais e posteriormente entregues ao GAD, associadas ao pedido de reembolso correspondente à comparticipação financeira das Apresentações de Despesas.

Na funcionalidade 5 - Exportação para Excel, permite exportar para Excel as Listas das despesas mencionadas na funcionalidade 4, sendo geradas assim que as Entidades Beneficiárias Principais fecham o processo na funcionalidade 2. Estas listas contêm duas colunas adicionais, uma com identificação da entidade detentora da despesa e outra com o regime de IVA aplicável. Estas listas são também enviadas ao Gabinete do POSI para pré-verificação das despesas por Pedido de Pagamento.

Na funcionalidade 6 - Pré-verificação de Despesas, o GAD assinala cada despesa como Pré-verificada, a Justificar ou a Corrigir, inserindo-se nestes dois últimos as notas explicativas. Quando se coloca a despesa no estado a corrigir é activada a funcionalidade 1, que permite alterar ou eliminar o registo dessa despesa. A pré-verificação é concluída com a funcionalidade "Enviar notificação" que gera um e-mail à EBP solicitar a entrega no prazo de 3 dias do Dossier Financeiro do Projecto no GAD, alertando para a necessária consulta da Lista e Estado das Despesas. Este e-mail segue igualmente para o respectivo Contacto GAD.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SAVAD – Gestão Financeira: 6 – Pré-Verificação de Despesas

Na funcionalidade 7 – Verificação das despesas, o GAD procede à verificação física de cada despesa e assinala-a como Verificada, a Corrigir ou a Justificar, inserindo-se nestes dois últimos as notas explicativas. Quando se coloca a despesa no estado a corrigir é activada a funcionalidade 1, que permite alterar ou eliminar o registo dessa despesa. As despesas não conformes são diferidas para a Apresentação de Despesas seguinte, sendo eliminadas da Apresentação de Despesas em curso. A verificação é concluída com a funcionalidade "Enviar notificação" que gera um e-mail à EBP para que esta proceda no prazo de 3 dias à apresentação de duas cópias no GAD. Este e-mail segue igualmente para o Contacto GAD respectivo.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SAVAD – Gestão Financeira: 7 – Verificação de Despesas

Na funcionalidade 8 – Aceitação de despesas, após validação do POSI, todas as despesas elegíveis são assinaladas pelo GAD como Aceites ou a Justificar no caso de ser solicitado informação adicional, sendo as restantes assinaladas como Não Aceites. O SAVAD gera novamente uma notificação por e-mail à EBP que também segue para o respectivo Contacto GAD.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SAVAD – Gestão Financeira: 8 – Aceitação de Despesas

Com toda a informação gerada pelo registo dos documentos de despesa, é possível extrair do SAVAD um conjunto de quadros que permitem mostrar o orçamento comprometido por Projecto e por AI, a realização financeira de cada Projecto e a sua evolução através da apresentação de dados consolidados, quadros que evidenciam os desvios entre o orçamentado e o realizado, bem como exportação para Excel de mapas com todos os dados dos documentos por Rubrica orçamental.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Apresenta-se de seguida um fluxograma que explicita sucintamente os procedimentos adoptados:

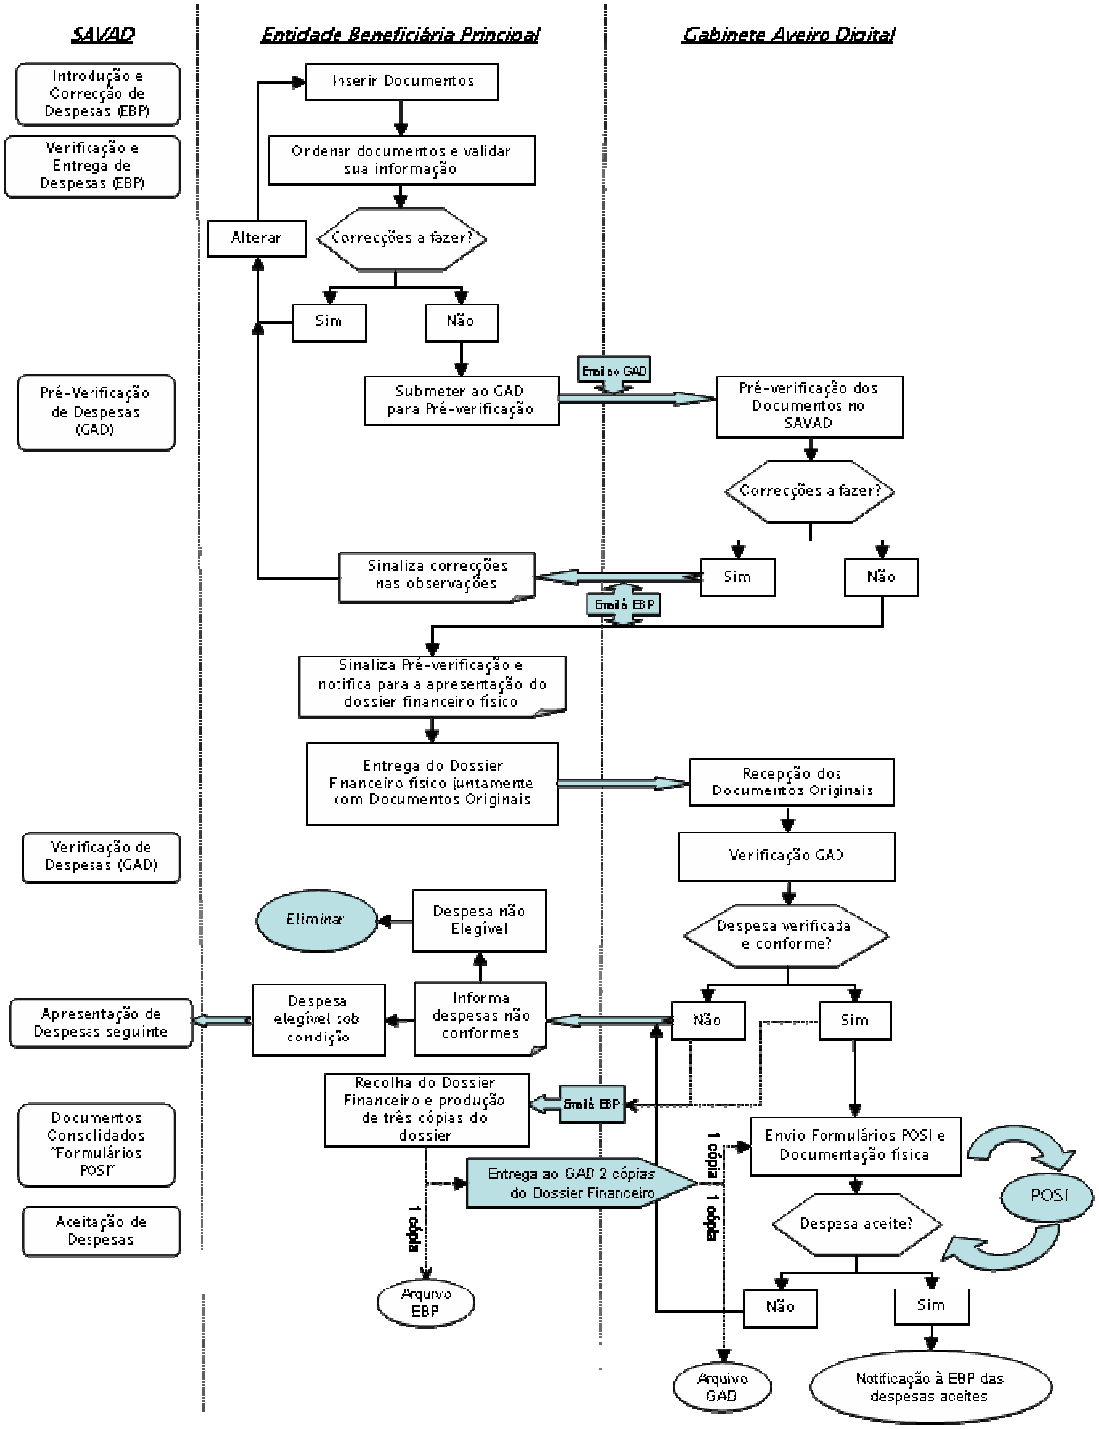

Fluxograma de procedimentos adoptados

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2004

No dia 20 de Dezembro, data da 5ª Apresentação de Despesas e última de 2004, estavam executados 5.506.389,98€, correspondendo a 28% do Orçamento Total para a Medida 2.3 – FEDER.

Este valor corresponde a dois anos de execução dos Projectos da Área de Intervenção 1, geridos directamente pela CEAD e a um ano de execução dos 40 Projectos aprovados no 1º Concurso Aveiro Digital e formalizados a 19 de Dezembro de 2003.

Com o inicio da execução material em Janeiro de 2005 de mais 32 Projectos aprovados no 2º Concurso Aveiro Digital e formalizados a 20 de Dezembro de 2004, o Programa Aveiro Digital 2003-2006 atinge a sua dimensão plena com 78 Projectos, prevendo-se que a execução financeira de 2005 atinja 9.000.000 €.

O quadro seguinte mostra a execução financeira já realizada, por ano e por Rubrica Orçamental:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado			% Execução
		2003	2004	Total	
Equipamento	5.316.214,80 €	60.015,20 €	2.557.165,99 €	2.617.181,19 €	49%
Outras despesas de investimento	615.012,76 €	719,96 €	64.808,54 €	65.528,50 €	11%
Sub-Total	**5.931.227,56 €**	**60.735,16 €**	**2.621.974,53 €**	**2.682.709,69 €**	**45%**
Recursos Humanos	4.639.940,05 €	183.346,42 €	882.599,40 €	1.065.945,82 €	23%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	3.965.210,72 €	31.113,03 €	910.682,16 €	941.795,19 €	24%
Aquisição de Serviços e manutenção	4.693.740,47 €	151.542,21 €	641.862,88 €	793.405,09 €	17%
Outras despesas correntes	769.881,20 €	6.244,67 €	16.290,12 €	22.534,19 €	3%
Sub-Total	**14.068.772,44 €**	**372.246,63 €**	**2.451.434,56 €**	**2.823.680,89 €**	**20%**
Investimento Total	**20.000.000,00 €**	**432.981,49 €**	**5.073.409,09 €**	**5.506.390,58 €**	**28%**

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Execução Financeira por Área de Intervenção

Apresenta-se, de seguida, uma visão por Área de Intervenção, detalhando-se desta forma, a execução financeira do Programa Aveiro Digital 2003-2006. O orçamento já inclui os 32 Projectos aprovados no 2º Concurso Aveiro Digital, cujo seu início acontecerá em 2005.

Área de Intervenção 1 – Comunidade Digital

A execução financeira da Área de Intervenção 1, gerida directamente pela CEAD, atinge os 38% do Orçamento, destacando-se a implementação dos Espaços Internet Aveiro Digital, cuja rede abrange 11 Espaços municipais e 79 Espaços nas Juntas de Freguesia. O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 1:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado			% Execução
		2003	2004	Total	
Equipamento	443.504,00 €	19.984,15 €	354.113,00 €	374.097,15 €	84%
Outras despesas de investimento	12.000,00 €	- €	11.030,52 €	11.030,52 €	92%
Sub-Total	**455.504,00 €**	**19.984,15 €**	**365.143,52 €**	**385.127,67 €**	**85%**
Recursos Humanos	1.490.164,43 €	171.841,32 €	264.001,99 €	435.843,31 €	29%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	87.195,00 €	- €	35.378,70 €	35.378,70 €	41%
Aquisição de Serviços e manutenção	1.215.376,22 €	104.597,85 €	326.092,69 €	430.690,54 €	35%
Outras despesas correntes	185.876,84 €	5.826,64 €	9.802,69 €	15.628,73 €	8%
Sub-Total	**2.978.612,49 €**	**282.265,81 €**	**635.276,07 €**	**917.541,88 €**	**31%**
Investimento Total	**3.434.116,49 €**	**302.249,96 €**	**1.000.419,59 €**	**1.302.669,55 €**	**38%**

Área de Intervenção 2 – Autarquias e Serviços Concelhios

A execução financeira desta área, onde estão inseridos os Projectos que envolvem as 11 Câmaras Municipais da Região da Ria, é de 30%, destacando-se a execução das rubricas de equipamento e de serviços de desenvolvimento de software. O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 2:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado			% Execução
		2003	2004	Total	
Equipamento	1.319.400,00 €	- €	860.197,69 €	860.197,69 €	65%
Outras despesas de investimento	160.900,00 €	- €	21.108,13 €	21.108,13 €	13%
Sub-Total	**1.480.300,00 €**	**- €**	**881.305,82 €**	**881.305,82 €**	**60%**
Recursos Humanos	1.016.378,00 €	571,10 €	125.169,73 €	125.740,83 €	12%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	1.029.500,00 €	- €	408.948,90 €	408.948,90 €	40%
Aquisição de Serviços e manutenção	1.460.500,00 €	10.142,37 €	82.809,21 €	92.951,58 €	6%
Outras despesas correntes	105.000,00 €	- €	- €	- €	0%
Sub-Total	**3.611.378,00 €**	**10.713,47 €**	**616.927,84 €**	**627.641,31 €**	**17%**
Investimento Total	**5.091.678,00 €**	**10.713,47 €**	**1.498.233,66 €**	**1.508.947,13 €**	**30%**

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Área de Intervenção 3 – Escolas e Comunidades Educativas

As escolas e as comunidades educativas já executaram 28% do orçamento dos seus Projectos onde estão envolvidas, destacando-se o forte investimento em equipamento.

O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 3:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado			% Execução
		2003	2004	Total	
Equipamento	403.600,00 €	7.366,20 €	225.399,01 €	232.765,21 €	58%
Outras despesas de investimento	66.180,00 €	719,96 €	- €	719,96 €	1%
Sub-Total	**469.780,00 €**	**8.086,16 €**	**225.399,01 €**	**233.485,17 €**	**50%**
Recursos Humanos	370.344,00 €	- €	141.307,98 €	141.307,98 €	38%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	411.852,00 €	5.156,76 €	44.772,92 €	49.929,68 €	12%
Aquisição de Serviços e manutenção	293.812,00 €	148,75 €	24.310,03 €	24.458,78 €	8%
Outras despesas correntes	74.162,00 €	- €	3.217,30 €	3.217,30 €	4%
Sub-Total	**1.150.170,00 €**	**5.305,51 €**	**213.608,23 €**	**218.913,74 €**	**19%**
Investimento Total	**1.619.950,00 €**	**13.391,67 €**	**439.007,24 €**	**452.398,91 €**	**28%**

Área de Intervenção 4 – Universidade e Comunidade Universitária

Os Projectos dirigidos pela Universidade de Aveiro mostram um forte investimento em equipamento, tendo já executado 23% do seu orçamento total.

O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 4:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado			% Execução
		2003	2004	Total	
Equipamento	503.550,00 €	- €	201.055,35 €	201.055,35 €	40%
Outras despesas de investimento	100.500,00 €	- €	- €	- €	0%
Sub-Total	**604.050,00 €**	**- €**	**201.055,35 €**	**201.055,35 €**	**33%**
Recursos Humanos	353.742,63 €	- €	113.649,06 €	113.649,06 €	32%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	443.500,00 €	- €	95.764,86 €	95.764,86 €	22%
Aquisição de Serviços e manutenção	343.793,00 €	- €	7.270,00 €	7.270,00 €	2%
Outras despesas correntes	80.915,00 €	- €	207,47 €	207,47 €	0%
Sub-Total	**1.221.950,63 €**	**- €**	**216.891,39 €**	**216.891,39 €**	**18%**
Investimento Total	**1.826.000,63 €**	**- €**	**417.946,74 €**	**417.946,74 €**	**23%**

Área de Intervenção 5 – Serviços de Saúde

Os Projectos ligados às instituições de saúde, que abrangem todos os hospitais e centros de saúde da Região da Ria executaram 29% do seu orçamento, com particular destaque para o Projecto RDSR, que já está a instalar plataformas de telediagnóstico nessas instituições.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 5:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado			% Execução
		2003	2004	Total	
Equipamento	650.504,00 €	- €	325.917,09 €	325.917,09 €	50%
Outras despesas de investimento	100.000,00 €	- €	28.560,00 €	28.560,00 €	29%
Sub-Total	**750.504,00 €**	**- €**	**354.477,09 €**	**354.477,09 €**	**47%**
Recursos Humanos	312.422,00 €	- €	68.857,89 €	68.857,89 €	22%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	213.750,00 €	- €	- €	- €	0%
Aquisição de Serviços e manutenção	199.487,00 €	- €	28.204,00 €	28.204,00 €	14%
Outras despesas correntes	93.500,00 €	- €	126,95 €	126,95 €	0%
Sub-Total	**819.159,00 €**	**- €**	**97.188,84 €**	**97.188,84 €**	**12%**
Investimento Total	**1.569.663,00 €**	**- €**	**451.665,93 €**	**451.665,93 €**	**29%**

Área de Intervenção 6 – Solidariedade Social

Nesta Área de Intervenção, a execução financeira é de 11%, correspondente ao Projecto SAISS, o único Projecto desta área aprovado no 1º Concurso. Em 2005, 5 novos Projectos iniciarão a sua execução.

O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 6:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado			% Execução
		2003	2004	Total	
Equipamento	341.950,00 €	- €	5.267,72 €	5.267,72 €	2%
Outras despesas de investimento	17.825,02 €	- €	- €	- €	0%
Sub-Total	**359.775,02 €**	**- €**	**5.267,72 €**	**5.267,72 €**	**1%**
Recursos Humanos	203.251,00 €	- €	39.122,24 €	39.122,24 €	19%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	288.649,00 €	- €	54.371,10 €	54.371,10 €	19%
Aquisição de Serviços e manutenção	179.924,00 €	- €	14.790,01 €	14.790,01 €	8%
Outras despesas correntes	56.000,00 €	- €	1.296,67 €	1.296,67 €	2%
Sub-Total	**727.824,00 €**	**- €**	**109.580,02 €**	**109.580,02 €**	**15%**
Investimento Total	**1.087.599,02 €**	**- €**	**114.847,74 €**	**114.847,74 €**	**11%**

Área de Intervenção 7 – Tecido Produtivo

As empresas da região já executaram 19% do seu orçamento, apesar dos 16 Projectos do 2º Concurso, cujo orçamento corresponde a 30% do orçamento total desta Área de Intervenção, apenas terem o seu início em 2005.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 7:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado			% Execução
		2003	2004	Total	
Equipamento	680.555,80 €	32.664,85 €	136.813,28 €	169.478,13 €	25%
Outras despesas de investimento	89.356,00 €	- €	2.834,89 €	2.834,89 €	3%
Sub-Total	**769.911,80 €**	**32.664,85 €**	**139.648,17 €**	**172.313,02 €**	**22%**
Recursos Humanos	511.893,00 €	10.437,68 €	65.677,37 €	76.115,05 €	15%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	991.493,20 €	25.956,27 €	157.252,01 €	183.208,28 €	18%
Aquisição de Serviços e manutenção	516.532,00 €	36.653,24 €	77.377,04 €	114.030,28 €	22%
Outras despesas correntes	95.073,00 €	- €	311,49 €	311,49 €	0%
Sub-Total	**2.114.991,20 €**	**73.047,19 €**	**300.617,91 €**	**373.665,10 €**	**18%**
Investimento Total	**2.884.903,00 €**	**105.712,04 €**	**440.266,08 €**	**545.978,12 €**	**19%**

Área de Intervenção 8 – Informação, Cultura e Lazer

Os Projectos associados a esta Área de Intervenção já executaram 29% do orçamento, destacando-se o investimento em equipamento.

O quadro seguinte mostra a execução financeira da Área de Intervenção 8:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado			% Execução
		2003	2004	Total	
Equipamento	973.151,00 €	- €	448.402,85 €	448.402,85 €	46%
Outras despesas de investimento	68.251,74 €	- €	1.275,00 €	1.275,00 €	2%
Sub-Total	**1.041.402,74 €**	**- €**	**449.677,85 €**	**449.677,85 €**	**43%**
Recursos Humanos	381.744,99 €	496,32 €	64.813,14 €	65.309,46 €	17%
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	499.271,52 €	- €	114.193,67 €	114.193,67 €	23%
Aquisição de Serviços e manutenção	484.316,25 €	- €	81.009,90 €	81.009,90 €	17%
Outras despesas correntes	79.354,36 €	418,03 €	1.327,55 €	1.745,58 €	2%
Sub-Total	**1.444.687,12 €**	**914,35 €**	**261.344,26 €**	**262.258,61 €**	**18%**
Investimento Total	**2.486.089,86 €**	**914,35 €**	**711.022,11 €**	**711.936,46 €**	**29%**

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

FLUXO FINANCEIRO POSI – PROGRAMA AVEIRO DIGITAL 2003-2006

Durante o ano de 2004, realizou-se a segunda, terceira, quarta e quinta Apresentações de Despesas Aveiro Digital 2003-2006 ao POSI, no valor total de 5.332.663,86€, o que acrescido dos 173.726,72€ referentes à primeira apresentação de despesas Aveiro Digital 2003-2006, realizada em 2003, dá o valor total de despesas apresentadas até ao momento de 5.506.390,58€:

- 2ª Apresentação de Despesas – Realizada em 16 de Fevereiro, num montante de despesas apresentadas de 181.033,30 €;
- 3ª Apresentação de Despesas – Realizada em 17 de Junho, num montante de despesas apresentadas de 1.168.682,94 €;
- 4ª Apresentação de Despesas – Realizada em 19 de Outubro, num montante de despesas apresentadas de 2.144.363,67 €;
- 5ª Apresentação de Despesas – Realizada em 20 de Dezembro, num montante de despesas apresentadas de 1.838.583,95 €.

O Quadro seguinte mostra o fluxo de caixa semestral entre o POSI e o Programa Aveiro Digital:

Período	Despesa Apresentada Acumulada	Comparticipação Finan. Deduzida das Retenções	Valor Recebido Acumulado	Saldo do Semestre
1º Semestre 2003	- €	- €	- €	- €
2º Semestre 2003	173.726,72 €	122.865,92 €	78.047,59 €	44.818,33 €
1º Semestre 2004	1.523.442,96 €	1.059.675,55 €	237.174,15 €	822.501,40 €
2º Semestre 2004	5.506.390,58 €	3.824.155,63 €	2.151.071,32 €	1.673.084,31 €

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2005 E 2006

Tendo em conta o desenvolvimento dos 78 Projectos Aveiro Digital 2003-2006, prevê-se a seguinte calendarização da execução do Orçamento da Medida 2.3 - FEDER do Programa Aveiro Digital 2003-2006:

Rubrica Orçamental	2003	2004	2005	2006	Total
Equipamento	60.015,20 €	2.557.165,99 €	2.317.124,54 €	381.909,07 €	5.316.214,80 €
Outras despesas de investimento	719,96 €	64.808,54 €	401.500,96 €	147.983,30 €	615.012,76 €
Sub-Total	**60.735,16 €**	**2.621.974,53 €**	**2.718.625,50 €**	**529.892,37 €**	**5.931.227,56 €**
Recursos Humanos	183.346,42 €	882.599,40 €	1.830.133,94 €	1.743.860,29 €	4.639.940,05 €
Aquisição de Serviços de desenvolvimento de software e integração	31.113,03 €	910.682,16 €	2.049.941,09 €	973.474,44 €	3.965.210,72 €
Aquisição de Serviços e manutenção	151.542,21 €	641.862,88 €	2.042.131,51 €	1.858.203,87 €	4.693.740,47 €
Outras despesas correntes	6.244,67 €	16.290,12 €	363.547,24 €	383.799,17 €	769.881,20 €
Sub-Total	**372.246,33 €**	**2.451.434,56 €**	**6.285.753,78 €**	**4.959.337,77 €**	**14.068.772,44 €**
Total	**432.981,49 €**	**5.073.409,09 €**	**9.004.379,28 €**	**5.489.230,14 €**	**20.000.000,00 €**

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÕES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AVEIRO DIGITAL

Considerando a dimensão geográfica do Programa Aveiro Digital 2003-2006 e o modelo de gestão partilhado, entre a Associação Aveiro Digital e a Associação de Municípios da Ria, o ano 2004 confirmou que a conjugação de vontades, o alinhamento de objectivos e a complementaridade de competências destas duas entidades, foram factores decisivos para a qualificação da Gestão do Programa Aveiro Digital e da sua Execução.

No último trimestre de 2004, o Programa Aveiro Digital 2003-2006, atingiu a sua plena dimensão, com todo o orçamento comprometido em 78 Projectos que envolvem 223 Entidades Beneficiárias, tendo já executado 5,5M€, o que corresponde a 25% do seu orçamento total.

A Comissão Executiva Aveiro Digital considera que os produtos e serviços, resultantes dos 78 Projectos em curso, vão contribuir directamente para qualificar as pessoas e os serviços na Região e que os métodos de gestão e de trabalho onde participam directamente 560 pessoas, com um volume de trabalho de 4.195 HM, vão indirectamente contribuir para qualificar as organizações envolvidas.

No entanto a capacidade de manter a execução do Programa Aveiro Digital 2003-2006 com elevados níveis de rigor e qualidade operacional depende fortemente da resposta atempada aos compromissos financeiros assumidos pela CEAD e pelo POSI com as Entidades Beneficiárias responsáveis pela execução dos Projectos.

A Comissão Executiva Aveiro Digital considera que no ano 2004 se atingiram os objectivos maiores planeados e que estão assim criadas as condições fundamentais para responder com êxito aos compromissos assumidos com o POSI até Dezembro de 2006.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Capítulo 3

Programa Aveiro Digital 2003-2006
POSI 402/2.4/C/CEN
Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação
Relatório de Progresso Material e Financeiro - 2004

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Relatório de Progresso Material e Financeiro - 2004 da Medida 2.4 - Acções Integradas de Formação é da responsabilidade da Comissão Executiva Aveiro Digital e tem como objectivo descrever e documentar as actividades desenvolvidas entre 1 Janeiro e 31 Dezembro de 2004, no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003-2006.

Dada a natureza dos Projectos enquadrados no Programa Aveiro Digital, a Formação é uma necessidade associada ao treino dos agentes que vão operar os sistemas e serviços desenvolvidos em cada Projecto.

Com um modelo de execução associado aos Serviços e Aplicações, desenvolvidas no âmbito dos 78 Projectos Aveiro Digital, a CEAD considera que estão consolidadas todas as condições para atingir a execução plena desta Medida.

Este documento contempla o enquadramento da Formação no Programa Aveiro Digital 2003-2006 e a descrição do seu Modelo de Execução. Em seguida descreve-se o Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital - SAVAD, com particular detalhe na área de Gestão da Formação.

Finalmente é analisada a Execução Material e Financeira da Medida 2.4 - Acções Integradas de Formação e apresentam-se as conclusões e as perspectivas de execução desta Medida.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ENQUADRAMENTO DA FORMAÇÃO NO PROGRAMA AVEIRO DIGITAL

O Programa Aveiro Digital 2003-2006 assume-se como um motor do desenvolvimento social, económico e cultural, perspectivando a modernização dos serviços e a qualificação das pessoas na região da Associação de Municípios da Ria.

A gestão deste Programa é da responsabilidade conjunta da AAD – Associação Aveiro Digital e da AMRIA – Associação de Municípios da Ria e a sua execução é, fundamentalmente, baseada na contratualização dos Projectos seleccionados através de Concursos Públicos e apresentados pelas entidades adequadas e beneficiárias em cada Área de Intervenção.

O modelo de execução reflecte métodos e formatos já consolidados, assumindo uma natureza claramente matricial:

- A direcção operacional dos Projectos enquadrados na Área "Comunidade Digital" é da responsabilidade directa da Comissão Executiva do Programa, pois estes Projectos constituem os investimentos estruturantes de alinhamento e alavanca de todo o Programa.
- A direcção operacional dos Projectos enquadrados nas restantes Áreas de Intervenção é da responsabilidade dos agentes respectivos, que através de Concurso Público, se comprometem pela sua execução perante a Comissão Executiva do Programa Aveiro Digital.

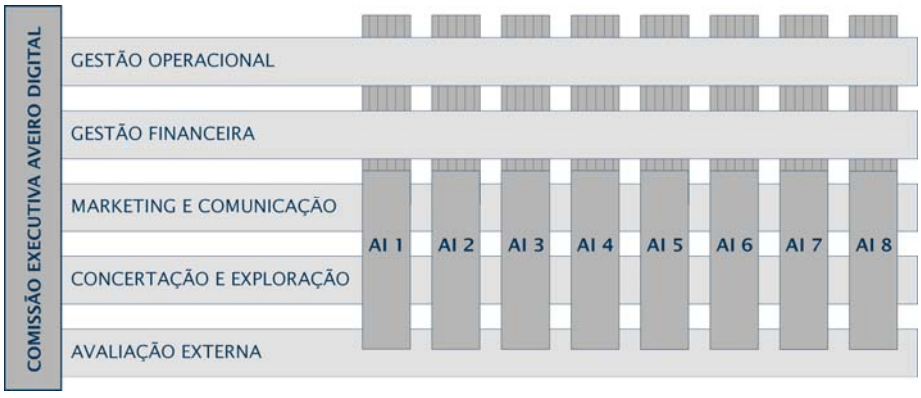

Através dos dois Concursos Públicos foram seleccionados 72 Projectos, abrangendo todas as Áreas de Intervenção do Programa Aveiro Digital 2003-2006.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

O Programa Aveiro Digital 2003-2006 é financiado pelo POSI através de 3 Medidas distintas:

- Medida 1.1 – Competências Básicas
- Medida 2.3 – Projectos Integrados: das Cidades Digitais ao Portugal Digital
- Medida 2.4 – Acções integradas de formação

A visão integrada da execução das 3 Medidas obrigou a um esforço de harmonização de procedimentos, com o objectivo de minimizar a complexidade da execução e gestão de três Medidas distintas no âmbito de cada Projecto Aveiro Digital.

A harmonização da execução das 3 Medidas, foi conseguida através da concepção de um modelo para o Plano Técnico e Financeiro como referência base das Candidaturas e que após a selecção e aprovação dos Projectos se assumiu como compromisso de execução de cada Projecto onde constam todos os resultados técnicos e respectivos orçamentos que as Entidades Beneficiárias contratualizaram com a CEAD.

A estrutura do Plano Técnico e Financeiro contempla quatro tarefas mandatórias: Gestão, Concertação, Avaliação e Formação. A Tarefa D - Formação tem um formato especificamente orientado para os requisitos do FSE na identificação da Formação a executar.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

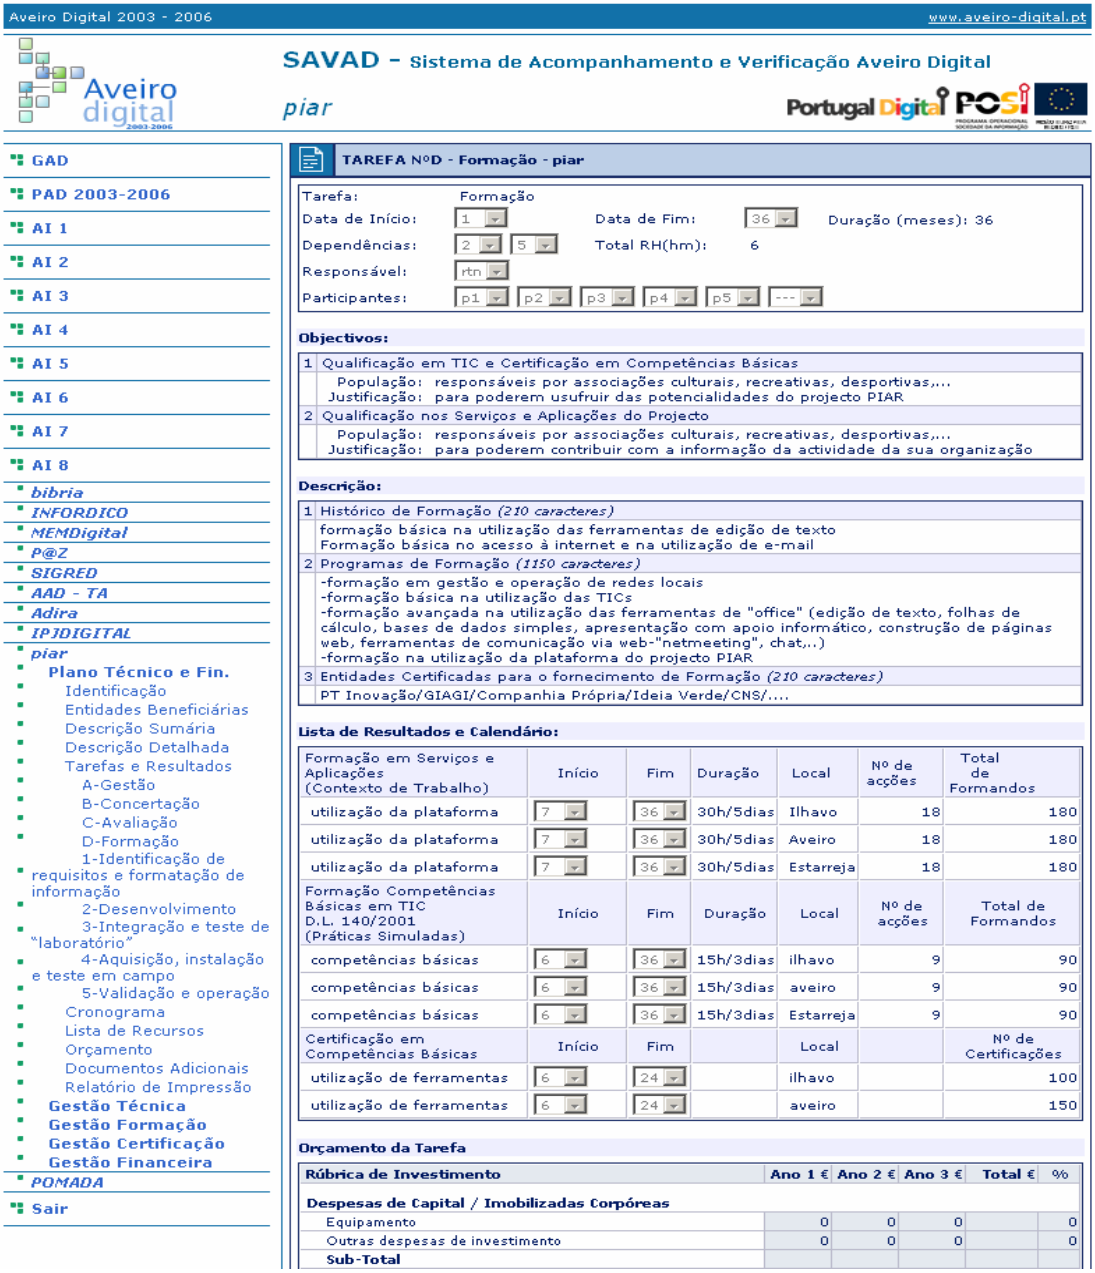

Plano Técnico e Financeiro: Tarefa D – Formação

Dada a natureza dos Projectos enquadrados no Programa Aveiro Digital, a Formação é uma necessidade associada ao treino dos agentes que vão operar os sistemas e serviços desenvolvidos em cada Projecto.

A Formação faz assim parte do sistema de qualificação das organizações que se modernizam com os investimentos comprometidos nos Projectos Aveiro Digital.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Assim, contemplam-se duas tipologias de Formação: em Serviços e Aplicações desenvolvidas no âmbito dos Projectos e a Formação em Tecnologias da informação e Comunicação.

Esta segunda tipologia só é justificada quando agregada e como suporte à primeira, que representa a qualificação fundamental.

O peso do orçamento da Tarefa D – Formação foi estabelecido à partida dentro de um intervalo aberto entre os 9,5% e os 10,5% do orçamento global do Projecto, sendo a tipologia de despesa também limitada à aquisição de serviços externos de Formação, devendo as Entidades Formadoras estar Certificadas para o efeito.

O Papel da CEAD neste processo é de acompanhar e verificar a execução qualificada dos planos de formação comprometidos pelos Projectos.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SAVAD: GESTÃO DA FORMAÇÃO

Integrada no Sistema SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital, foi criada uma área de Gestão da Formação que implementa os procedimentos de gestão, informação e controlo do FSE e contempla as seguintes funcionalidades:

- Gestão da Formação: Menu inicial

Nesta página encontram-se todos os relatórios relativos às diversas Acções de Formação já realizadas, podendo-se imprimir esses relatórios.

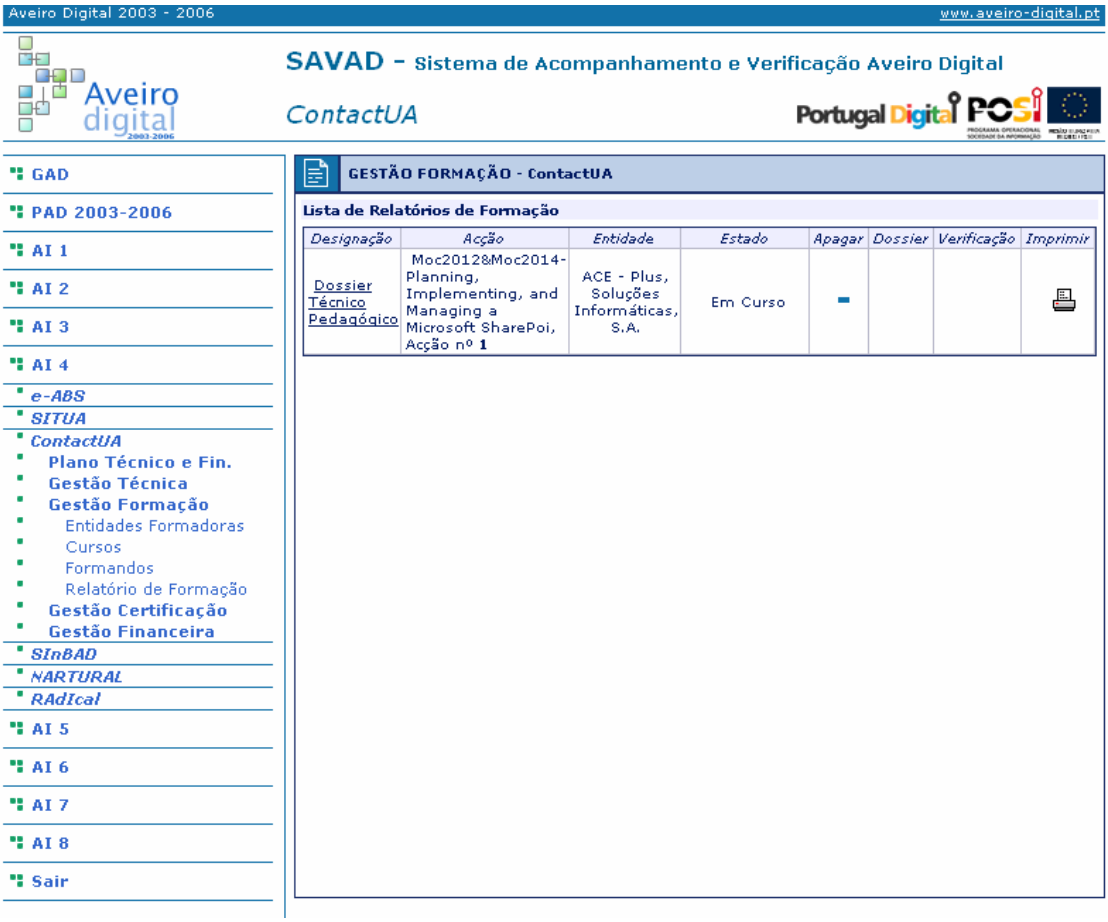

Gestão da Formação: Menu inicial

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

- Gestão da Formação: Entidades Formadoras

A identificação das entidades formadoras contratadas para prestarem serviços de formação é inserida nesta área de trabalho pela Entidade Beneficiária Principal.

A EBP pode atribuir um login e uma *password* a cada Entidade Formadora, para que esta seja responsável pela introdução da informação e dos documentos exigidos pela regulamentação do financiamento FSE.

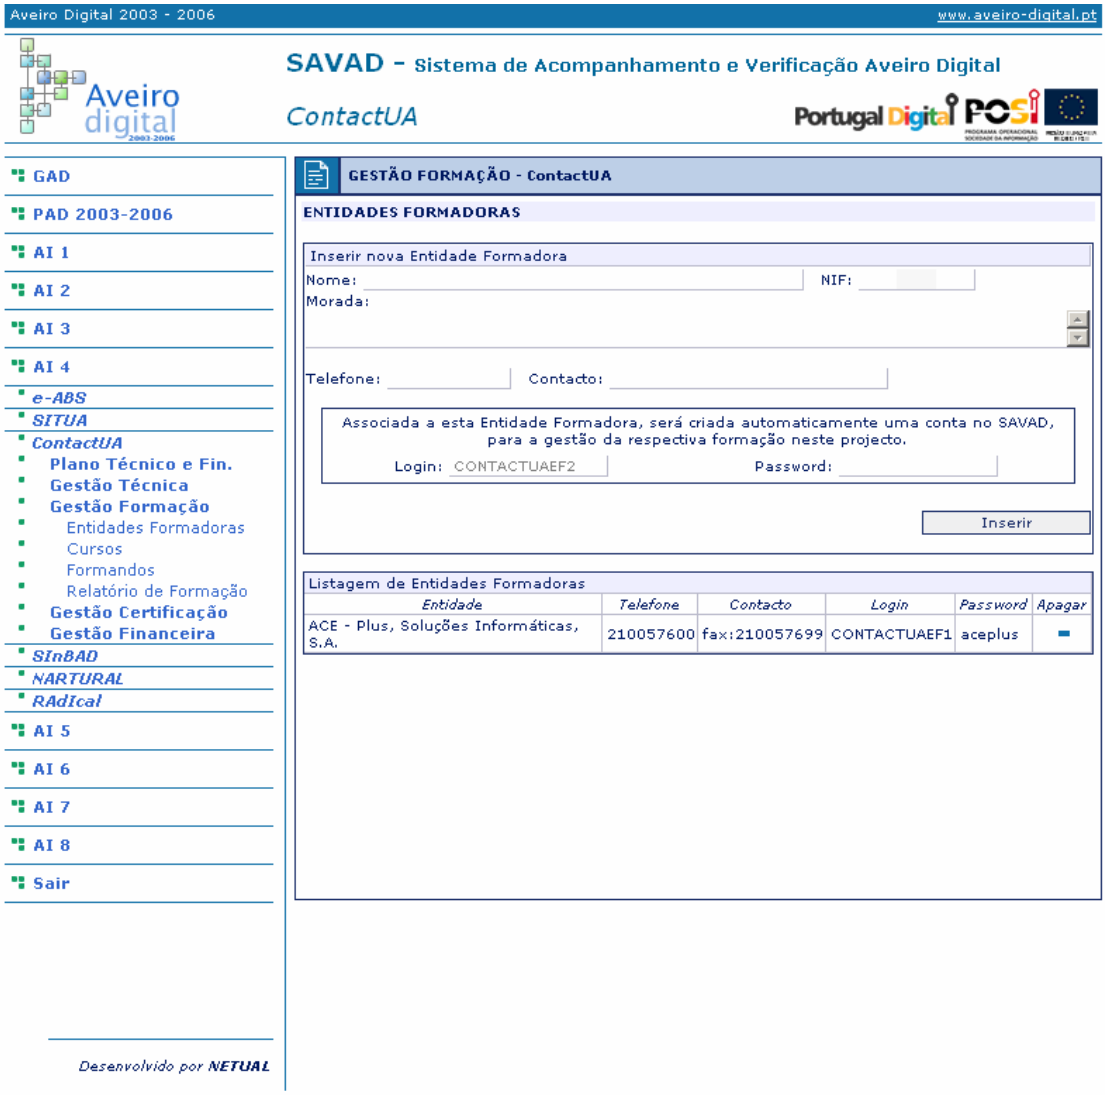

Gestão da Formação: Entidades Formadoras

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

- Gestão da Formação: Cursos

A informação relativa aos Cursos e respectivas Acções de Formação é inserida nesta área de trabalho. Todos os Cursos têm de ser associadas a uma Entidade Formadora, previamente definida.

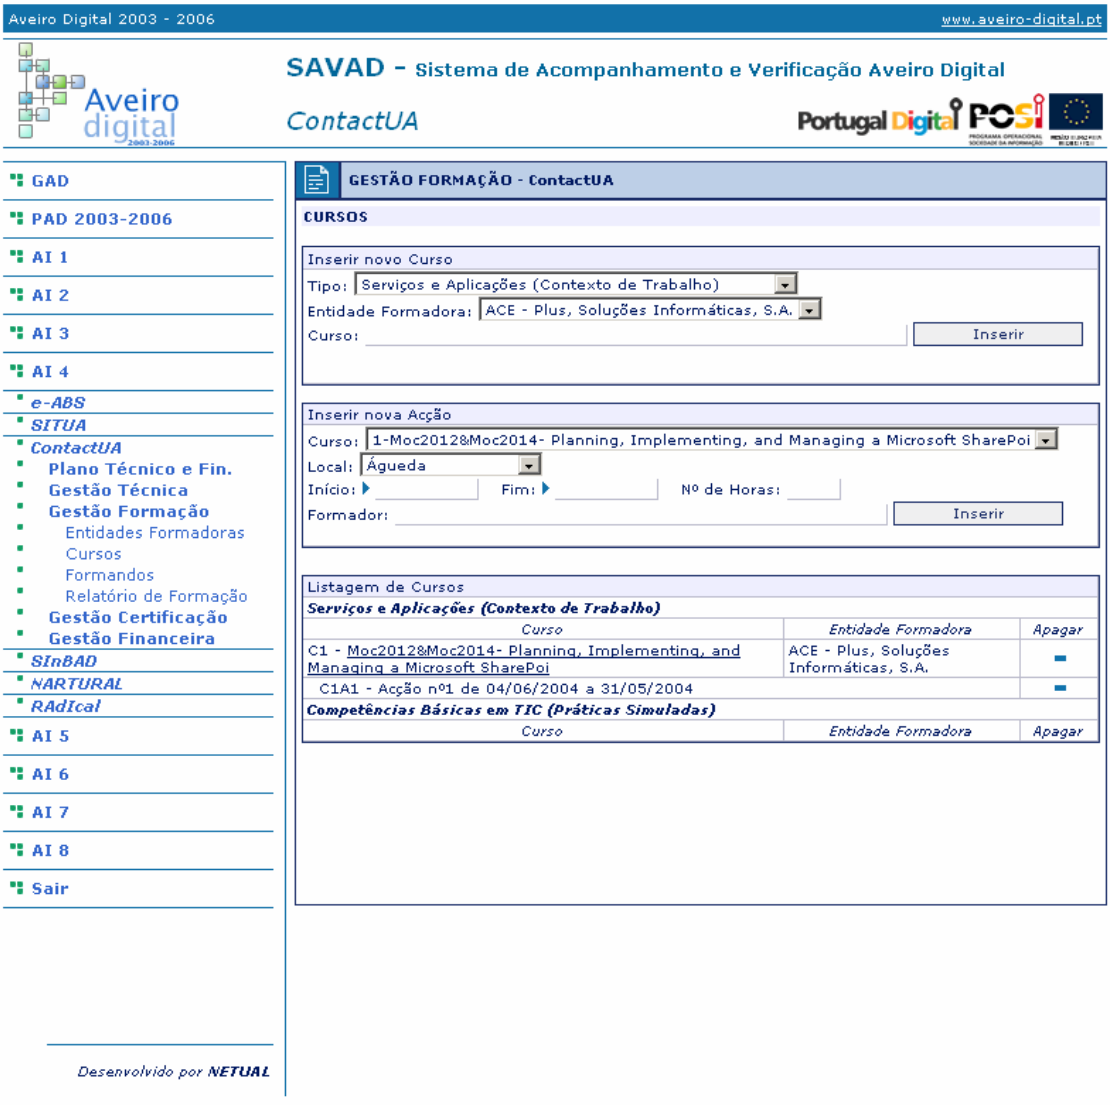

Gestão da Formação: Cursos

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

- Gestão da Formação: Formandos

A informação obrigatória pela regulamentação FSE associada à identificação e caracterização dos Formandos associados a cada Acção de Formação é inserida nesta área de trabalho.

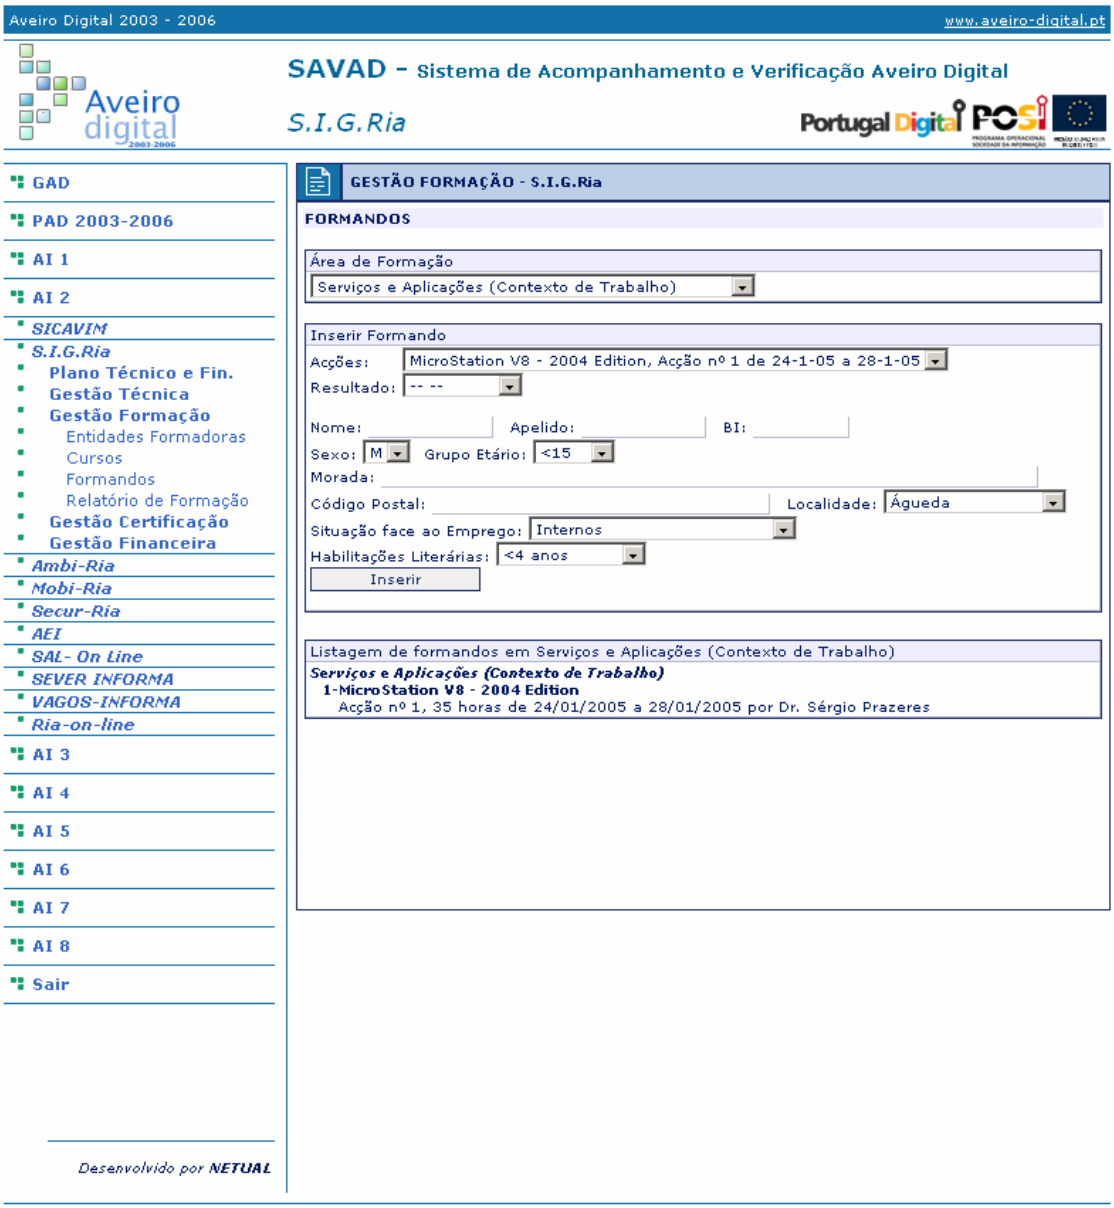

Gestão da Formação: Formandos

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

- Gestão da Formação: Relatórios de Formação

O Dossier Técnico e Pedagógico produzido por cada Acção de Formação, de acordo com a Portaria 799-B/2000, de 20/09, é inserido nesta área de trabalho.

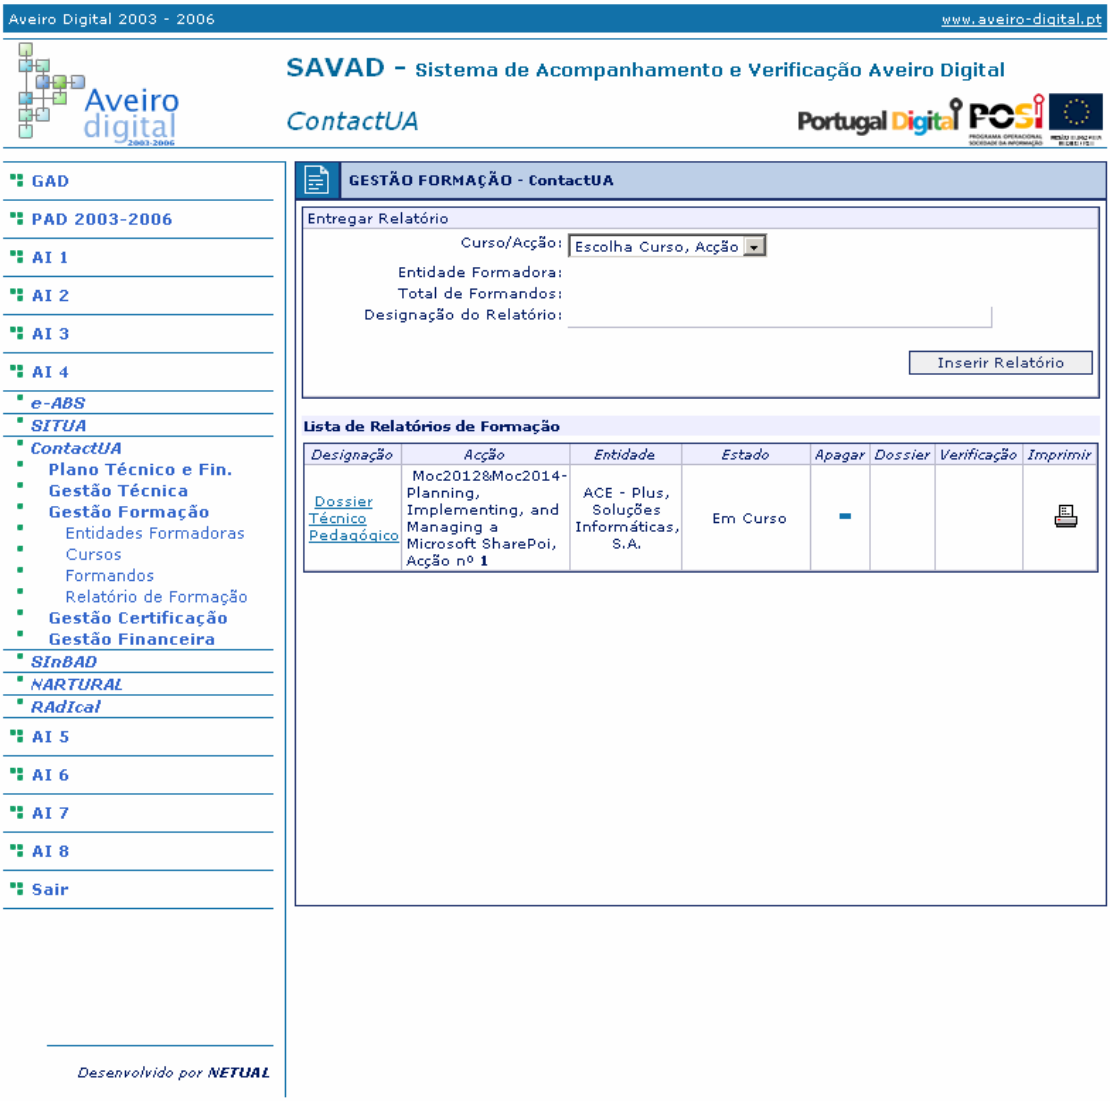

Gestão da Formação: Relatório de Formação

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MATERIAL

Os compromissos de Formação assumidos pelos 72 Projectos em curso envolvem directamente 20.026 formandos: 9.876 em Serviços e Aplicações desenvolvidos no âmbito dos Projectos e 10.150 em Competências Básicas. O Volume de Formação comprometido é de 448.530 horas, das quais 296.280 são em Formação em Serviços e Aplicações e 152.250 em TIC. O orçamento global para Formação é de 1.807.993€.

De seguida, evidencia-se o compromisso de Formação por Área de Intervenção e Projecto.

ÁREA DE INTERVENÇÃO 2: AUTARQUIAS E SERVIÇOS CONCELHIOS

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 2 vai qualificar directamente 7.125 pessoas, através de 99.090 horas de formação em Serviços e Aplicações e 57.330 horas em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 532.500€.

SICAVIM, Ref. PAD 017	**Orçamento**	**45.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Módulo 1 – Aquisição e processamento de informação cadastral em SIG	1	9
Módulo 2 – Estruturação e manutenção de bases de dados cadastrais	1	9
Módulo 3 – Utilização, actualização e manutenção do sistema	2	18
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Módulo 4 – Competências básicas em TIC	12	192
S.I.G.RIA, Ref. PAD 001	**Orçamento**	**226.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Formação em Gestão de Sistemas Operativos Cliente / Servidor	2	6
Formação em Gestão de Redes Microsoft	2	6
Formação em Segurança de Redes de Dados	2	6
Formação em Aquisição e Edição de Dados em SIG	1	12
Formação em Geodesia e Sistemas de Coordenadas	1	12
Formação em Estruturação de Bases de Dados	1	12
Formação em Manutenção de Cartografia Digital	1	12
Formação em Análise Espacial em SIG	1	12
Formação específica no software adquirido	10	105
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação em TIC	15	100
Ambi-Ria, Ref. PAD 140	**Orçamento**	**47.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Aplicação Ambi-Ria fase 1	2	48
Aplicação Ambi-Ria fase 2	2	48
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação em CBTIC	2	48
Formação em CBTIC	2	48

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Mobi-Ria, Ref. PAD 138	**Orçamento**	**40.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Aplicação Mobi-Ria fase 1	2	24
Aplicação Mobi-Ria fase 2	2	24
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação em CBTIC	2	24
Formação em CBTIC	2	24
Secur-Ria, Ref. PAD 101	**Orçamento**	**47.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Aplicação Secur-Ria fase 1	2	48
Aplicação Secur-Ria fase 2	2	48
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação em CBTIC	2	48
Formação em CBTIC	2	48
AEI, Ref. PAD 020	**Orçamento**	**37.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Operação Back e Front offices	12	380
Operação Interacção transacção	12	380
Operação e Manutenção Técnica	12	6
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas TIC	30	870
SAL- On Line, Ref. PAD 016	**Orçamento**	**60.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Operação Back e Front offices	25	400
Operação Interacção transacção	25	400
Operação e Manutenção Técnica	6	14
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas TIC	50	1000
SEVER INFORMA, Ref. PAD 023	**Orçamento**	**12.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Operação Back e Front offices	4	30
Operação Interacção transacção	4	30
Operação e Manutenção Técnica	4	2
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas TIC	10	120
VAGOS-INFORMA, Ref. PAD 018	**Orçamento**	**12.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Operação Back e Front offices	4	50
Operação Interacção transacção	4	50
Operação e Manutenção Técnica	4	2
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas TIC	10	200
Ria-on-line, Ref. PAD 141	**Orçamento**	**4.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Formação Portal Regional	11	550
Formação Portal Regional	11	550
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação em CB EIAD	11	550
Formação em CB EIAD	11	550

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 3: ESCOLAS E COMUNIDADES EDUCATIVAS

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 3 vai qualificar directamente 4.422 pessoas, através de 69.480 horas de formação em Serviços e Aplicações e 31.590 horas em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 179.000€.

e-RIA, Ref. PAD 060	**Orçamento**	**84.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Gestão e manutenção de redes	1	104
Aplicações de Back-Offices	4	156
Aplicações de Front-Offices	1	104
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas	6	104
Formação Competências Básicas	10	200
Formação Competências Básicas	40	800
PorMat, Ref. PAD 067	**Orçamento**	**30.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Software PorMat	1	15
Software PorMat	1	15
Professor, Ref. PAD 145	**Orçamento**	**12.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Formação de e-formadores	3	36
Formação de e-formadores	3	36
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas	6	72
Formação Competências Básicas	15	240
e-CMEI, Ref. PAD 022	**Orçamento**	**12.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Utilização da plataforma	11	50
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas	12	250
Ria.EDU, Ref. PAD 006	**Orçamento**	**40.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Caderneta & Dossier	60	1200
Produção Materiais WEB I	20	400
Produção Materiais WEB II	10	200
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Windows; Word	11	220
Internet; e-mail	11	220

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 4: UNIVERSIDADE E COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 4 vai qualificar directamente 320 pessoas, através de 5.280 horas de formação em Serviços e Aplicações e 2.160 horas em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 198.308€.

e-ABS, Ref. PAD 008	**Orçamento**	**9.316€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
e-ABS	2	32
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Office	1	16
SITUA, Ref. PAD 009	**Orçamento**	**102.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Aplicações várias	20	16
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Office	14	16
ContactUA, Ref. PAD 010	**Orçamento**	**20.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Qualificação em Serviços e Aplicações do projecto	1	16
Qualificação em Serviços e Aplicações do projecto	1	16
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Office	4	64
SInBAD, Ref. PAD 012	**Orçamento**	**30.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Aplicações várias	4	16
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Office	7	16
NARTURAL, Ref. PAD 108	**Orçamento**	**20.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Fotografia Digital	1	16
Vídeo Digital	1	16
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Módulo de formação	2	16
RAdIcal, Ref. PAD 014	**Orçamento**	**16.492€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Uso e gestão do RAdIcal	1	16
Uso do Didaktos	1	16
Gestão Avançada do RAdIcal	2	16
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Módulo de formação	2	16

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 5: SERVIÇOS DE SAÚDE

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 5 vai qualificar directamente 780 pessoas, através de 13.800 horas de formação em Serviços e Aplicações e 4.800 horas em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 162.500€.

RDSR, Ref. PAD 039	**Orçamento**	**80.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Prática utilização e métodos telediagnóstico	30	30
Prática utilização e métodos telediagnóstico	30	30
Melhoria das técnicas de telediagnóstico	60	60
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Qualificação competências TIC	10	50
Qualificação competências TIC	10	50
RTS, Refª PAD 071	**Orçamento**	**82.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Utilização do Portal da Saúde	11	220
Utilização da Intranet (PCE)	5	100
Formação em BHP	1	20
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação em Competências Básicas	9	180
Formação em Competências Básicas	2	40

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 6: SOLIDARIEDADE SOCIAL

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 6 vai qualificar directamente 487 pessoas, através de 7.380 horas de formação em Serviços e Aplicações e 3.615 horas em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 122.350€.

SAISS, Ref. PAD 015	**Orçamento**	**75.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
STC	4	80
SIDEI	1	20
SSAD	1	15
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Qualificação em TIC - utentes	1	6
Qualificação em TIC - utentes	1	6
Estar, Ref. PAD 128	**Orçamento**	**8.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Uso de meios Audiovisuais e Técnico Pedagógicos	1	14
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Introdução ao windows	1	10
Internet e correio electrónico	1	10
Word	1	10
SAD-SOS, Refª PAD 102	**Orçamento**	**4.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Windows XP	1	12
Office XP	1	12
Formação em Call Center	1	6
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Diploma Competências Básicas	10	100
Incluinet, Ref. PAD 132	**Orçamento**	**10.100€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
As TIC nos audiovisuais - sua utilização	1	12
As novas ferramentas de comunicação	1	12
Construção de Páginas WEB	1	12
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Introdução ao Windows	1	12
Word	1	12
Internet e Correio Electrónico	1	12
ISSI, Ref. PAD 133	**Orçamento**	**14.250€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Técnicos Instituições	1	9
Idosos	1	9
Info-excluídos geral	2	9
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Técnicos Instituições	1	9
Idosos	1	18
Info-excluídos geral	2	36
AMRIASocial, Ref. PAD 113	**Orçamento**	**11.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Gestor de conteúdos	3	24

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 7: TECIDO PRODUTIVO

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 7 vai qualificar directamente 3.036 pessoas, através de 38.940 horas de formação em Serviços e Aplicações e 26.070 horas em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 343.355€.

Geo-MKT, Ref. PAD 029	**Orçamento**	**14.983€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Tecnologia e Gestão de ZING	2	50
Parâmetros localização de ZING	2	50
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Competências Básicas em TIC	4	100
TIC & TU, Ref. PAD 112	**Orçamento**	**16.281€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Tratamento da informação	5	5
Utilização de back-office	5	5
Gestão e disponibilização de serviços	15	150
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Introdução às TIC	1	3
GeoInvest, Ref. PAD 027	**Orçamento**	**30.780€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Formação no Sistema GeoInvest	2	14
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Competências Básicas em TIC	1	14
abdigital, Ref. PAD 106	**Orçamento**	**12.267€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Serviços de FrontOffice e BackOffice	1	15
Serviços e aplicações desenvolvidas	1	15
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas	2	30
ABS XXI, Ref. PAD 036	**Orçamento**	**5.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Sistemas Informática/Gestão	1	15
Plataforma de serviços	2	30
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas	4	60
ATLETICA, Ref. PAD 139	**Orçamento**	**5.200€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Funcionamento da aplicação	2	10
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Competências Básicas	3	60
Braxen, Ref. PAD 115	**Orçamento**	**4.410€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Sistemas Informática/Gestão	1	15
Plataforma de serviços	2	30
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas	2	30

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

CADERNO DIGITAL, Ref. PAD 147	**Orçamento**	**5.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Aplicações On-Line	1	7
Zona de Teletrabalho	1	7
Gestor de Conteúdos	1	7
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação em Competências Básicas	1	7
Formação em Competências Básicas	1	7
Formação em Competências Básicas	1	7
Com.Web, Ref. PAD 137	**Orçamento**	**4.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Intranet / Extranet	1	10
Plataforma de teletrabalho	1	5
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Autoaprendizagem com elearning	2	5
DigiPot, Ref. PAD 119	**Orçamento**	**4.830€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Sistemas Informática/Gestão	1	15
Plataforma de serviços	2	30
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas	3	45
Digivacas, Ref. PAD 064	**Orçamento**	**10.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Formação Contrastadores	4	32
Formação Pessoal Administrativo	1	5
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação aos Criadores	15	315
e-NTL, Ref. PAD 069	**Orçamento**	**4.100€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Gestão documental	1	15
Gestão e Produção	1	15
Qualidade nos serviços	1	15
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação em Competências Básicas	3	45
e-SI, Ref. PAD 123	**Orçamento**	**6.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Formação em serviços	1	20
Estag, Ref. PAD 033	**Orçamento**	**3.408€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Sistemas Informática/Gestão	1	15
Plataforma de serviços	1	10
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas	2	30
Extraplas, Ref. PAD 110	**Orçamento**	**4.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Extranet	1	30
Sistema de Controlo de Produção	1	30
Sistema de Controlo de Tarefas	1	30

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

FIG-NET, Ref. PAD 031	**Orçamento**	**3.550€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Sistemas Informática/Gestão	1	15
Plataforma de serviços	1	10
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas	2	30
GALILEU - DIAG, Ref. PAD 148	**Orçamento**	**4.600€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Utilização da aplicação	1	4
Serviço de Excelência	1	4
Instalação da aplicação	1	4
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Colaboradores	1	4
HMC, Ref. PAD 042	**Orçamento**	**9.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Novas ferramentas	1	13
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Internet, busca e email	1	13
Imagem XXI, Ref. PAD 118	**Orçamento**	**4.704€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Sistemas Informática/Gestão	1	15
Plataforma de serviços	1	15
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas	2	30
Inovortal, Ref. PAD 032	**Orçamento**	**9.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Formação em serviços do Centro	1	20
Formação em e_Commerce	1	20
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Auto aprendizagem usando e-learning		200
JFD, Ref. PAD 117	**Orçamento**	**4.914€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Sistemas Informática/Gestão	1	15
Plataforma de serviços	2	30
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas	3	45
MARC, Ref. PAD 117	**Orçamento**	**14.055€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Aplicações de Gestão Documental	3	30
Aplicações de Planeamento em T	3	30
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Competências Básicas	8	88
ONDA, Ref. PAD 021	**Orçamento**	**17.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Gestão Clientes	2	2
Gestão Interna	1	2
Processo Produtivo	1	2
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Internet	1	2
E-Mail	1	2
Sistemas Operativos	1	3

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

RED - AVEIRO, Ref. PAD 072	**Orçamento**	**19.278€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
e-working	8	74
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Internet nas empresas	8	74
SANI, Ref. PAD 047	**Orçamento**	**50.975€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Formação específica do sistema	15	150
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Windows, Internet, busca, e-mail	10	100
SEMIAR, Ref. PAD 130	**Orçamento**	**4.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Aplicação integrada	2	26
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Competências Básicas	2	40
SIPA, Ref. PAD 026	**Orçamento**	**30.600€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Sistema Informático - Gestão Financeira	2	20
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Competências Básicas em TIC	8	80
SMIA, Ref. PAD 052	**Orçamento**	**8.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Aplicação SMIA	3	20
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas em TIC	3	45
Formação Competências Básicas em TIC	3	45
Formação Competências Básicas em TIC	4	60
TUP, Ref. PAD 044	**Orçamento**	**19.750€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
E-business	1	5
Execução de Encomendas e Symix	1	8
Centralgest	1	11
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Windows, Word, Internet	5	100
Uebe.SI, Ref. PAD 103	**Orçamento**	**4.150€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Formação intranet/extranet	2	10
Plataforma de teletrabalho	2	10
Gestão de projectos	1	5
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Auto aprendizagem e-learning	1	3
VLM-Online, Ref. PAD 104	**Orçamento**	**3.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Formação em Intranet	1	10
Formação em Extranet	1	10
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Auto aprendizagem usando e-learning	1	10
Web-IVE, Ref. PAD 129	**Orçamento**	**3.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Formação em aplicações desenvolvidas	2	6
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação em Competências Básicas	2	6

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ÁREA DE INTERVENÇÃO 8: INFORMAÇÃO, CULTURA E LAZER

A Formação comprometida pelos Projectos da Área de Intervenção 8 vai qualificar directamente 3.856 pessoas, através de 62.310 horas de formação em Serviços e Aplicações e 26.685 horas em TIC. O orçamento total da formação nesta Área é de 270.000€.

bibria, Ref. PAD 066	**Orçamento**	**32.300€**
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Windows, Word e Internet	1	14
Windows, Word e Internet	1	14
Software Biblioteca Digital	3	14
INFORDICO, Ref. PAD 024	**Orçamento**	**39.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Operação BackOffice	25	400
Operação Front-Offices	45	600
Operação e manutenção Técnica	6	24
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas TIC	50	1000
MEMDigital, Ref. PAD 055	**Orçamento**	**20.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Ferramentas de Pesquisa e Arquivo Documental	3	12
Ferramentas multimédia de Apoio Visitante	3	12
Operação e Manutenção Técnica	1	4
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação Competências Básicas TIC	20	200
P@Z, Ref. PAD 050	**Orçamento**	**8.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Princípios de Informática	1	20
Princípios de Internet	1	20
Princípios de e-mail	1	20
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Word, Excel	1	20
Internet Explorer	1	20
Outlook	1	20
MUSEAVE, Ref. PAD 107	**Orçamento**	**6.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
BackOffice	1	6
Tratamento de imagem	1	6
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Recursos Humanos -MUSEA	1	12
SIGRED, Ref. PAD 114	**Orçamento**	**12.200€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Considerações Básicas Internet	3	45
Aplicações MS Office	4	45
Tratamento Digital de Informação	1	15
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação em competências Básicas	3	45
Formação em competências Básicas	4	45
Formação em competências Básicas	4	45

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

AAD - TA, Ref. PAD 038	**Orçamento**	**44.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
BackOffice	3	12
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Recursos Humanos - TA	24	12
Adira, Ref. PAD 114	**Orçamento**	**32.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Internet	2	32
Tratamento de Imagem	2	32
Gestão Web de Serviços	2	32
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Formação em competências Básicas	1	16
Formação em competências Básicas	1	16
Formação em competências Básicas	1	16
IPJDIGITAL, Ref. PAD 120	**Orçamento**	**7.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Administração e Gestão BackOffice do Portal	10	100
piar, Ref. PAD 003	**Orçamento**	**65.000€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Utilização da plataforma	18	180
Utilização da plataforma	18	180
Utilização da plataforma	18	180
Formação Competências Básicas em TIC (Práticas Simuladas)		
Competências Básicas	9	90
Competências Básicas	9	90
Competências Básicas	9	90
POMADA, Ref. PAD 136	**Orçamento**	**3.500€**
Formação em Serviços e Aplicações (Contexto de Trabalho)	**Número de Acções**	**Total de Formandos**
Gestão de Projectos - Desenvolvimento	2	2
Inserção conteúdos off/on-line	4	96
Formação Pedagógica	1	2

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

A Medida 2.4 é executada exclusivamente pelos 72 Projectos seleccionados no âmbito dos dois concursos Aveiro Digital 2003-2006, estando o seu orçamento completamente comprometido, sendo da responsabilidade da Comissão Executiva Aveiro Digital acompanhar e verificar o processo de Apresentação de Despesas e preparar os dossiers para enviar para o POSI.

A Gestão Financeira assegurou o acompanhamento e controlo dos processos de execução financeira dos 72 Projectos seleccionados.

A Gestão Financeira foi realizada por dois técnicos, um com formação em Gestão e outro com formação em Auditoria Contabilística.

As actividades de gestão financeira associadas a esta medida podem ser sintetizadas nos seguintes pontos:

- Acompanhamento da execução do orçamento aprovado, tendo em conta os critérios e prioridades estabelecidas pela CEAD, bem como as normas financeiras aplicáveis;
- Análise e avaliação regular da execução financeira para apreciação da CEAD;
- Elaboração de relatórios de apresentação de despesas à entidade financiadora (POSI), de acordo com as normas e os regulamentos estabelecidos;
- Registo e verificação da movimentação das contas bancárias do Programa Aveiro Digital 2003-2006.
- Especificação dos requisitos da Gestão Financeira do Sistema SAVAD – Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital;

METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO DE DESPESAS

A CEAD definiu uma metodologia para as Apresentações de Despesas baseada num processo de *workflow*, complementada com o desenvolvimento de uma ferramenta de apoio – o SAVAD, onde está incorporada toda a legislação aplicável, de forma a simplificar a complexidade destes processos e onde todos os Projectos têm uma área própria de Gestão Financeira.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

A metodologia aplicada na elaboração de apresentação de despesas à entidade financiadora (POSI) consistiu no seguinte:

- Registo no SAVAD das despesas dos Projectos pelas respectivas Entidades Beneficiárias Principais;
- Entrega ao GAD após verificação, pelas Entidades Beneficiárias Principais, das despesas registadas no SAVAD através da análise dos dados e enquadramento nas rubricas orçamentais do respectivo Projecto;
- Pré-verificação pelo GAD das despesas registadas, com análise dos dados e enquadramento no respectivo Plano Técnico e Financeiro;
- Recepção no GAD dos dossiers físicos entregues pelas Entidades Beneficiárias Principais;
- Verificação pelo GAD da conformidade dos registos das despesas no SAVAD com os documentos contabilísticos originais entregues e verificação pelos respectivos Contactos GAD de Projecto da conformidade das despesas apresentadas face à execução do Plano Técnico;
- Anulação dos documentos contabilísticos originais, com a aposição do carimbo de financiamento POSI e FSE, respectiva taxa de imputação e rubrica do técnico financeiro GAD;
- Numeração sequencial de todos os documentos que integram o dossier financeiro de cada Projecto, contendo o número do Pedido de Pagamento do Projecto e o Número da Refª PAD;
- Verificação dos registos nos formulários POSI;
- Entrega no Gabinete Aveiro Digital de duas cópias do dossier financeiro pela respectiva Entidade Beneficiária Principal;
- Envio ao POSI dos ficheiros electrónicos das Listas de Despesas para primeira validação e dos Pedidos de Pagamento em formato papel, acompanhados de cópias de todos os documentos de despesas e respectivos justificativos;

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

SAVAD: GESTÃO FINANCEIRA

O SAVAD materializa e sistematiza todo o processo de Apresentação de Despesas, servindo como plataforma comunicacional entre as Entidades Beneficiárias Principais e o Gabinete Aveiro Digital e fornece todos os outputs necessários a este processo. – ver Relatório de Execução Financeira e Material de 2004 da Medida 2.3.

Para fornecer os dados necessários aos Formulários da Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação, houve a necessidade de adaptar o formato de introdução de despesas para a Rubrica Orçamental – Aquisição de Formação a Entidades Certificadas, associando cada despesa a um Curso e Acção de Formação já inseridos.

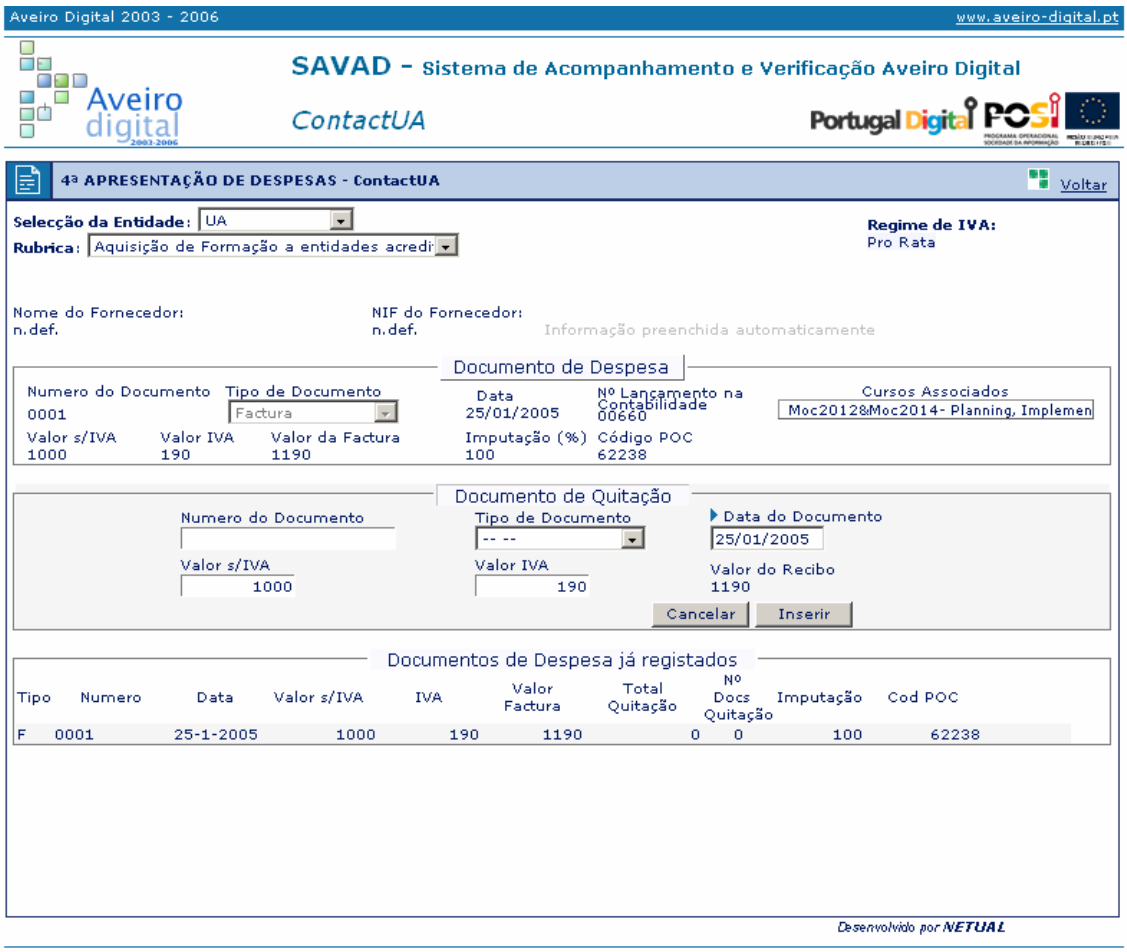

Introdução e Correcção de Despesas da Rubrica Aquisição de Formação a Entidades Certificadas

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

Nesta área de trabalho de SAVAD, são disponibilizados os formulários FSE, normalizados com o formato POSI, onde consta toda a informação sobre as despesas, acções de formação e formandos, necessários para a Apresentação de Despesas da Medida 2.4.

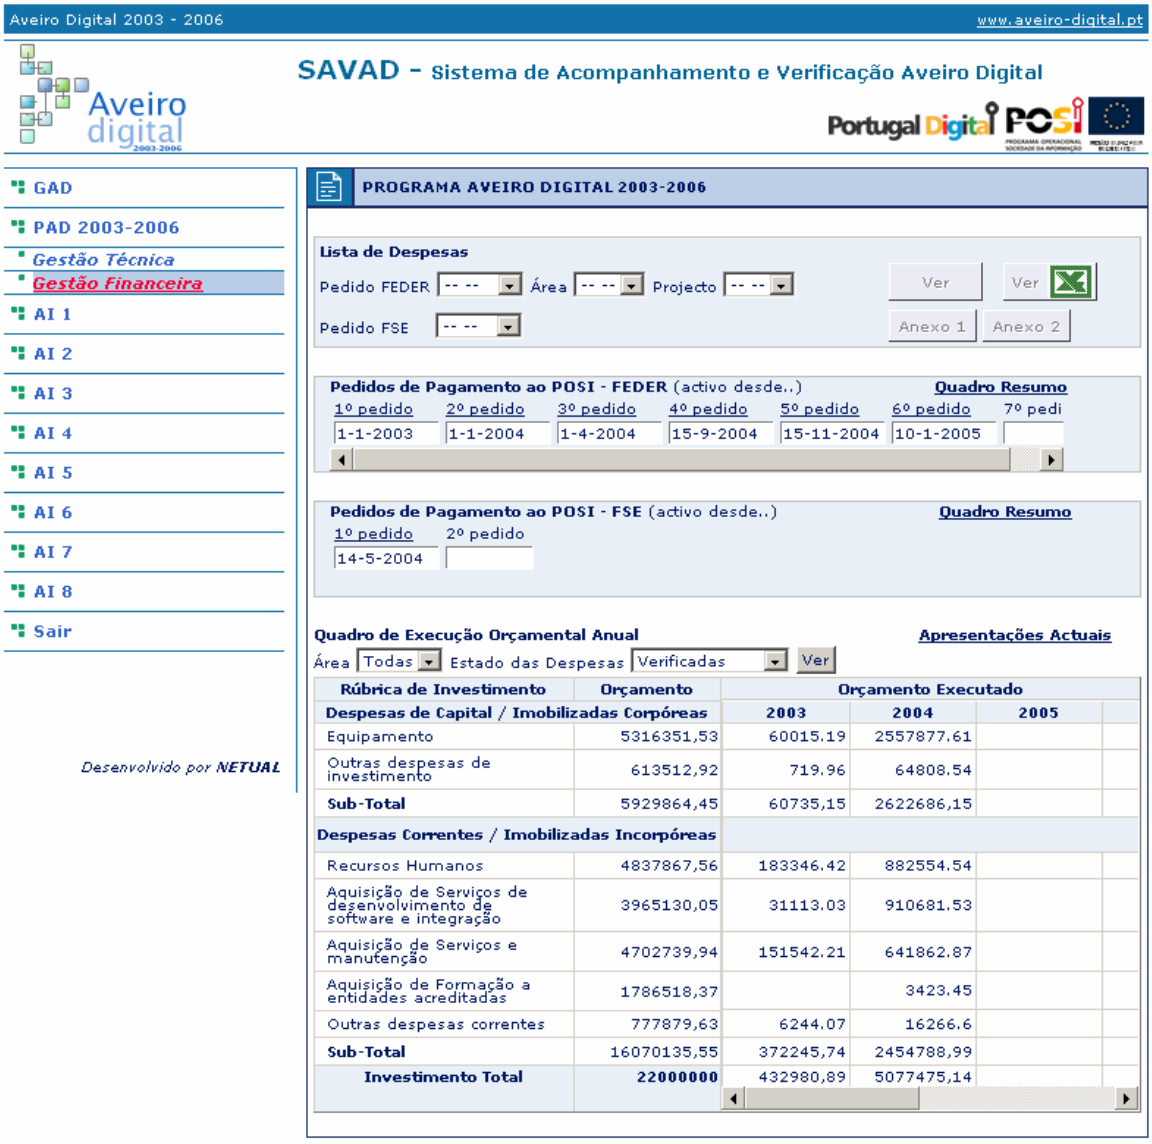

Formulários de Pedidos de Pagamentos

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2004

No dia 20 de Dezembro, data da 1ª Apresentação de Despesas da Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação estavam executados 3.423,45€, através do Projecto ContactUA, da Área de Intervenção 4 – Universidade e Comunidade Universitária.

Este valor corresponde um ano de execução dos 40 Projectos aprovados no 1º Concurso Aveiro Digital e formalizados a 19 de Dezembro de 2003. Este primeiro ano de execução centrou-se, na maioria dos Projectos, na definição conceptual das aplicações a desenvolver, bem como na constituição de equipas de trabalho.

Com o inicio da execução material em Janeiro de 2005 de mais 32 Projectos aprovados no 2º Concurso Aveiro Digital e formalizados a 20 de Dezembro de 2004, o Programa Aveiro Digital 2003-2006 atinge a sua dimensão plena com 78 Projectos, prevendo-se que a execução financeira de 2005 desta Medida atinja 1.200.000 €.

O quadro seguinte mostra a execução financeira já realizada:

Rubrica Orçamental	Orçamento	Orçamento Executado			% Execução
		2003	2004	Total	
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	1.807.993,21 €	- €	3.423,45 €	3.423,45 €	0,2 %

FLUXO FINANCEIRO POSI – PROGRAMA AVEIRO DIGITAL 2003-2006

No dia 20 de Dezembro de 2004, realizou-se a 1ª Apresentação de Despesas Aveiro Digital 2003-2006 ao POSI, no valor total de 3.423,45€, não havendo, até ao momento qualquer fluxo financeiro referente à Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação.

PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2005 E 2006

Tendo em conta o desenvolvimento dos 72 Projectos Aveiro Digital 2003-2006, prevê-se a seguinte calendarização da execução do Orçamento da Medida 2.4 – Acções Integradas de Formação do Programa Aveiro Digital 2003-2006:

Rubricas Orçamental	2003	2004	2005	2006	Total
Aquisição de Formação a entidades acreditadas	- €	3.423,45 €	1.209.069,11 €	595.500,65 €	1.807.993,21 €

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÕES

O processo de Formação em Serviços e Aplicações e Formação em Competências Básicas está embebido no modelo matricial de execução do Programa Aveiro Digital.

Dada a natureza dos Projectos enquadrados no Programa Aveiro Digital, a Formação é uma necessidade associada ao treino dos agentes que vão operar os sistemas e serviços desenvolvidos em cada Projecto. A Formação faz assim parte do sistema de qualificação das organizações que se modernizam com os investimentos comprometidos nos Projectos Aveiro Digital.

Os compromissos de Formação assumidos pelos 72 Projectos, que envolvem directamente 20.026 formandos, vão qualificar o segmento de população associado. Abrangem, assim, na AI2: 7.125 técnicos e funcionários da administração pública local e regional, na AI3: 4.422 professores, funcionários, alunos e encarregados de educação, na AI4: 320 docentes, alunos e funcionários da Universidade de Aveiro, na AI5: 780 profissionais de saúde, na AI6: 487 técnicos e utentes das Instituições de Solidariedade Social, na AI7: 3.036 gestores, técnicos e operários das empresas, na AI8: 3.856 agentes culturais e das associações desportivas e recreativas.

É esta ligação directa aos Projectos que justifica uma execução temporalmente desfasada da sua data de início.

No último trimestre de 2004 o Programa Aveiro Digital atingiu a sua dimensão plena com 72 Projectos verticais em execução, dos quais 40 atingiram já a fase de execução da Formação estando previsto que a maioria dos restantes 32 Projectos atinjam essa fase no segundo semestre de 2005.

Com um modelo de execução complementar e integrado nos investimentos em Serviços e Aplicações desenvolvidas pelos Projectos Aveiro Digital, a CEAD considera estarem consolidadas todas as condições para atingir a execução plena desta Medida dentro do prazo contratado.

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÕES

Considerando a dimensão geográfica do Programa Aveiro Digital 2003-2006 e o modelo de gestão partilhado, entre a Associação Aveiro Digital e a Associação de Municípios da Ria, o ano 2004 confirmou que a conjugação de vontades, o alinhamento de objectivos e a complementaridade de competências destas duas entidades, foram factores decisivos para a qualificação da gestão do Programa Aveiro Digital e para ganhar a confiança dos actores do desenvolvimento regional que de forma activa e comprometida estão a executar o Programa.

Os agentes do desenvolvimento da Região, nomeadamente a Universidade de Aveiro, as Empresas, as Autarquias, as Escolas, os Hospitais e outras Entidades públicas e privadas ligadas à Saúde, à Educação, à Cultura e à Solidariedade Social, estiveram especialmente atentos e activos nos 2 Concursos públicos lançados para a execução do Programa, como comprovam as 121 candidaturas apresentadas.

No último trimestre de 2004, o Programa Aveiro Digital atingiu a sua plena dimensão, com 22 Milhões de Euros comprometidos em 78 Projectos, envolvendo 303 Entidades Beneficiárias com a participação directa de 560 pessoas e com um volume de trabalho de 4.195 HM. A execução financeira do programa atingiu 5,5 Milhões de Euros em Dezembro de 2004, o que corresponde a 25% do seu orçamento total.

No ano 2004, a execução material e financeira do Programa Aveiro Digital 2003-2006, evidencia uma melhoria nas condições de financiamento, no entanto a Comissão Executiva Aveiro Digital considera que a qualidade da resposta das entidades financiadoras ainda tem um impacto determinante na execução técnica e financeira do Programa.

Aveiro, 07 de Fevereiro de 2005

A Comissão Executiva Aveiro Digital

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital

LISTA DE ACRÓNIMOS

AAD	Associação Aveiro Digital
AD	Aveiro Digital
AI	Área de Intervenção
AMRia	Associação de Municípios da Ria
CBTIC	Competências Básicas em Tecnologias da Informação e da Comunicação
CCBTIC	Certificação em Competências Básicas em Tecnologias da Informação e da Comunicação
CD	*Compact Disc*
CEAD	Comissão Executiva Aveiro Digital
CM	Câmara Municipal
DVCAM	*Digital Video Camcorder*
EB	Entidade Beneficiária
EBP	Entidade Beneficiária Principal
EIAD	Espaço Internet Aveiro Digital
FEDER	Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
FSE	Fundo Social Europeu
GAD	Gabinete Aveiro Digital
HM	Homem Mês
IGP	Instituto Geográfico Português
IRS	Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
IVA	Imposto sobre o Valor Acrescentado
JF	Junta de Freguesia
OCS	Órgãos de Comunicação Social
PAD	Programa Aveiro Digital
POSI	Programa Operacional Sociedade da Informação
PTF	Plano Técnico e Financeiro
SAVAD	Sistema de Acompanhamento e Verificação Aveiro Digital
SI	Sociedade da Informação
SIG	Sistema de Informação Geográfica
TIC	Tecnologias da Informação e da Comunicação
UMIC	Unidade Missão Inovação e Conhecimento
ZINGs	Zonas Industriais de Nova Geração

Copyright © 2005, Comissão Executiva Aveiro Digital
